
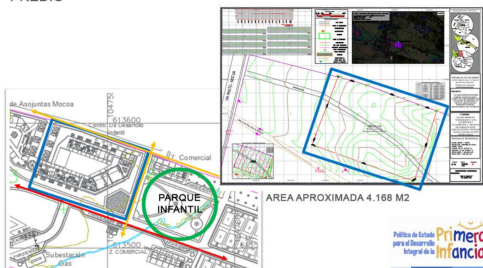



INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES								DESDE		HASTA		
								27-sep-21		3-oct-21		
A. DATOS GENERALES												
CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92756-12 (PAF-DAPREII-O-022-2021)								UBICACIÓN				
OBJETO: LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO								VEREDA PLANADAS, MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO				
CONTRATISTA		REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:						NIT				
CONSORCIO CDI MOCOCA		PABLO ANDRES MONTILLA						901479796 - 9				
INTERVENTORÍA		REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:						NIT				
CONSORCIO INTER PUTUMAYO		LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ						901480238-2				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA (\$):		PLAZOS										
\$2,258,015,025		INICIO:		3 de mayo de 2021								
		SUSPENSIÓN No. 1		14 de mayo a 12 junio de 2021								
		FECHA TERM:		12 de noviembre 2022								
B. ACTIVIDADES S EJECUTADAS EN EL PERIODO												
1- Se consolidó y entregó el informe definitivo del componente topográfico.												
2- Se consolidó y entregó el informe definitivo del componente de Geotecnia.												
3- Entrega de las tres propuestas arquitectonicas para revisión de la interventoría												
4- Trabajos de gestión social en la zona del proyecto.												
C. AVANCE DEL PROYECTO											AVANCE %	
COMPONENTE 1 - ESTUDIO DE SUELOS		Se recibieron observaciones por parte de interventoría y se están atendiendo								100%		
COMPONENTE 2 - ESTUDIO TOPOGRÁFICO		Se recibieron observaciones por parte de interventoría								100%		
COMPONENTE 3 - EST. ARQUITECTONICO		Se reciben observaciones por parte de Findeter y se envía con correcciones								82%		
COMPONENTE 4 - DISEÑO ESTRUCTURAL												
COMPONENTE 5 - DISEÑO HIDROSANITARIO												
COMPONENTE 6 - DISEÑO ELECTRICO												
COMPONENTE 7 - RED, VOZ Y DATOS												
COMPONENTE 8 - SOSTENIBILIDAD ENERGÍA												
COMPONENTE 9 - SOSTENIBILIDAD AGUA												
COMPONENTE 10 - SOSTENIB. RESIDUOS												
COMPONENTE 11 - PRESUPUESTO												
COMPONENTE 12 - P.M. AMBIENTAL												
COMPONENTE 13 - P.M TRANSITO												
COMPONENTE 14 - SOCIAL		Se reciben observaciones de PGS y se envían con correcciones								88%		
COMPONENTE 15 - ÁREAS												
COMPONENTE 16 - GESTIÓN SERV PUBL.										20%		
COMPONENTE 17 - LICENCIAS												
EJECUCIÓN ACUMULADA 1 ETAPA:										22.94%		
EJECUCIÓN ACUMULADA 2 ETAPA:												
EJECUCIÓN TOTAL DEL PROYECTO:										1.37%		
Durante el periodo en estudio se realizo la entrega de las propuestas arquitectónicas, para ser analizadas por la interventoría. De la misma forma se hizo entrega de los productos definitivos de topografía y estudio de suelos.												
D. INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA EN LA ZONA DEL PROYECTO												
SEMANA												
LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO
LLUVIA	SECO	LLUVIA	SECO	LLUVIA	SECO	LLUVIA	SECO	LLUVIA	SECO	LLUVIA	SECO	
2		1		1		2			x	2		
HORAS DE LLUVIA SEMANA:				8		ACUMULADO ANTERIOR		33		TOTAL ACUMULADO		41
E. EQUIPO EN OBRA (UTILIZACIÓN HORAS)												
DENOMINACIÓN	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	SUBTOTAL SEMANA	ACUMULADO ANTERIOR (H)	TOTAL ACUMULADO (H)		
ESTACIÓN TOPOGRÁFICA									40	40		
GPS - GNSS									20	20		
DRON									10	10		
BARRENA ELICOIDAL									16	16		
CAMIONETA - TRANSPORTE									52	52		

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES								DESDE	HASTA																																																				
								27-sep-21	3-oct-21																																																				
A. DATOS GENERALES																																																													
CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92756-12 (PAF-DAPREII-O-022-2021)								UBICACIÓN																																																					
OBJETO: LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO								VEREDA PLANADAS, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO																																																					
CONTRATISTA		REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:						NIT																																																					
CONSORCIO CDI MOCOA		PABLO ANDRES MONTILLA						901479796 - 9																																																					
INTERVENTORÍA		REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:						NIT																																																					
CONSORCIO INTER PUTUMAYO		LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ						901480238-2																																																					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA (\$):		PLAZOS																																																											
\$2,258,015,025		INICIO:		3 de mayo de 2021																																																									
		SUSPENSIÓN No. 1		14 de mayo a 12 junio de 2021																																																									
F. PERSONAL EN OBRA (DIA)																																																													
CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	SUBTOTAL SEMANA	ACUMULADO ANTERIOR (D)	TOTAL ACUMULADO (D)																																																			
ING. PABLO ANDRES MONTILLA - R.LEGAL	1	1	1	1	1	1		6	49	55																																																			
ARQ. JUAN PABLO DIEZ - DIR. CONSULTORÍA	1	1	1	1	1	1		6	49	55																																																			
ING.JOSE IGNACIO GOMEZ - ESP. GEOTECNIA									17	17																																																			
JHONY ALEXANDER IBARRA - TOPOGRAFO									22	22																																																			
VANESA BECERRA - SOCIAL	1				1			2	32	34																																																			
G. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																													
LOCALIZACIÓN GENERAL  DEPTO. PUTUMAYO COLOMBIA MUNICIPIO DE MOCOA DEPTO PUTUMAYO PLANADAS MUNICIPIO DE MOCOA UBICACIÓN PREDIO 					URBANIZACIÓN  PLANADAS MUNICIPIO DE MOCOA																																																								
FOTOGRAFIA 1.					FOTOGRAFIA 2.																																																								
PREDIO  AREA APROXIMADA 4.168 M2					DETERMINANTES  -INGRESO PEATONAL AL PROYECTO CERCANO A LA ZONA DE URBANISMO DISPUESTA PARA PARQUE. -ACCESO VEHICULAR SOBRE VIAS SECUNDARIAS. -DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS EDIFICIOS SEGÚN DISPONIBILIDAD DE PREDIO.																																																								
FOTOGRAFIA 3.					FOTOGRAFIA 4.																																																								
DETERMINANTES 					PROPUESTA 01  PERFIL VIAL  ESQUEMA ARQUITECTÓNICO 01 ADMINISTRACIÓN 02 C. TÉCNICOS 03 S. GENERALES 04 COCINA 05 COMEDOR 06 PARQUEADERO VEHICULAR 234.400 07 PORTERÍA 08 SALA MULTIPLE 09 HUERTO 10 JUEGOS 11 AULA 3 A 23 MESES 62.00 M2 12 AULA 24 A 32 MESES 48.00 M2 CERRAMIENTO: 225.73 ML <table><tr><th colspan="2">CUADRO DE ÁREAS</th><th>M2</th></tr><tr><td colspan="2">AREA DE LOTE</td><td>4.168</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE ADMINISTRACIÓN</td><td>42.80</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE C. TÉCNICOS</td><td>39.90</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE S. GENERALES</td><td>29.00</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE COCINA</td><td>58.00</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE COMEDOR</td><td>58.00</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE PORTERÍA</td><td>18.00</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE SALA MULTIPLE</td><td>87.80</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE HUERTO</td><td>40.00</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE JUEGOS</td><td>58.00</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE AULA 3 A 23 MESES</td><td>62.00</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE AULA 24 A 32 MESES</td><td>225.00</td></tr><tr><td colspan="2">AREA TOTAL</td><td>798.80</td></tr><tr><td colspan="2">ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN</td><td>0.16</td></tr><tr><td colspan="2">ÍNDICE DE OCUPACIÓN</td><td>0.16</td></tr></table> ANCHO MINIMO DE ANDEN <table><tr><th>EXIGIDO</th><th>PROPUESTO</th></tr><tr><td>1.80 M</td><td>2.00 M</td></tr></table> Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia El futuro es de todos					CUADRO DE ÁREAS		M2	AREA DE LOTE		4.168	BLOQUE ADMINISTRACIÓN		42.80	BLOQUE C. TÉCNICOS		39.90	BLOQUE S. GENERALES		29.00	BLOQUE COCINA		58.00	BLOQUE COMEDOR		58.00	BLOQUE PORTERÍA		18.00	BLOQUE SALA MULTIPLE		87.80	BLOQUE HUERTO		40.00	BLOQUE JUEGOS		58.00	BLOQUE AULA 3 A 23 MESES		62.00	BLOQUE AULA 24 A 32 MESES		225.00	AREA TOTAL		798.80	ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN		0.16	ÍNDICE DE OCUPACIÓN		0.16	EXIGIDO	PROPUESTO	1.80 M	2.00 M
CUADRO DE ÁREAS		M2																																																											
AREA DE LOTE		4.168																																																											
BLOQUE ADMINISTRACIÓN		42.80																																																											
BLOQUE C. TÉCNICOS		39.90																																																											
BLOQUE S. GENERALES		29.00																																																											
BLOQUE COCINA		58.00																																																											
BLOQUE COMEDOR		58.00																																																											
BLOQUE PORTERÍA		18.00																																																											
BLOQUE SALA MULTIPLE		87.80																																																											
BLOQUE HUERTO		40.00																																																											
BLOQUE JUEGOS		58.00																																																											
BLOQUE AULA 3 A 23 MESES		62.00																																																											
BLOQUE AULA 24 A 32 MESES		225.00																																																											
AREA TOTAL		798.80																																																											
ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN		0.16																																																											
ÍNDICE DE OCUPACIÓN		0.16																																																											
EXIGIDO	PROPUESTO																																																												
1.80 M	2.00 M																																																												

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES		DESDE	HASTA
		27-sep-21	3-oct-21
A. DATOS GENERALES			
CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92756-12 (PAF-DAPREII-O-022-2021)		UBICACIÓN	
OBJETO: LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO		VEREDA PLANADAS, MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	
CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:	NIT	
CONSORCIO CDI MOCOCA	PABLO ANDRES MONTILLA	901479796 - 9	
INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:	NIT	
CONSORCIO INTER PUTUMAYO	LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ	901480238-2	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA (\$):	PLAZOS		
\$2,258,015,025	INICIO:	3 de mayo de 2021	
	SUSPENSIÓN No. 1	14 de mayo a 12 junio de 2021	

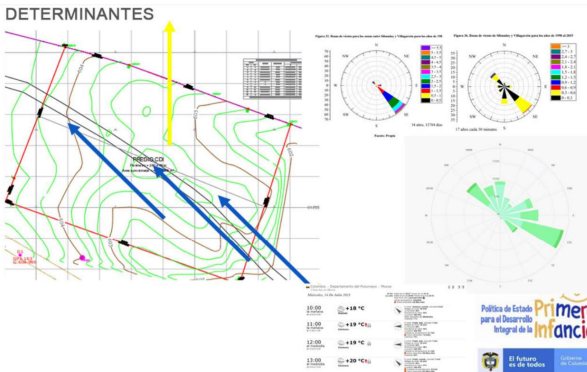

FOTOGRAFIA 7.

Ing. Pablo Andrés Montilla
Rep. Legal Consorcio CDI Mocoa



FOTOGRAFIA 8.

Arq. Juan Pablo Diez
Director consultoría
