

INFORMACIÓN GENERAL

COSTOS

13/02/18 - 15/03/20

COSTO

\$58,441,022,413

COSTO RESTANTE

\$2,773,445,380

% COMPLETADO

93%


ESTADO DEL COSTO

Estado de costo de tareas de nivel superior.

Nombre	Costo real	Costo restante	Costo de línea base	Costo	Variación de costo
Acta de Inicio de Obra	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ACTIVIDADES PRELIMINARES	\$332,957,596	\$0	\$0	\$332,957,596	\$332,957,596
FASE DE EJECUCION CLL 183 ENTRE AV BOYACA Y CRA 54D	\$50,502,100,281	\$2,533,634,369	\$0	\$53,035,734,650	\$53,035,734,650
COMPONENTES PMT, SST, AMBIENTAL, SOCIAL, SDA	\$4,832,519,156	\$239,811,012	\$0	\$5,072,330,167	\$5,072,330,167
Fin Proyecto	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

PROGRESO FRENTE A COSTO

Progreso realizado en comparación con el coste durante el proceso. Si el valor de la línea % completado está por debajo de la línea de coste acumulado, es posible que su proyecto haya superado el presupuesto.

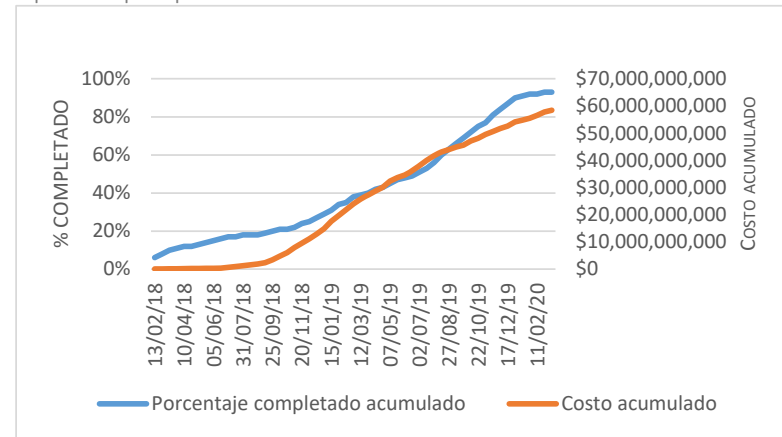

ESTADO DE COSTO

Estado de costo de todas las tareas de nivel superior. ¿La línea base es cero?

[Intente establecer una línea base](#)

