

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES								DESDE		HASTA		
								19-jul-21		25-jul-21		
<b>A. DATOS GENERALES</b>												
CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92756-12 (PAF-DAPREII-O-022-2021)								UBICACIÓN				
OBJETO: LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO								VEREDA PLANADAS, MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO				
<b>CONTRATISTA</b>				<b>REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:</b>				<b>NIT</b>				
CONSORCIO CDI MOCOCA				PABLO ANDRES MONTILLA				901479796 - 9				
<b>INTERVENTORÍA</b>				<b>REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:</b>				<b>NIT</b>				
CONSORCIO INTER PUTUMAYO				LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ				901480238-2				
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA (\$):</b>				<b>PLAZOS</b>								
\$2,258,015,025				<b>INICIO:</b>		3 de mayo de 2021						
				<b>SUSPENSIÓN No. 1</b>		14 de mayo a 12 junio de 2021						
				<b>FECHA TERM:</b>		12 de noviembre 2022						
<b>B. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO</b>												
1- Se consolidó y entregó el informe definitivo del componente topográfico.												
2- Se consolidó y entregó el informe definitivo del componente de Geotecnia.												
3- Entrega de las tres propuestas arquitectonicas para revisión de la interventoría												
4- Trabajos de gestión social en la zona del proyecto.												
<b>C. AVANCE DEL PROYECTO</b>											<b>AVANCE %</b>	
COMPONENTE 1 - ESTUDIO DE SUELOS		Se están atendiendo las observaciones del componente Geotécnia									100%	
COMPONENTE 2 - ESTUDIO TOPOGRÁFICO		Se hizo entrega del producto definitivo en este componente con todos sus soportes									100%	
COMPONENTE 3 - EST. ARQUITECTONICO		Se están atendiendo las observaciones de las propuestas arquitectonicas									40%	
COMPONENTE 4 - DISEÑO ESTRUCTURAL												
COMPONENTE 5 - DISEÑO HIDROSANITARIO												
COMPONENTE 6 - DISEÑO ELECTRICO												
COMPONENTE 7 - RED, VOZ Y DATOS												
COMPONENTE 8 - SOSTENIBILIDAD ENERGÍA												
COMPONENTE 9 - SOSTENIBILIDAD AGUA												
COMPONENTE 10 - SOSTENIB. RESIDUOS												
COMPONENTE 11 - PRESUPUESTO												
COMPONENTE 12 - P.M. AMBIENTAL												
COMPONENTE 13 - P.M TRANSITO												
COMPONENTE 14 - SOCIAL		Se continua elaborando el plan de gestión social y reputacional (Análisis de datos recolectados)									70%	
COMPONENTE 15 - ÁREAS												
COMPONENTE 16 - GESTIÓN SERV PUBL.											20%	
COMPONENTE 17 - LICENCIAS												
EJECUCIÓN ACUMULADA 1 ETAPA:											19.41%	
EJECUCIÓN ACUMULADA 2 ETAPA:												
<b>EJECUCIÓN TOTAL DEL PROYECTO:</b>											<b>1.16%</b>	
Durante el periodo en estudio se realizo la entrega de las propuestas arquitectónicas, para ser analizadas por la interventoría. De la misma forma se hizo entrega de los productos definitivos de topografía y estudio de suelos.												
<b>D. INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA EN LA ZONA DEL PROYECTO</b>												
<b>SEMANA</b>												
<b>LUNES</b>		<b>MARTES</b>		<b>MIERCOLES</b>		<b>JUEVES</b>		<b>VIERNES</b>		<b>SABADO</b>		<b>DOMINGO</b>
LLUVIA	SECO	LLUVIA	SECO	LLUVIA	SECO	LLUVIA	SECO	LLUVIA	SECO	LLUVIA	SECO	
3		3			x	3			X	2		
HORAS DE LLUVIA SEMANA:				11		ACUMULADO ANTERIOR		33		TOTAL ACUMULADO		44

# INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

DESDE

19-jul-21

HASTA

25-jul-21

## A. DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92756-12 (PAF-DAPREII-O-022-2021)

UBICACIÓN

OBJETO: LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

VEREDA PLANADAS, MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

**CONTRATISTA**

CONSORCIO CDI MOCOCA

**REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:**

PABLO ANDRES MONTILLA

**NIT**

901479796 - 9

**INTERVENTORÍA**

CONSORCIO INTER PUTUMAYO

**REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:**

LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ

**NIT**

901480238-2

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA (\$):**

\$2,258,015,025

**PLAZOS**

**INICIO:** 3 de mayo de 2021

**SUSPENSIÓN No. 1** 14 de mayo a 12 junio de 2021

## E. EQUIPO EN OBRA (UTILIZACIÓN HORAS)


DENOMINACIÓN	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	SUBTOTAL SEMANA	ACUMULADO ANTERIOR (H)	TOTAL ACUMULADO (H)
ESTACIÓN TOPOGRÁFICA									40	40
GPS - GNSS									20	20
DRON									10	10
BARRENA ELICOIDAL									16	16
CAMIONETA - TRANSPORTE									52	52

## F. PERSONAL EN OBRA (DIA)

CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	SUBTOTAL SEMANA	ACUMULADO ANTERIOR (D)	TOTAL ACUMULADO (D)
ING. PABLO ANDRES MONTILLA - R.LEGAL	1	1	1	1	1	1		6	49	55
ARQ. JUAN PABLO DIEZ - DIR. CONSULTORÍA	1	1	1	1	1	1		6	49	55
ING. JOSE IGNACIO GOMEZ - ESP. GEOTECNIA									17	17
JHONY ALEXANDER IBARRA - TOPOGRAFO									22	22
VANESA BECERRA - SOCIAL	1				1			2	32	34

## G. REGISTRO FOTOGRÁFICO

### URBANIZACION

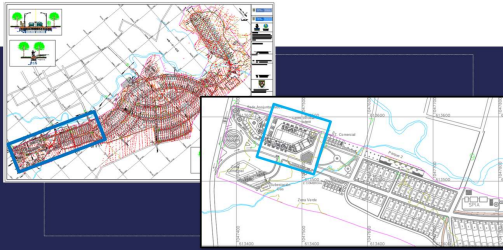


FOTOGRAFIA 1.

### PREDIO




FOTOGRAFIA 2.

### DETERMINANTES



- Ingreso peatonal al proyecto cercano a la zona de urbanismo dispuesta para parque.
- Acceso vehicular sobre vias secundarias.
- Distribución de áreas edificios según disponibilidad de predio

FOTOGRAFIA 3.

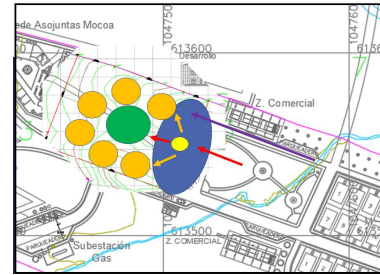

FOTOGRAFIA 4.

# INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

DESDE

19-jul-21

HASTA

25-jul-21

## A. DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92756-12 (PAF-DAPREII-O-022-2021)

UBICACIÓN

OBJETO: LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

VEREDA PLANADAS, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATISTA

CONSORCIO CDI MOCOA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:

PABLO ANDRES MONTILLA

NIT

901479796 - 9

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTER PUTUMAYO

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:

LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ

NIT

901480238-2

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA (\$):

\$2,258,015,025

PLAZOS


INICIO:

3 de mayo de 2021

SUSPENSIÓN No. 1

14 de mayo a 12 junio de 2021

### DETERMINANTES

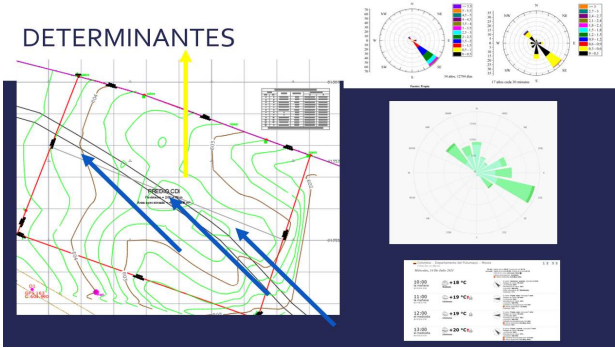


FOTOGRAFIA 5.



FOTOGRAFIA 6.



FOTOGRAFIA 7.

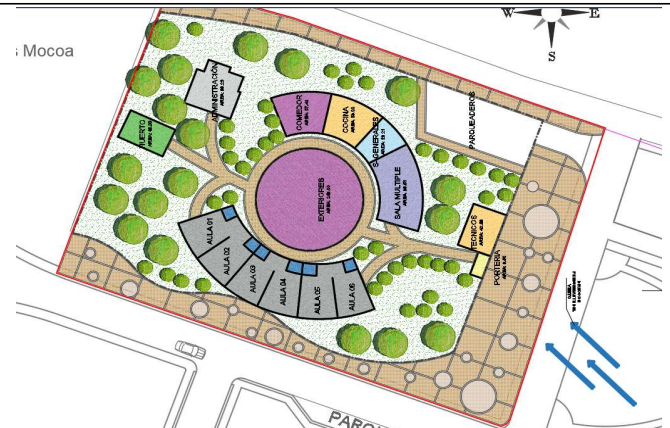

FOTOGRAFIA 8.

Ing. Pablo Andrés Montilla  
Rep. Legal Consorcio CDI Mocoa

Arq. Juan Pablo Diez  
Director consultoría
