

FLUJO DE CAJA

Costo real

\$55,667,577,033

Costo de línea base


\$0

Costo restante

\$2,773,445,380

Variación de costo

\$58,441,022,413

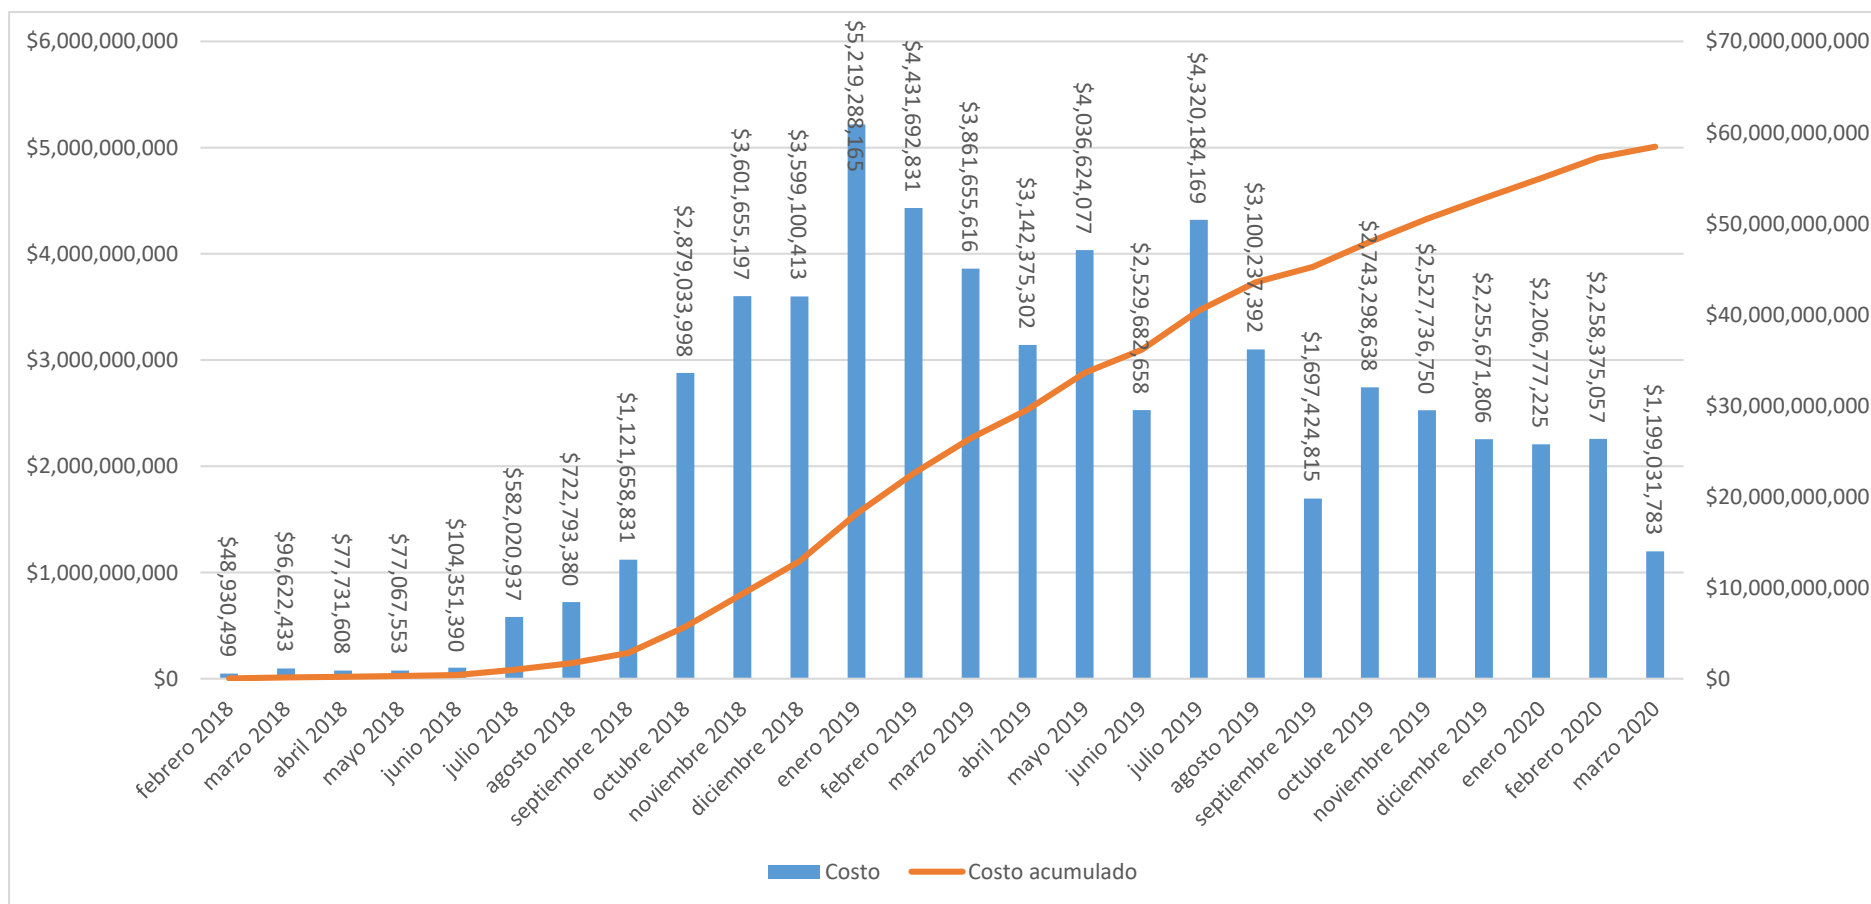

Nombre	Costo restante	Costo real	Costo	CRTR	CPTR	CPTP
Acta de Inicio de Obra	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Inicio Fase Preliminares	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Revisión de Estudios y Diseños.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Reunión Especialistas Contratista e Interventoria,	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

	Entrega predio por parte de IDU						
	Localización y Replanteo general del proyecto	\$0	\$42,472,204	\$42,472,204	\$42,472,204	\$0	\$0
	Elaboración de Sondeos y Ensayos de Laboratorio de Verificación Geotecnica.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Elaboración de Registro Fotografico y Flimico de Vías Aledañas.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Determinación por parte de ESP de delegados para el contrato.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Reuniones con Delegados de Empresas de Servicios Publicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Elaboración de Inventario de Redes Existentes	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Revisión y Verificación de Presupuesto Oficial de Obra	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Instalación de Campamento de Obra	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	SUSPENSION ETAPA DE PRELIMINARES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Informe Preliminares Componente Tecnico	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Elaboración de Metodología y Plan de Manejo de Trafico	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Elaboración de Registro Fotografico y Flimico de rutas de desvíos.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Revisión y Aprobación Interventoria.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Radicado en SDM.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Revisión y Observaciones SDM	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Atención Observaciones de SDM	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Aprobación por SDM	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Programa de Implementación del MAO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Verificación y Actualización de	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

	Inventario Forestal Resolucion 2599 2017 y de zonas verdes.					
	Elaboración de Nuevo Inventario Forestal de Individuos no identificados Durante Estudios y Diseños	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Elaboración y Entrega de Informe Preliminares Componente Ambiental y SST	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Revisión y Aprobacion Informe de Preliminares Componente Ambiental y SST	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Plan de Gestión Social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Elaboración de Actas de Vecindad sector entre Av Boyacá y Cra 54D	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Instalación de Punto IDU	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Instalación de Puntos Satelites	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Elaboración de Actas de Vecindad sector entre Cra 54D y Conectante Autopista Norte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Entrega de Informe Preliminares Componente Social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Revisión y Aprobación de Informe Revisión y Aprobacion Componente Social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Reunión de Inicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Aprobacion Informe Preliminares	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Fin de Fase de Preliminares	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Acta de Inicio de Etapa de Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Inicio Fase de Ejecución	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Instalación de Cerramiento de Obra, Protección de Arboles y Sumideros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Implementación PMT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Ejecución de tratamientos	\$0	\$94,098,321	\$94,098,321	\$94,098,321	\$0

	Silviculturales de Individuos para tala y emergencia (Reconceptualización), solicitud SIGAU Resolucion vigente						
	Movilización de Equipos y Adecuación de zonas de Acopio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Recepción de materiales para inicio de obras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Limpieza y adecuación de superficies de trabajo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ESTABILIZACIÓN DE SUB RASANTE	\$0	\$6,017,246,366	\$6,017,246,366	\$6,017,246,366	\$0	\$0
	CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO	\$0	\$4,155,331,508	\$4,155,331,508	\$4,155,331,508	\$0	\$0
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y GRANULARES DE ANDENES	\$204,842	\$2,481,883,893	\$2,482,088,734	\$2,481,883,893	\$0	\$0
	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN VALLADO COSTADO SUR	\$19,290,925	\$2,184,659,915	\$2,203,950,839	\$1,976,375,507	\$0	\$0
	CONSTRUCCION DE REDES SECAS COSTADO NORTE	\$0	\$399,723,841	\$399,723,841	\$399,723,841	\$0	\$0
	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO COSTADO NORTE	\$53,951,688	\$231,818,464	\$285,770,152	\$231,818,464	\$0	\$0
	CONSTRUCCION DE REDES SECAS COSTADO SUR	\$0	\$214,337,657	\$214,337,657	\$214,337,657	\$0	\$0
	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO COSTADO SUR	\$60,696,354	\$84,675,038	\$145,371,392	\$66,230,348	\$0	\$0
	OBRAS DE SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION	\$458,963,541	\$2,236,776	\$461,200,317	\$0	\$0	\$0
	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ESTABILIZACIÓN DE SUB RASANTE	\$0	\$11,011,416,247	\$11,011,416,247	\$11,011,416,247	\$0	\$0
	CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO	\$0	\$7,776,755,409	\$7,776,755,409	\$7,776,755,409	\$0	\$0
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y GRANULARES DE ANDENES	\$0	\$5,398,073,609	\$5,398,073,609	\$5,398,073,609	\$0	\$0
	CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN PARA	\$0	\$1,110,202,070	\$1,110,202,070	\$1,110,202,070	\$0	\$0

	DE CONVERSION PARA ESTABILIZACION DE ZONA DE VALLADO COSTADO SUR					
Instalación de Base Granular Calzada Sur	\$0	\$255,707,979	\$255,707,979	\$255,707,979	\$0	\$0
Instalación de Sardineles Prefabricados Calzada Sur	\$0	\$114,210,327	\$114,210,327	\$114,210,327	\$0	\$0
Construcción de Sumideros y Renivelación de Pozos de Alcantarillado Calzada Sur	\$0	\$65,087,849	\$65,087,849	\$65,087,849	\$0	\$0
Suministro e Instalación de Base Asfáltica Calzada Sur	\$0	\$931,058,767	\$931,058,767	\$830,037,441	\$0	\$0
Colocación de Rodadura Asfáltica Calzada Sur	\$26,707,263	\$526,422,665	\$553,129,928	\$0	\$0	\$0
CONSTRUCCION DE REDES SECAS COSTADO NORTE	\$0	\$452,526,275	\$452,526,275	\$452,526,275	\$0	\$0
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO COSTADO NORTE	\$144,857,380	\$442,527,840	\$587,385,220	\$442,527,840	\$0	\$0
CONSTRUCCION DE REDES SECAS COSTADO SUR	\$1,384,332	\$407,119,580	\$408,503,913	\$407,119,580	\$0	\$0
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO COSTADO SUR	\$92,557,743	\$218,733,487	\$311,291,230	\$103,234,067	\$0	\$0
OBRAS DE SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION	\$353,360,897	\$0	\$353,360,897	\$0	\$0	\$0
Elaboracion y Aprobación de PMT Especifico del Foso 70	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Actividades Complementarias de Estudios de Suelos, Investigación de Redes Existentes	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Montaje y Adecuación Zona de Trabajo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
FLUJO VEHICULAR HABILITADO POR PARTE DEL CONTRATO DEL PUENTE DE LA CLL 183 CON AUTOPISTA NORTE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Elaboración y Aprobación de Informe Final de Actualización de proceso Constructivo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
No Objeción de la EAB e IDU	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

Elaboración y Suscripción de Contrato Adicional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CIV 11011749 (K1+233 AL K1+415), CRA 51 A CRA 54D	\$0	\$1,884,528,974	\$1,884,528,974	\$1,884,528,974	\$0	\$0
CIV 11000334 (K1+415 AL K1+546), CRA 50B A CRA 51	\$0	\$1,199,078,955	\$1,199,078,955	\$1,199,078,955	\$0	\$0
CIV 11000352 (K1+546 AL K1+667), AUTO NORTE A CRA 50B	\$0	\$1,301,179,723	\$1,301,179,723	\$1,301,179,723	\$0	\$0
CIV 11000296 (K1+190 AL K1+233), TRAMOS DE ALCANTARILLADO CAMARA 17 A 32 Y DE CAMARA 17 A 16	\$192,299,077	\$802,595,886	\$994,894,963	\$780,463,285	\$0	\$0
ESTUDIOS, DISEÑOS Y ALTERNATIVA TECNICA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CONSTRUCCION ZONA DE INTERSECCIÓN CON FUTURA AVENIDA VILLAS (PILOTES DE GRAVA) CIV 110000243 (K0+796 AL K0+840) CIV 11000223 (K0+740 AL K0+796), AV VILLAS A CRA 65	\$1,129,360,329	\$738,862,862	\$1,868,223,191	\$550,558,485	\$0	\$0
Fin Fase de Ejecución	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 1	\$0	\$3,957,069	\$3,957,069	\$3,957,069	\$0	\$0
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 2	\$0	\$4,208,882	\$4,208,882	\$4,208,882	\$0	\$0
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 3	\$0	\$6,619,096	\$6,619,096	\$6,619,096	\$0	\$0
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 4	\$0	\$17,483,048	\$17,483,048	\$17,483,048	\$0	\$0
Mostrando 85 de 208 filas. Project solo puede mostrar 85 filas. Intente usar un filtro para obtener mejores resultados						
