
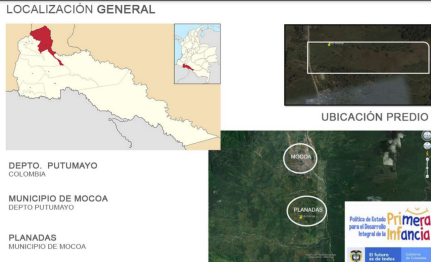
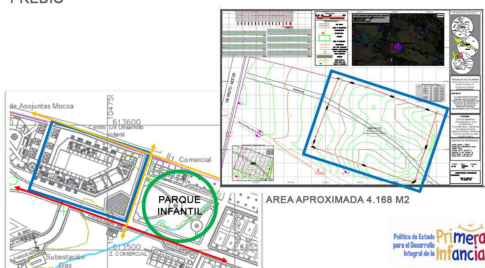
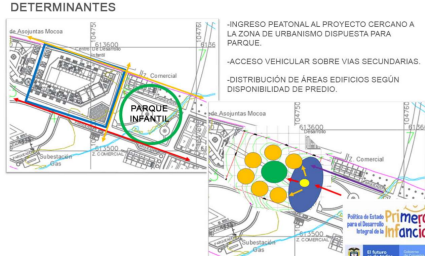
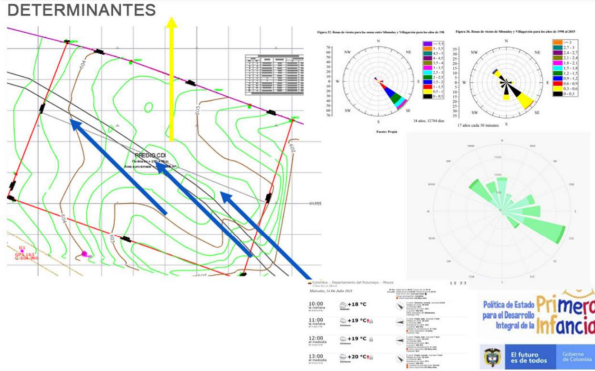


[illegible]

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES								DESDE	HASTA																																																																														
								23-ago-21	29-ago-21																																																																														
A. DATOS GENERALES																																																																																							
CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92756-12 (PAF-DAPREII-O-022-2021)								UBICACIÓN																																																																															
OBJETO: LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO								VEREDA PLANADAS, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO																																																																															
CONTRATISTA		REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:						NIT																																																																															
CONSORCIO CDI MOCOA		PABLO ANDRES MONTILLA						901479796 - 9																																																																															
INTERVENTORÍA		REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:						NIT																																																																															
CONSORCIO INTER PUTUMAYO		LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ						901480238-2																																																																															
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA (\$):		PLAZOS																																																																																					
\$2,258,015,025		INICIO:		3 de mayo de 2021																																																																																			
		SUSPENSIÓN No. 1		14 de mayo a 12 junio de 2021																																																																																			
F. PERSONAL EN OBRA (DIA)																																																																																							
CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	SUBTOTAL SEMANA	ACUMULADO ANTERIOR (D)	TOTAL ACUMULADO (D)																																																																													
ING. PABLO ANDRES MONTILLA - R.LEGAL	1	1	1	1	1	1		6	49	55																																																																													
ARQ. JUAN PABLO DIEZ - DIR. CONSULTORÍA	1	1	1	1	1	1		6	49	55																																																																													
ING.JOSE IGNACIO GOMEZ - ESP. GEOTECNIA									17	17																																																																													
JHONY ALEXANDER IBARRA - TOPOGRAFO									22	22																																																																													
VANESA BECERRA - SOCIAL	1				1			2	32	34																																																																													
G. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																							
LOCALIZACIÓN GENERAL  DEPTO. PUTUMAYO COLOMBIA MUNICIPIO DE MOCOA DEPTO PUTUMAYO PLANADAS MUNICIPIO DE MOCOA UBICACIÓN PREDIO 					URBANIZACIÓN  PLANADAS MUNICIPIO DE MOCOA																																																																																		
FOTOGRAFIA 1.					FOTOGRAFIA 2.																																																																																		
PREDIO  AREA APROXIMADA 4.168 M2 PARQUE INFANTIL					DETERMINANTES  -INGRESO PEATONAL AL PROYECTO CERCANO A LA ZONA DE URBANISMO DISPUESTA PARA PARQUE. -ACCESO VEHICULAR SOBRE VIAS SECUNDARIAS. -DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS EDIFICIOS SEGÚN DISPONIBILIDAD DE PREDIO.																																																																																		
FOTOGRAFIA 3.					FOTOGRAFIA 4.																																																																																		
DETERMINANTES  Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Infancia					PROPUESTA 01  CERRAMIENTO: 225.73 ML PERFIL VIAL  ESQUEMA ARQUITECTÓNICO <table><tr><td>01</td><td>ADMINISTRACIÓN</td></tr><tr><td>02</td><td>C. TÉCNICOS</td></tr><tr><td>03</td><td>S. GENERALES</td></tr><tr><td>04</td><td>COCINA</td></tr><tr><td>05</td><td>COMEDOR</td></tr><tr><td>06</td><td>PARQUEADERO VEHICULAR 234.400</td></tr><tr><td>07</td><td>PORTERÍA</td></tr><tr><td>08</td><td>SALA MULTIPLE</td></tr><tr><td>09</td><td>HUERTO</td></tr><tr><td>10</td><td>JUEGOS</td></tr><tr><td>11</td><td>AULA 3 A 23 MESES 62.00 M2</td></tr><tr><td>12</td><td>AULA 24 A 32 MESES 48.00 M2</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">CUADRO DE ÁREAS</th><th>M2</th></tr><tr><td colspan="2">ÁREA DE LOTE</td><td>4.168</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE ADMINISTRACIÓN</td><td>42.80</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE C. TÉCNICOS</td><td>39.90</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE S. GENERALES</td><td>29.00</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE COCINA</td><td>58.00</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE COMEDOR</td><td>58.00</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE PORTERÍA</td><td>18.00</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE SALA MULTIPLE</td><td>82.00</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE HUERTO</td><td>40.00</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE JUEGOS</td><td>58.00</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE AULA 3 A 23 MESES</td><td>62.00</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE AULA 24 A 32 MESES</td><td>48.00</td></tr><tr><td colspan="2">ÁREA TOTAL</td><td>798.80</td></tr><tr><td colspan="2">ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN</td><td>0.16</td></tr><tr><td colspan="2">ÍNDICE DE OCUPACIÓN</td><td>0.16</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">ANCHO MÍNIMO DE ANDÉN</th></tr><tr><td>EXIGIDO</td><td>PROPUESTO</td></tr><tr><td>1.80 M</td><td>2.00 M</td></tr></table> Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Infancia					01	ADMINISTRACIÓN	02	C. TÉCNICOS	03	S. GENERALES	04	COCINA	05	COMEDOR	06	PARQUEADERO VEHICULAR 234.400	07	PORTERÍA	08	SALA MULTIPLE	09	HUERTO	10	JUEGOS	11	AULA 3 A 23 MESES 62.00 M2	12	AULA 24 A 32 MESES 48.00 M2	CUADRO DE ÁREAS		M2	ÁREA DE LOTE		4.168	BLOQUE ADMINISTRACIÓN		42.80	BLOQUE C. TÉCNICOS		39.90	BLOQUE S. GENERALES		29.00	BLOQUE COCINA		58.00	BLOQUE COMEDOR		58.00	BLOQUE PORTERÍA		18.00	BLOQUE SALA MULTIPLE		82.00	BLOQUE HUERTO		40.00	BLOQUE JUEGOS		58.00	BLOQUE AULA 3 A 23 MESES		62.00	BLOQUE AULA 24 A 32 MESES		48.00	ÁREA TOTAL		798.80	ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN		0.16	ÍNDICE DE OCUPACIÓN		0.16	ANCHO MÍNIMO DE ANDÉN		EXIGIDO	PROPUESTO	1.80 M	2.00 M
01	ADMINISTRACIÓN																																																																																						
02	C. TÉCNICOS																																																																																						
03	S. GENERALES																																																																																						
04	COCINA																																																																																						
05	COMEDOR																																																																																						
06	PARQUEADERO VEHICULAR 234.400																																																																																						
07	PORTERÍA																																																																																						
08	SALA MULTIPLE																																																																																						
09	HUERTO																																																																																						
10	JUEGOS																																																																																						
11	AULA 3 A 23 MESES 62.00 M2																																																																																						
12	AULA 24 A 32 MESES 48.00 M2																																																																																						
CUADRO DE ÁREAS		M2																																																																																					
ÁREA DE LOTE		4.168																																																																																					
BLOQUE ADMINISTRACIÓN		42.80																																																																																					
BLOQUE C. TÉCNICOS		39.90																																																																																					
BLOQUE S. GENERALES		29.00																																																																																					
BLOQUE COCINA		58.00																																																																																					
BLOQUE COMEDOR		58.00																																																																																					
BLOQUE PORTERÍA		18.00																																																																																					
BLOQUE SALA MULTIPLE		82.00																																																																																					
BLOQUE HUERTO		40.00																																																																																					
BLOQUE JUEGOS		58.00																																																																																					
BLOQUE AULA 3 A 23 MESES		62.00																																																																																					
BLOQUE AULA 24 A 32 MESES		48.00																																																																																					
ÁREA TOTAL		798.80																																																																																					
ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN		0.16																																																																																					
ÍNDICE DE OCUPACIÓN		0.16																																																																																					
ANCHO MÍNIMO DE ANDÉN																																																																																							
EXIGIDO	PROPUESTO																																																																																						
1.80 M	2.00 M																																																																																						

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES		DESDE	HASTA
		23-ago-21	29-ago-21
A. DATOS GENERALES			
CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92756-12 (PAF-DAPREII-O-022-2021)		UBICACIÓN	
OBJETO: LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO		VEREDA PLANADAS, MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	
CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:	NIT	
CONSORCIO CDI MOCOCA	PABLO ANDRES MONTILLA	901479796 - 9	
INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:	NIT	
CONSORCIO INTER PUTUMAYO	LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ	901480238-2	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA (\$):	PLAZOS		
\$2,258,015,025	INICIO:	3 de mayo de 2021	
	SUSPENSIÓN No. 1	14 de mayo a 12 junio de 2021	



FOTOGRAFIA 7.

Ing. Pablo Andrés Montilla
Rep. Legal Consorcio CDI Mocoa



FOTOGRAFIA 8.

Arq. Juan Pablo Díez
Director consultoría
