

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES										DESDE		HASTA	
										6-sep-21		12-sep-21	
A. DATOS GENERALES													
CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92756-12 (PAF-DAPREII-O-022-2021)										UBICACIÓN			
OBJETO: LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO										VEREDA PLANADAS, MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO			
CONTRATISTA			REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:				NIT						
CONSORCIO CDI MOCOCA			PABLO ANDRES MONTILLA				901479796 - 9						
INTERVENTORÍA			REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:				NIT						
CONSORCIO INTER PUTUMAYO			LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ				901480238-2						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA (\$):			PLAZOS										
\$2,258,015,025			INICIO:		3 de mayo de 2021								
			SUSPENSIÓN No. 1		14 de mayo a 12 junio de 2021								
			FECHA TERM:		12 de noviembre 2022								
B. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO													
1- Se consolidó y entregó el informe definitivo del componente topográfico.													
2- Se consolidó y entregó el informe definitivo del componente de Geotecnia.													
3- Entrega de las tres propuestas arquitectonicas para revisión de la interventoría													
4- Trabajos de gestión social en la zona del proyecto.													
C. AVANCE DEL PROYECTO										AVANCE %			
COMPONENTE 1 - ESTUDIO DE SUELOS		Se recibieron observaciones por parte de interventoría y se están atendiendo								100%			
COMPONENTE 2 - ESTUDIO TOPOGRÁFICO		Se recibieron observaciones por parte de interventoría								100%			
COMPONENTE 3 - EST. ARQUITECTONICO		Se reciben observaciones por parte de Findeter y se envía con correcciones								79%			
COMPONENTE 4 - DISEÑO ESTRUCTURAL													
COMPONENTE 5 - DISEÑO HIDROSANITARIO													
COMPONENTE 6 - DISEÑO ELECTRICO													
COMPONENTE 7 - RED, VOZ Y DATOS													
COMPONENTE 8 - SOSTENIBILIDAD ENERGÍA													
COMPONENTE 9 - SOSTENIBILIDAD AGUA													
COMPONENTE 10 - SOSTENIB. RESIDUOS													
COMPONENTE 11 - PRESUPUESTO													
COMPONENTE 12 - P.M. AMBIENTAL													
COMPONENTE 13 - P.M TRANSITO													
COMPONENTE 14 - SOCIAL		Se reciben observaciones de PGS y se envían con correcciones								88%			
COMPONENTE 15 - ÁREAS													
COMPONENTE 16 - GESTIÓN SERV PUBL.										20%			
COMPONENTE 17 - LICENCIAS													
EJECUCIÓN ACUMULADA 1 ETAPA:										22.76%			
EJECUCIÓN ACUMULADA 2 ETAPA:													
EJECUCIÓN TOTAL DEL PROYECTO:										1.36%			
Durante el periodo en estudio se realizo la entrega de las propuestas arquitectónicas, para ser analizadas por la interventoría. De la misma forma se hizo entrega de los productos definitivos de topografía y estudio de suelos.													
D. INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA EN LA ZONA DEL PROYECTO													
SEMANA													
LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
LLUVIA	SECO	LLUVIA	SECO	LLUVIA	SECO	LLUVIA	SECO	LLUVIA	SECO	LLUVIA	SECO		
3		2		2		2		1		2			
HORAS DE LLUVIA SEMANA:				12		ACUMULADO ANTERIOR		33		TOTAL ACUMULADO		45	
E. EQUIPO EN OBRA (UTILIZACIÓN HORAS)													
DENOMINACIÓN	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	SUBTOTAL SEMANA	ACUMULADO ANTERIOR (H)	TOTAL ACUMULADO (H)			
ESTACIÓN TOPOGRÁFICA									40	40			
GPS - GNSS									20	20			
DRON									10	10			
BARRENA ELICOIDAL									16	16			
CAMIONETA - TRANSPORTE									52	52			

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

DESDE

6-sep-21

HASTA

12-sep-21

A. DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92756-12 (PAF-DAPREII-O-022-2021)

UBICACIÓN

OBJETO: LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

VEREDA PLANADAS, MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATISTA

CONSORCIO CDI MOCOCA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:

PABLO ANDRES MONTILLA

NIT

901479796 - 9

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTER PUTUMAYO

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:

LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ

NIT

901480238-2

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA (\$):

\$2,258,015,025

PLAZOS

INICIO: 3 de mayo de 2021


SUSPENSIÓN No. 1 14 de mayo a 12 junio de 2021

F. PERSONAL EN OBRA (DIA)

CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	SUBTOTAL SEMANA	ACUMULADO ANTERIOR (D)	TOTAL ACUMULADO (D)
ING. PABLO ANDRES MONTILLA - R.LEGAL	1	1	1	1	1	1		6	49	55
ARQ. JUAN PABLO DIEZ - DIR. CONSULTORÍA	1	1	1	1	1	1		6	49	55
ING. JOSE IGNACIO GOMEZ - ESP. GEOTECNIA									17	17
JHONY ALEXANDER IBARRA - TOPOGRAFO									22	22
VANESA BECERRA - SOCIAL	1				1			2	32	34

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO

LOCALIZACIÓN GENERAL




UBICACIÓN PREDIO

DEPTO. PUTUMAYO
COLOMBIA
MUNICIPIO DE MOCOCA
DEPTO PUTUMAYO
PLANADAS
MUNICIPIO DE MOCOCA



FOTOGRAFIA 1.


URBANIZACIÓN



PLANADAS
MUNICIPIO DE MOCOCA


FOTOGRAFIA 2.

PREDIO

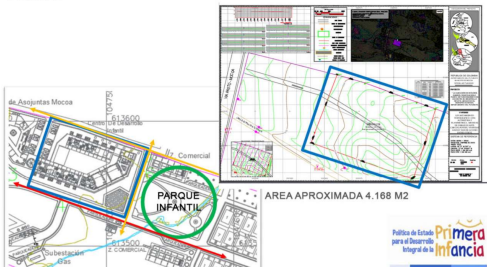


FOTOGRAFIA 3.

DETERMINANTES



FOTOGRAFIA 4.

DETERMINANTES

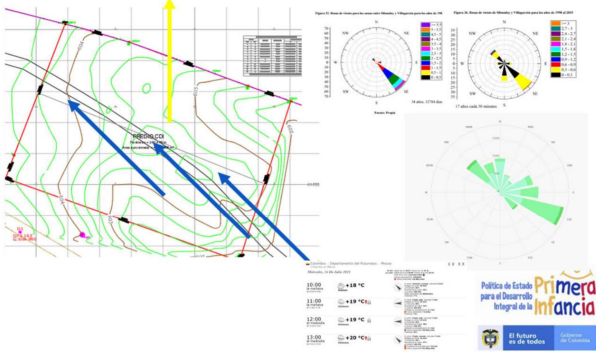

PROPUESTA 01



ESQUEMA ARQUITECTÓNICO

- 01 ADMINISTRACIÓN
- 02 C. TÉCNICOS
- 03 S. GENERALES
- 04 COCINA
- 05 COMEDOR
- 06 PARQUEADERO VEHICULAR 20x4.00
- 07 PORTERÍA
- 08 SALA MULTIPLE
- 09 HUERTO
- 10 JUEGOS
- 11 AJUA 3 A 23 MESES 60.00 M2
- 12 AJUA 24 A 32 MESES 40.00 M2

CUADRO DE ÁREAS	M2
ÁREA DE LOTE	4.188
BLOQUE ADMINISTRACIÓN	42.80
BLOQUE C. TÉCNICOS	39.90
BLOQUE S. GENERALES	29.90
BLOQUE COCINA	58.00
BLOQUE COMEDOR	58.00
BLOQUE PORTERÍA	18.00
BLOQUE SALA MULTIPLE	80.00
BLOQUE HUERTO	40.00
BLOQUE JUEGOS	58.00
BLOQUE AJUA 3 A 23 MESES	60.00
BLOQUE AJUA 24 A 32 MESES	225.00
ÁREA TOTAL	795.80
ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN	0.18
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	0.16

ANCHO MÍNIMO DE ANDÉN	
EXIGIDO	PROPUESTO
1.80 M	2.00 M



El futuro es de todos

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

DESDE

6-sep-21

HASTA

12-sep-21

A. DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92756-12 (PAF-DAPREII-O-022-2021)

UBICACIÓN

OBJETO: LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

VEREDA PLANADAS, MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATISTA

CONSORCIO CDI MOCOCA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:

PABLO ANDRES MONTILLA

NIT

901479796 - 9

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTER PUTUMAYO

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:

LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ

NIT

901480238-2

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA (\$):

\$2,258,015,025

PLAZOS

INICIO: 3 de mayo de 2021

SUSPENSIÓN No. 1 14 de mayo a 12 junio de 2021

FOTOGRAFIA 5.



FOTOGRAFIA 7.

FOTOGRAFIA 6.



FOTOGRAFIA 8.

Ing. Pablo Andrés Montilla
Rep. Legal Consorcio CDI Mocoa

Arq. Juan Pablo Diez
Director consultoría
