



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



Nombre empresa	Constructora Amavia S.A.S.			
Nombre estudiante	Kevin Steven Niño Cortés			
Semana No.	8	Rango fecha	30-12-2019 - 04-01-2020	Total Horas Aprobadas 42

ACTIVIDADES REALIZADAS				Horas	
Actividad				R: Reportadas A: Aprobadas	
LUNES	Se realiza control en actividades de amarre de acero e instalación de tubería y accesorios de agua potable, agua caliente, gas y eléctricas; además de la formaleta para placa P3-V1. Se realizó control en la fundida de la placa del segundo piso P3-V1, con concreto pre mezclado Holcim de 3000psi, así mismo se realizaron los ensayos de slump y toma de muestras para realizar los cilindros en concreto. Se realiza el control en el amarrado de acero e instalación de tubería eléctrica para muros P2-V4, Y20, X25, Y1, Y1A, X27, X6, X4, Y2, X1, Y4 y X2. Actualización de bitácora de obra.			R	A
				9	9
MARTES	Se realiza el control en el amarrado de acero e instalación de tubería eléctrica para muros P2-V4, X3, Y5, X8, X7, Y3, X9, X5, Y21, Y6, X16, Y23 y Y24; estos muros faltaban por amarrar del vaciado 4 del segundo piso. Actualización de bitácora de obra.			R	A
				6	6
MIÉRCOLES	FESTIVO			R	A
				9	0
JUEVES	Se realiza el control en el amarrado de la malla electro soldada de 0,15x0,15m e instalación de tubería y accesorios de agua potable, agua caliente, gas y eléctrica, que va embebida en la placa. Se realiza control en la fundida P2-V4 que corresponde a los muros, Y20, X25, Y1, Y1A, X27, X6, X4, Y2, X1, Y4, X2, X3, Y5, X8 y X7; así mismo se realizó el ensayo de slump a cada una de las mixer que ingresaron, se fundió con concreto premezclado Holcim de 4000psi y por último se tomó la muestra para cilindros en concreto. Se realizó control en la fundida de la placa del tercer piso P3-V2, con concreto pre mezclado Holcim de 3000psi, así mismo se realizaron los ensayos de slump y toma de muestras para realizar los cilindros en concreto. Actualización de bitácora de obra.			R	A
				9	9
VIERNES	Se realiza control en la fundida P2-V4 que corresponde a los muros restantes por fundir que son Y3, X9, X5, Y21, Y6, X16, Y23 y Y24. Se realiza control en actividades de amarrado de acero e instalación de distanciadores, tubería y accesorios eléctricos que van embebidos en muros pantalla P3-V1; Y20, X25, X27, Y21, X26, Y1, Y1A, X1, Y2, X6, X4, X7, Y3, X5, Y4, X2, Y5, X3, X8, X9, Y7 y X11. Actualización de bitácora de obra.			R	A
				9	9
S				R	A


Se realiza control en actividades de amarrado de acero e instalación de distanciadores, tubería y accesorios eléctricos que van embebidos en muros pantalla P3-V1; Y10, Y9, X18, X17, X13, Y16, Y18, Y17, Y19A, X19 y Y19; además de esto, se amarran los siguientes muros correspondientes a el vaciado 2 del tercer piso, Y20, Y21, X27, X25, Y1, Y1A, X5, Y3, X7, X4, Y2, X6, X1, X9, X8 y Y4. Se realiza control en la fundida P3-V1 que corresponde a los muros, Y20, X25, X27, Y21, X26, Y1, Y1A, X1, Y2, X6, X4, X7, Y3, X5, Y4, X2, Y5, X3, X8, X9, Y7, X11, Y10, Y9, X18, X17, X13, Y16, Y18, Y17, Y19A, X19 y Y19; así mismo se realizó el ensayo de slump a cada una de las mixer que ingresaron, se fundió con concreto premezclado Holcim de 4000psi y por último se tomó la muestra para cilindros en concreto. Se realiza el control en el amarrado de la malla electro soldada de 0,15x0,15m e instalación de tubería y accesorios de agua potable, agua caliente, gas y eléctrica, que va embebida en la placa P3-V3. Se realiza la fundida de la placa P3-V3, con concreto premezclado Holcim de 3000psi, con respectiva toma de muestras para ensayo de slump y cilindros en concreto. Actualización de bitácora de obra.	9	9
---	---	---

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)

• Anexos H.1	• Anexos H.2
• Anexos H.3	• Anexos H.4
• Anexos H.5	• Anexos H.6

APORTES DEL ESTUDIANTE

Se realizó requerimiento con el fin de mantener en buen estado la formaleta metálica usada en obra por esta razón se pidió gratas, viruta y palines para hacerle mantenimiento a la formaleta; se realizó requerimiento de perfil coolroller con el fin de utilizarlos para hacer los dinteles, junto con esto se pidió una cuchara metálica necesaria para hacer los cilindros.

Firma	Firma	Firma
		
Nombre: Waltter Joffrey Acosta Gómez	Nombre: Melquisedec Cortés Zambrano	Nombre: Kevin Steven Niño Cortés
Empresa	Universidad	Estudiante

ANEXOS


Diciembre, 30 de 2019

Se realiza control en actividades de amarre de acero e instalación de tubería y accesorios de agua potable, agua caliente, gas y eléctricas; además de la formaleta para placa P3-V1.

Se realizó control en la fundida de la placa del segundo piso P3-V1, con concreto pre mezclado Holcim de 3000psi, así mismo se realizaron los ensayos de slump y toma de muestras para realizar los cilindros en concreto.



Se realiza el control en el amarrado de acero e instalación de tubería eléctrica para muros P2-V4, Y20, X25, Y1, Y1A, X27, X6, X4, Y2, X1, Y4, X2, X3, Y5, X8, X7, Y3, X9, X5, Y21, Y6, X16, Y23 y Y24.

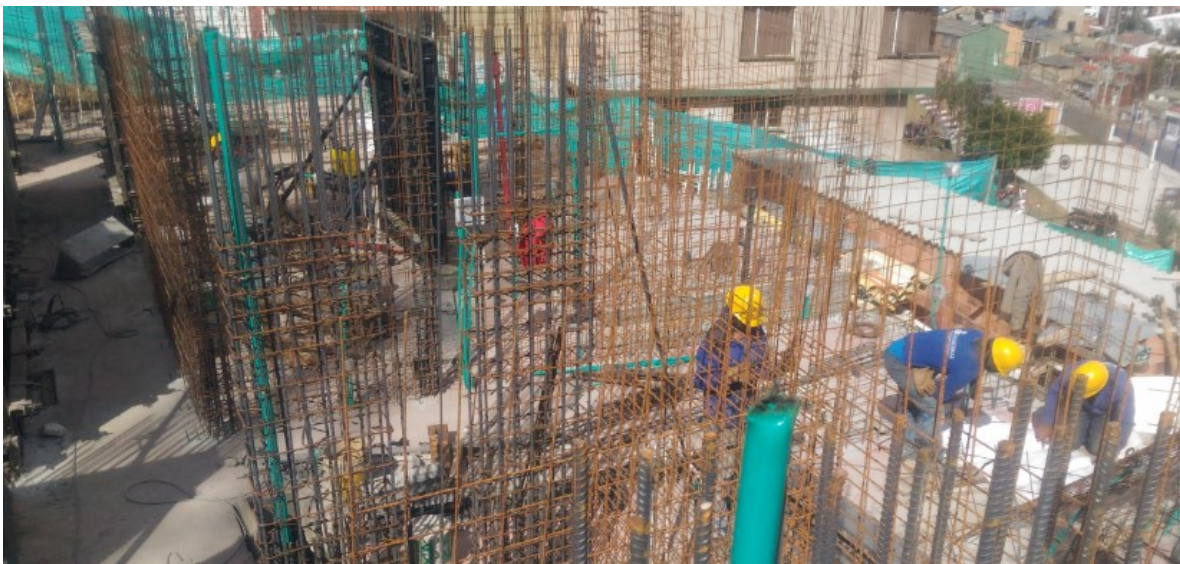



ANEXOS

Diciembre, 31 de 2019

Se realiza el control en el amarrado de acero e instalación de tubería eléctrica para muros P2-V4, X3, Y5, X8, X7, Y3, X9, X5, Y21, Y6, X16, Y23 y Y24; estos muros faltaban por amarrar del vaciado 4 del segundo piso.



Se puede observar el armado de muros pantalla para el cuarto vaciado de concreto del segundo piso.

ANEXOS

Enero, 02 del 2020

Se realiza el control en el amarrado de la malla electro soldada de 0,15x0,15m e instalación de tubería y accesorios de agua potable, agua caliente, gas y eléctrica, que va embebida en la placa P3-V2.



Se realiza control en la fundida P2-V4 que corresponde a los muros, Y20, X25, Y1, Y1A, X27, X6, X4, Y2, X1, Y4, X2, X3, Y5, X8 y X7; así mismo se realizó el ensayo de Slump a cada mixer que ingresaron, se fundió con concreto premezclado Holcim de 4000psi y por último se tomó la muestra para cilindros en concreto.



Se realizó control en la fundida de la placa del tercer piso P3-V2, con concreto pre mezclado Holcim de 3000psi, así mismo se realizaron los ensayos de Slump y toma de muestras para realizar los cilindros en concreto.



Se tomaron los respectivos ensayos



ANEXOS

Enero, 03 del 2020

Se realiza control en la fundida P2-V4 que corresponde a los muros restantes por fundir que son Y3, X9, X5, Y21, Y6, X16, Y23 y Y24.



Se realiza control en actividades de amarrado de acero e instalación de distanciadores, tubería y accesorios eléctricos que van embebidos en muros pantalla P3-V1; Y20, X25, X27, Y21, X26, Y1, Y1A, X1, Y2, X6, X4, X7, Y3, X5, Y4, X2, Y5, X3, X8, X9, Y7 y X11.



ANEXOS

Enero, 04 del 2020

Se realiza control en actividades de amarrado de acero e instalación de distanciadores, tubería y accesorios eléctricos que van embebidos en muros pantalla P3-V1; Y10, Y9, X18, X17, X13, Y16, Y18, Y17, Y19A, X19 y Y19; además de esto, se amarran los siguientes muros correspondientes a el vaciado 2 del tercer piso, Y20, Y21, X27, X25, Y1, Y1A, X5, Y3, X7, X4, Y2, X6, X1, X9, X8 y Y4.



Se realiza control en la fundida P3-V1 que corresponde a los muros, Y20, X25, X27, Y21, X26, Y1, Y1A, X1, Y2, X6, X4, X7, Y3, X5, Y4, X2, Y5, X3, X8, X9, Y7, X11, Y10, Y9, X18, X17, X13, Y16, Y18, Y17, Y19A, X19 y Y19; así mismo se realizó el ensayo de Slump a cada mixer que ingresaron, se fundió con concreto premezclado Holcim de 4000Psi y por último se tomó la muestra para cilindros en concreto.



Se realiza el control en el amarrado de la malla electro soldada de 0,15x0,15m e instalación de tubería y accesorios de agua potable, agua caliente, gas y eléctrica, que va embebida en la placa P3-V3.



Se realiza la fundida de la placa P3-V3, con concreto premezclado Holcim de 3000psi, con respectiva toma de muestras para ensayo de Slump y cilindros en concreto.



Se tomaron los respectivos ensayos.

