



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



Nombre empresa		Alcaldía Municipal de Chiquinquirá			
Nombre estudiante		Karen Tatiana Saenz Soto			
Semana No.	13	Rango fecha	08-11-2021	-	13-11-2021
Total Horas Aprobadas					48

ACTIVIDADES REALIZADAS					Horas	
Actividad					R:Reportadas A:Aprobadas	
LUNES	Se realiza modificación y correcciones de las plantillas de la Guía de planeación del programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA, posteriormente se envía correo con documentación adjunta de los convites educativos para el mejoramiento de algunas instituciones del municipio y se Asiste a reunión de Gestión del Riesgo en compañía del director de Empochiquinquirá, representante de la CAR, defensa civil, bomberos y personal de la secretaria de infraestructura y gestión del riesgo analizando los inconvenientes por las lluvias en el municipio, socializando y brindando posibles soluciones a los barrios que colapsan al no existir alcantarillado.				R	A
						8
MARTES	Radicación del PUEAA en la Corporación Autónoma Regional CAR para el proyecto Construcción del Acueducto Veredal Moyavita. Posteriormente se elaboran los oficios para activación de pólizas del proyecto de placa huellas al presentar rupturas en su estructura, posteriormente se realiza visita a las áreas a intervenir en el proyecto de reparcho de las calles mas criticas del municipio. Elaboración de acta No. 2 del proyecto construcción del Acueducto veredal Moyavita dando respuesta a los ítems estipulados por el juzgado sexto administrativo del circuito de Tunja, posteriormente se asistió a reunión de la Dirección de medio ambiente, gestión del riesgo y cambio climático.				R	A
						8
MIÉRCOLES	Supervisión a la remodelación de la secretaria de hacienda en el centro administrativo municipal CAM segunda etapa, dando inicio a la misma el día 10 de noviembre con el desmonte de cielo falso tipo lamina foil aluminio, realizando instalación de señalización de obra por parte del residente - contratista, continuando con el desmantelado eléctrico ya que las instalaciones se encontraban en malas condiciones y el regado eléctrico estaba sin ductos PVC, se solicita autorización a supervisión técnica y a la oficina de talento humano para intervención en la terraza de las oficinas de hacienda para hacer lavado y despeje de musgo para verificar si la placa presenta fisuras.				R	A
						8
JUEVES	Se da inicio al desmonte de cielo raso lámina foil en aluminio e las oficinas de CESPA, se inicia demolición de baldosa + mortero en el Centro transitorio de menores, con ello se inicia desmantelado eléctrico del CESPA dado que, para cumplir con el objeto del contrato, es necesario realizar redistribución de alambrado eléctrico y este no cumplía con la normatividad vigente RETIE.				R	A
						8
VIERNES	Continua el desmonte de cielo raso lamina foil en aluminio y desmantelado eléctrico, se realiza ingreso de material tipo estructura metálica, lamina drywall, masilla y pintura, piso laminado, enchape en porcelana formato 20*20, ducteria pvc tipo pesado de 1/2", se realiza desmonte de muros divisorios en drywall.				R	A
						8
SABADO	Se da inicio a la construcción y montaje de perfilería metálica en la dependencia de la secretaria de hacienda; en el CESPA se realiza desmonte de griferías y pocetas lavamanos, se desmonta mueble de mármol para arreglo y empotramiento de los lavamanos, se realiza ingreso de material eléctrico alambre AWG#12 restante ducteria, cajas 2400 - 5800, paneles led. Finalizando con 4 frentes de trabajo.				R	A
						8

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)


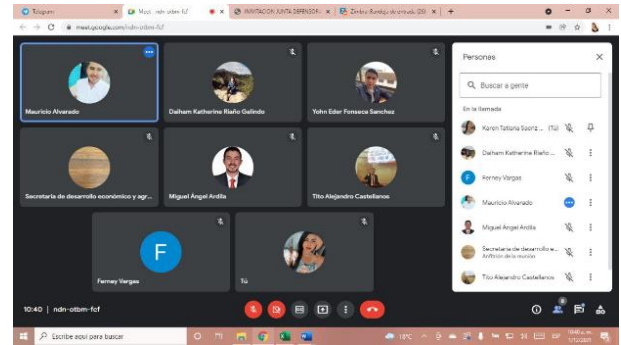


OFICIO ACCION POPULAR MOYAVITA 4 MESES.docx
1.8 MB



APORTES DEL ESTUDIANTE

En la practica o ejerciendo la ingeniería civil, se da a conocer los procesos, vigencias e importancia que tienen las pólizas en un proyecto puesto que los contratistas deben responder durante un límite de tiempo cualquier inestabilidad o fractura que sufra dependiendo la obra o proyecto en marcha. Cabe resaltar que hoy en día la gestión del riesgo esta moviendo gran parte de nuestro ámbito profesional, es por eso que no lo debemos dejar de lado y prestar la importancia necesaria como lo es en el caso de inundaciones que pueden afectar viviendas e incluso afectar a los habitantes de las mismas.

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Brayan Ferney Pinilla Sierra	Nombre:	José Rodrigo Méndez Zuluaga	Nombre:	Karen Tatiana Saenz Soto
Empresa		Universidad		Estudiante	
