



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

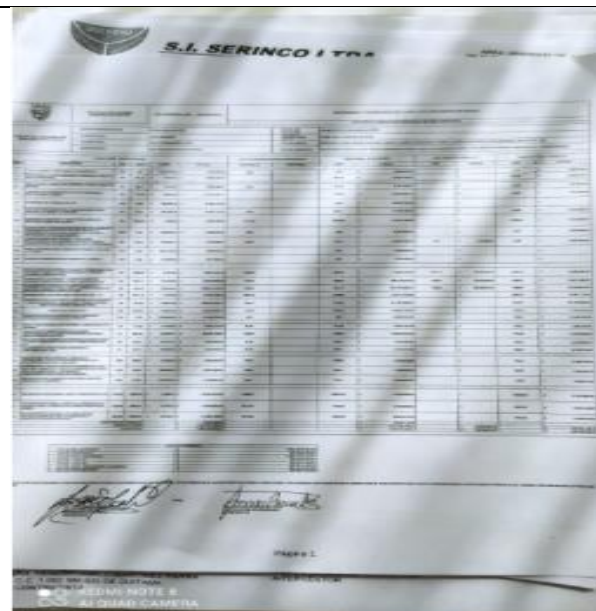
FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



Nombre empresa		MPJ INGENIERIA SAS			
Nombre estudiante		DAVID FELIPE GUARIN MESA			
Semana No.	13	Rango fecha	08-03-2021	-	13-03-2021
Total Horas Aprobadas					48

ACTIVIDADES REALIZADAS					Horas	
Actividad					R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	Mi día empieza en obra, en el barrio rincón del cargua, cra 6A. Se le indican las instrucciones al personal en obra. Estoy pendiente en obra de las labores que se están ejecutando. Tome medidas a lo largo del tramo y a ambos costados de la vía para saber la cantidad de sardineles a pedir. Se realiza excavación, cargue y retiro de escombros. Se pide ir extendiendo material y perfilando con el mini cargador. Al final del día diligencio la bitácora de obra. Estuve todo el día en obra.				R	A
					9	9
MARTES	Estuve el día en oficina revisando la sabana de cantidades ejecutadas en obra, esto con el fin de saber que se ha hecho, que falta y que se puede cobrar. Pase por la obra del barrio las delicias donde se estaba ultimando detalles, estuve allí pendiente el resto de la jornada laboral.				R	A
					8	8
MIÉRCOLES	El día de hoy estuve tomando fotos a las viviendas aledañas donde se va a realizar otra intervención la cual hace parte del contrato que se está llevando a cabo en este momento, esto en el municipio de Duitama, barrio Boyacá, dirección cl 2 entre cra 8 y cra9A. las fotos con el fin de realizar las actas de vecindad antes de iniciar actividades en este tramo. Aproveche para pasar por la obra del rincón del cargua donde se estaba llevando a cabo el descargue de sardineles. Estuve diligenciando los formatos para realizar las actas de vecindad.				R	A
					8	8
JUEVES	me dirigí a la oficina a imprimir las actas de vecindad, luego subí al barrio Boyacá y comencé a realizar dichas actas, me presente y hable con cada uno de los habitantes de estas viviendas donde les explique la función de esta acta y donde también les hable sobre la obra que se va a llevar a cabo en dicho tramo. Estuve en esto la mayor parte de la jornada laboral.				R	A
					8	8
VIERNES	Estuve el día en obra, en el barrio rincón del cargua, pendiente del descargue de sardineles, contando cuantos llegan, si llegan en buen estado, pendiente de la excavación para la instalación del sardinel. Atento en obra la jornada laboral.				R	A
					8	8
SABADO	Llego a obra, se comienzan labores. Se lleva a cabo la instalación de sardinel, estoy pendiente de que vayan quedando nivelados, alineados, y así estuve pendiente el resto de día.				R	A
					7	7



EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)



APORTES DEL ESTUDIANTE

Tomar medidas para sacar cantidades y así pedir material.

Hablar con la comunidad del barrio Boyacá para explicarles las actividades que se van a llevar a cabo en este tramo de la vía.

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	 R/L ING. YEISON CAMILO MARTINEZ	Nombre:	 Ing. Manuel Orlando Hernández Rivera	Nombre:	DAVID FELIPE GUARIN MESA 
Empresa		Universidad		Estudiante	
