

% completado


93%

13/02/18 - 15/03/20

PRÓXIMAS TAREAS

TAREAS RESTANTES

Estado de las tareas pendientes que vencen esta semana

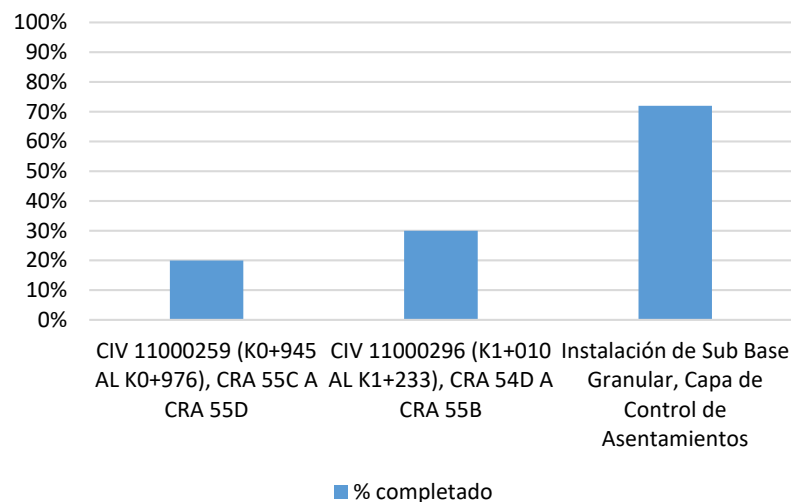

TAREAS QUE COMIENZAN PRONTO

Estado de tareas que comienzan en la próxima semana

Nombre	Nombres de los recursos	Comienzo	Fin	Trabajo
CIV 11000261 (K0+976 AL K1+010), CRA 55B A CRA 55C	GRAMA[54.5];RLL MATERIAL EXC[10.23]	01/02/20	08/02/20	0 d
CIV 11000296 (K1+010 AL K1+233), CRA 54D A CRA 55B	CHICALA[1];NOGAL[3];ROBLE[1 0];ENDRINO[0];CAJETO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACION.[3];LIQUIDAMBA R H=2.5m [4];MANGLE H= 1.50m[1];LIGUSTRUM H=2.5mt[6]	31/01/20	12/02/20	0 d
Instalación de Base Granular	BG_A[390]	01/02/20	06/02/20	0 d
Construcción de Canalizaciones	6Ø6" + 2Ø3" TDP[120];9 DUCTOS 6 + 2 DUCTOS 3 - IMC CERCHA METÁLICA[9]	03/02/20	10/02/20	0 d
