
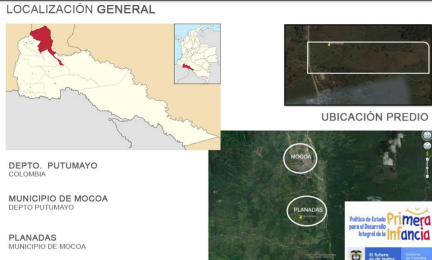
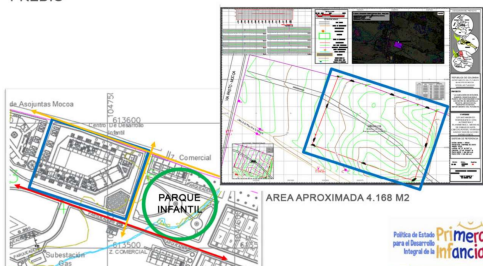



[illegible]

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES								DESDE	HASTA																																																				
								22-nov-21	28-nov-21																																																				
A. DATOS GENERALES																																																													
CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92756-12 (PAF-DAPREII-O-022-2021)								UBICACIÓN																																																					
OBJETO: LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO								VEREDA PLANADAS, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO																																																					
CONTRATISTA		REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:						NIT																																																					
CONSORCIO CDI MOCOA		PABLO ANDRES MONTILLA						901479796 - 9																																																					
INTERVENTORÍA		REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:						NIT																																																					
CONSORCIO INTER PUTUMAYO		LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ						901480238-2																																																					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA (\$):		PLAZOS																																																											
\$2,258,015,025		INICIO:		3 de mayo de 2021																																																									
		SUSPENSIÓN No. 1		14 de mayo a 12 junio de 2021																																																									
F. PERSONAL EN OBRA (DIA)																																																													
CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	SUBTOTAL SEMANA	ACUMULADO ANTERIOR (D)	TOTAL ACUMULADO (D)																																																			
ING. PABLO ANDRES MONTILLA - R.LEGAL	1	1	1	1	1	1		6	49	55																																																			
ARQ. JUAN PABLO DIEZ - DIR. CONSULTORÍA	1	1	1	1	1	1		6	49	55																																																			
ING.JOSE IGNACIO GOMEZ - ESP. GEOTECNIA									17	17																																																			
JHONY ALEXANDER IBARRA - TOPOGRAFO									22	22																																																			
VANESA BECERRA - SOCIAL	1				1			2	32	34																																																			
G. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																													
LOCALIZACIÓN GENERAL  DEPTO. PUTUMAYO COLOMBIA MUNICIPIO DE MOCOA DEPTO PUTUMAYO PLANADAS MUNICIPIO DE MOCOCA UBICACIÓN PREDIO 					URBANIZACIÓN  PLANADAS MUNICIPIO DE MOCOCA																																																								
FOTOGRAFIA 1.					FOTOGRAFIA 2.																																																								
PREDIO  AREA APROXIMADA 4.168 M2					DETERMINANTES  -INGRESO PEATONAL AL PROYECTO CERCANO A LA ZONA DE URBANISMO DISPUESTA PARA PARQUE. -ACCESO VEHICULAR SOBRE VIAS SECUNDARIAS. -DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS EDIFICIOS SEGÚN DISPONIBILIDAD DE PREDIO.																																																								
FOTOGRAFIA 3.					FOTOGRAFIA 4.																																																								
DETERMINANTES 					PROPUESTA 01  PERFIL VIAL  ESQUEMA ARQUITECTÓNICO 01 ADMINISTRACIÓN 02 C. TÉCNICOS 03 S. GENERALES 04 COCINA 05 COMEDOR 06 PARQUEADERO VEHICULAR 250 A 400 07 PORTERA 08 SALA MULTIPLE 09 HUERTO 10 JUEGOS 11 AULA 3 A 23 MESES 600 M2 12 AULA 24 A 32 MESES 400 M2 CERRAMIENTO: 225.73 ML <table><tr><th colspan="2">CUADRO DE ÁREAS</th><th>M2</th></tr><tr><td colspan="2">AREA DE LOTE</td><td>4.168</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE ADMINISTRACIÓN</td><td>42.80</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE C. TÉCNICOS</td><td>39.90</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE S. GENERALES</td><td>29.90</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE COCINA</td><td>58.00</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE COMEDOR</td><td>58.00</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE PORTERA</td><td>18.00</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE SALA MULTIPLE</td><td>87.80</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE HUERTO</td><td>40.00</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE JUEGOS</td><td>58.00</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE AULA 3 A 23 MESES</td><td>60.00</td></tr><tr><td colspan="2">BLOQUE AULA 24 A 32 MESES</td><td>225.00</td></tr><tr><td colspan="2">AREA TOTAL</td><td>795.80</td></tr><tr><td colspan="2">INDICE DE CONSTRUCCIÓN</td><td>0.16</td></tr><tr><td colspan="2">INDICE DE OCUPACIÓN</td><td>0.16</td></tr></table> ANCHO MINIMO DE ANDEN <table><tr><th>EXIGIDO</th><th>PROPUESTO</th></tr><tr><td>1.80 M</td><td>2.00 M</td></tr></table> Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia El futuro es de todos					CUADRO DE ÁREAS		M2	AREA DE LOTE		4.168	BLOQUE ADMINISTRACIÓN		42.80	BLOQUE C. TÉCNICOS		39.90	BLOQUE S. GENERALES		29.90	BLOQUE COCINA		58.00	BLOQUE COMEDOR		58.00	BLOQUE PORTERA		18.00	BLOQUE SALA MULTIPLE		87.80	BLOQUE HUERTO		40.00	BLOQUE JUEGOS		58.00	BLOQUE AULA 3 A 23 MESES		60.00	BLOQUE AULA 24 A 32 MESES		225.00	AREA TOTAL		795.80	INDICE DE CONSTRUCCIÓN		0.16	INDICE DE OCUPACIÓN		0.16	EXIGIDO	PROPUESTO	1.80 M	2.00 M
CUADRO DE ÁREAS		M2																																																											
AREA DE LOTE		4.168																																																											
BLOQUE ADMINISTRACIÓN		42.80																																																											
BLOQUE C. TÉCNICOS		39.90																																																											
BLOQUE S. GENERALES		29.90																																																											
BLOQUE COCINA		58.00																																																											
BLOQUE COMEDOR		58.00																																																											
BLOQUE PORTERA		18.00																																																											
BLOQUE SALA MULTIPLE		87.80																																																											
BLOQUE HUERTO		40.00																																																											
BLOQUE JUEGOS		58.00																																																											
BLOQUE AULA 3 A 23 MESES		60.00																																																											
BLOQUE AULA 24 A 32 MESES		225.00																																																											
AREA TOTAL		795.80																																																											
INDICE DE CONSTRUCCIÓN		0.16																																																											
INDICE DE OCUPACIÓN		0.16																																																											
EXIGIDO	PROPUESTO																																																												
1.80 M	2.00 M																																																												

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES		DESDE	HASTA
		22-nov-21	28-nov-21
A. DATOS GENERALES			
CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92756-12 (PAF-DAPREII-O-022-2021)		UBICACIÓN	
OBJETO: LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO		VEREDA PLANADAS, MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	
CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:	NIT	
CONSORCIO CDI MOCOCA	PABLO ANDRES MONTILLA	901479796 - 9	
INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:	NIT	
CONSORCIO INTER PUTUMAYO	LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ	901480238-2	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA (\$):	PLAZOS		
\$2,258,015,025	INICIO:	3 de mayo de 2021	
	SUSPENSIÓN No. 1	14 de mayo a 12 junio de 2021	

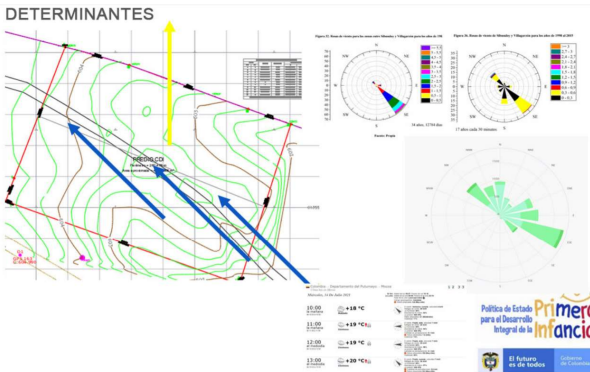

FOTOGRAFIA 7.

Ing. Pablo Andrés Montilla
Rep. Legal Consorcio CDI Mocoa



FOTOGRAFIA 8.

Arq. Juan Pablo Diez
Director consultoría
