
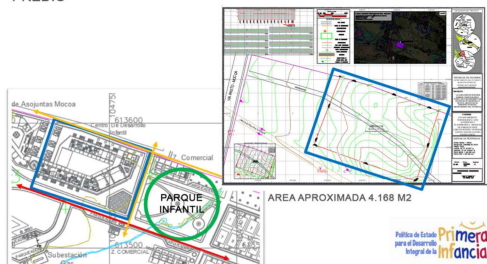



[illegible]

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES								DESDE	HASTA																																								
								13-sep-21	19-sep-21																																								
A. DATOS GENERALES																																																	
CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92756-12 (PAF-DAPREII-O-022-2021)								UBICACIÓN																																									
OBJETO: LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO								VEREDA PLANADAS, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO																																									
CONTRATISTA			REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:					NIT																																									
CONSORCIO CDI MOCOA			PABLO ANDRES MONTILLA					901479796 - 9																																									
INTERVENTORÍA			REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:					NIT																																									
CONSORCIO INTER PUTUMAYO			LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ					901480238-2																																									
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA (\$):			PLAZOS																																														
\$2,258,015,025			INICIO:		3 de mayo de 2021																																												
			SUSPENSIÓN No. 1		14 de mayo a 12 junio de 2021																																												
F. PERSONAL EN OBRA (DIA)																																																	
CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	SUBTOTAL SEMANA	ACUMULADO ANTERIOR (D)	TOTAL ACUMULADO (D)																																							
ING. PABLO ANDRES MONTILLA - R.LEGAL	1	1	1	1	1	1		6	49	55																																							
ARQ. JUAN PABLO DIEZ - DIR. CONSULTORÍA	1	1	1	1	1	1		6	49	55																																							
ING.JOSE IGNACIO GOMEZ - ESP. GEOTECNIA									17	17																																							
JHONY ALEXANDER IBARRA - TOPOGRAFO									22	22																																							
VANESA BECERRA - SOCIAL	1				1			2	32	34																																							
G. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																	
LOCALIZACIÓN GENERAL  DEPTO. PUTUMAYO COLOMBIA MUNICIPIO DE MOCOA DEPTO PUTUMAYO PLANADAS MUNICIPIO DE MOCOA UBICACIÓN PREDIO 				URBANIZACIÓN  PLANADAS MUNICIPIO DE MOCOA																																													
FOTOGRAFIA 1.				FOTOGRAFIA 2.																																													
PREDIO  AREA APROXIMADA 4.168 M2				DETERMINANTES  -INGRESO PEATONAL AL PROYECTO CERCANO A LA ZONA DE URBANISMO DISPUESTA PARA PARQUE. -ACCESO VEHICULAR SOBRE VIAS SECUNDARIAS. -DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS EDIFICIOS SEGÚN DISPONIBILIDAD DE PREDIO.																																													
FOTOGRAFIA 3.				FOTOGRAFIA 4.																																													
DETERMINANTES 				PROPUESTA 01  PERFIL VIAL  ESQUEMA ARQUITECTÓNICO - ADMINISTRACIÓN C. TÉCNICOS S. GENERALES - COCINA - COMEDOR - PARQUEADERO VEHICULAR 250 A 400 - PORTERÍA - SALA MULTIPLE - HUERTO - JUEGOS - ÁULA 3 A 23 MESES 60/60 M2 - ÁULA 24 A 32 MESES 40/60 M2 <table><tr><th>CUADRO DE ÁREAS</th><th>M2</th></tr><tr><td>ÁREA DE LOTE</td><td>4.168</td></tr><tr><td>BLOQUE ADMINISTRACIÓN</td><td>42.80</td></tr><tr><td>BLOQUE C. TÉCNICOS</td><td>39.90</td></tr><tr><td>BLOQUE S. GENERALES</td><td>29.90</td></tr><tr><td>BLOQUE COCINA</td><td>58.00</td></tr><tr><td>BLOQUE COMEDOR</td><td>58.00</td></tr><tr><td>BLOQUE PORTERÍA</td><td>18.00</td></tr><tr><td>BLOQUE SALA MULTIPLE</td><td>87.80</td></tr><tr><td>BLOQUE HUERTO</td><td>40.00</td></tr><tr><td>BLOQUE JUEGOS</td><td>58.00</td></tr><tr><td>BLOQUE ÁULA 3 A 23 MESES</td><td>63.00</td></tr><tr><td>BLOQUE ÁULA 24 A 32 MESES</td><td>225.00</td></tr><tr><td>ÁREA TOTAL</td><td>796.80</td></tr><tr><td>ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN</td><td>0.16</td></tr><tr><td>ÍNDICE DE OCUPACIÓN</td><td>0.16</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">ANCHO MÍNIMO DE ANDÉN</th></tr><tr><th>EXIGIDO</th><th>PROPUESTO</th></tr><tr><td>1.80 M</td><td>2.00 M</td></tr></table> CERRAMIENTO: 225.73 ML								CUADRO DE ÁREAS	M2	ÁREA DE LOTE	4.168	BLOQUE ADMINISTRACIÓN	42.80	BLOQUE C. TÉCNICOS	39.90	BLOQUE S. GENERALES	29.90	BLOQUE COCINA	58.00	BLOQUE COMEDOR	58.00	BLOQUE PORTERÍA	18.00	BLOQUE SALA MULTIPLE	87.80	BLOQUE HUERTO	40.00	BLOQUE JUEGOS	58.00	BLOQUE ÁULA 3 A 23 MESES	63.00	BLOQUE ÁULA 24 A 32 MESES	225.00	ÁREA TOTAL	796.80	ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN	0.16	ÍNDICE DE OCUPACIÓN	0.16	ANCHO MÍNIMO DE ANDÉN		EXIGIDO	PROPUESTO	1.80 M	2.00 M
CUADRO DE ÁREAS	M2																																																
ÁREA DE LOTE	4.168																																																
BLOQUE ADMINISTRACIÓN	42.80																																																
BLOQUE C. TÉCNICOS	39.90																																																
BLOQUE S. GENERALES	29.90																																																
BLOQUE COCINA	58.00																																																
BLOQUE COMEDOR	58.00																																																
BLOQUE PORTERÍA	18.00																																																
BLOQUE SALA MULTIPLE	87.80																																																
BLOQUE HUERTO	40.00																																																
BLOQUE JUEGOS	58.00																																																
BLOQUE ÁULA 3 A 23 MESES	63.00																																																
BLOQUE ÁULA 24 A 32 MESES	225.00																																																
ÁREA TOTAL	796.80																																																
ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN	0.16																																																
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	0.16																																																
ANCHO MÍNIMO DE ANDÉN																																																	
EXIGIDO	PROPUESTO																																																
1.80 M	2.00 M																																																

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES		DESDE	HASTA
		13-sep-21	19-sep-21
A. DATOS GENERALES			
CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92756-12 (PAF-DAPREII-O-022-2021)		UBICACIÓN	
OBJETO: LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO		VEREDA PLANADAS, MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	
CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:	NIT	
CONSORCIO CDI MOCOCA	PABLO ANDRES MONTILLA	901479796 - 9	
INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:	NIT	
CONSORCIO INTER PUTUMAYO	LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ	901480238-2	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA (\$):	PLAZOS		
\$2,258,015,025	INICIO:	3 de mayo de 2021	
	SUSPENSIÓN No. 1	14 de mayo a 12 junio de 2021	

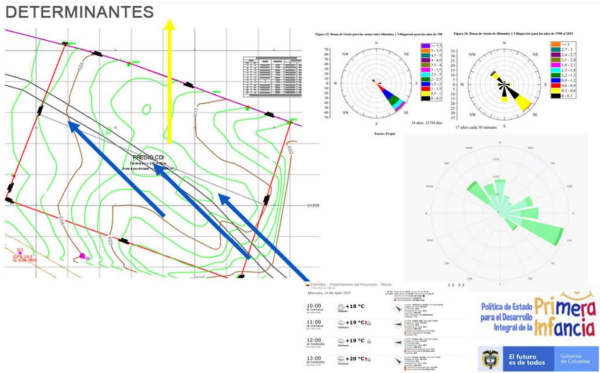

Ing. Pablo Andrés Montilla
Rep. Legal Consorcio CDI Mocoa



Arq. Juan Pablo Diez
Director consultoría
