


	UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL	Logo Empresa
---	---	--

Nombre empresa		Secretaria de cultura, turismo y patrimonio territorial.					
Nombre estudiante		Lina Juliana Castillo Alarcón.					
Semana No.	2	Rango fecha	22-07-2024	-	26-07-2024	Total Horas Aprobadas	40

ACTIVIDADES REALIZADAS		Horas	
Actividad		R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	Revisión de información construcción de puentes, formas constructivas antiguas, de las cuales se pueda observar que fue la metodología usada en los tramos de piedra de los puentes en estudio de la ciudad de Tunja en la zona de muiscas.	R	A
		8	8
MARTES	Reunión con los arquitectos encargados (tutores de la pasantía), donde me definieron el tema a investigar, para poder ser apoyo de quien realizará la definición de los estudios de vulnerabilidad sísmica en inmuebles patrimoniales de la ciudad de Tunja. Inicio de consulta de fuentes bibliográficas confiables y de valor representativo.	R	A
		8	8
MIÉRCOLES	Búsqueda de información en repositorios universitarios internacionales, como el Repositorio Digital Institucional de la Escuela Politécnica Nacional, que ofrece un acceso abierto a textos. Encontrando información sobre el estudio de vulnerabilidad en un inmueble patrimonial del distrito metropolitano, el cual funciona como referencia ante lo requerido. Igualmente, revisión de publicaciones en el repositorio de la universidad de Granada en España y de la universidad de Chile.	R	A
		8	8
JUEVES	Consulta de información en fuentes nacionales, repositorios de universidades como el de la Universidad Militar Nueva Granada, revistas de ingeniería de construcción enfocadas en la caracterización de sus particularidades técnicas, búsqueda en el centro de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI) de la universidad Santo Tomás, repositorios de la universidad de los Andes y universidad católica de Colombia.	R	A
		8	8
VIERNES	Realización de documento con la información recopilada de las diferentes fuentes, con el fin de sintetizar los documentos encontrados, con la información más relevante y de interés.	R	A
		8	8
SABADO		R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)	

APORTES DEL ESTUDIANTE

Firma 		Firma 		Firma	
Nombre:	Gloria Esperanza Católico González.	Nombre:	Harold Alexander Álvarez Castañeda.	Nombre:	Lina Juliana Castillo Alarcón.
Empresa		Universidad		Estudiante	




	UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL		Logo Empresa

Nombre empresa		Secretaria de cultura, turismo y patrimonio territorial.	
Nombre estudiante		Lina Juliana Castillo Alarcón	
Semana No.	3	Rango fecha	29-07-2024 - 02-08-2024
		Total Horas Aprobadas	40

ACTIVIDADES REALIZADAS			Horas	
Actividad			R:Reportadas A:Aprobadas	
LUNES	Búsqueda de un contexto de técnicas constructivas de puentes en piedra tipo arco construidos en lugares nacionales e internacionales, que daten autores y métodos.		R	A
			8	8
MARTES	Compilación de lo consultado, organización de la información e inicio de creación de gráficos de interés. Así como la continuación de la búsqueda en distintas bases de datos, ya que por ser un tema de la historia, se requiere de una búsqueda exhaustiva.		R	A
			8	8
MIÉRCOLES	Consulta de información que brinde una guía en cuanto a temas de interés que integran la construcción de un puente vehicular histórico, sus etapas constructivas, y estudios en la zona que registren información satelital. Continuación del documento con la información encontrada.		R	A
			8	8
JUEVES	Apoyo en el registro del lanzamiento Avanza TEC, en la cámara de comercio de Tunja sede norte, donde se le realizaba el respectivo ingreso de los asistentes en la base de datos del programa que busca democratizar el acceso a las habilidades digitales.		R	A
			8	8
VIERNES	Realización de mapas con información encontrada en bases de datos relevantes, como vías principales y estudios realizados en el área de interés.		R	A
			8	8
SABADO			R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)	
•	•
•	•
•	•

APORTES DEL ESTUDIANTE	

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Gloria Esperanza Católico González.	Nombre:	Harold Alexander Álvarez Castañeda.	Nombre:	Lina Juliana Castillo Alarcón.
Empresa		Universidad		Estudiante	

	UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL	Logo Empresa
---	---	-----------------



Nombre empresa	Secretaria de cultura, turismo y patrimonio territorial.			
Nombre estudiante	Lina Juliana Castillo Alarcón			
Semana No.	4	Rango fecha	05-08-2024 - 09-08-2024	Total Horas Aprobadas 32

ACTIVIDADES REALIZADAS				Horas	
Actividad				R:Reportadas A:Aprobadas	
LUNES	Consulta sobre historia que permita tener una noción de la construcción de bienes patrimoniales representativos en la ciudad de Tunja. Tramite de solicitud en la secretaria administrativa del soporte de pago de la ARL, correspondiente al primer mes.			R	A
				8	8
MARTES	Consulta de registros históricos de la construcción de un puente tipo arco en piedra, y búsqueda de datos relevantes de la zona de interés, con personas que frecuentan o habitan cerca del área en estudio.			R	A
				8	8
MIÉRCOLES	Día festivo.			R	A
				0	0
JUEVES	Registro fotográfico y toma de medidas del segundo puente en estudio, cuyo objetivo es declararlo bien patrimonial, ubicado a un costado sur de la universidad de Boyacá sobre la Cra 2a este. Se tomo la medida de cada roca que conforma el puente, tanto de ancho como de alto, espacios entre las mismas y medidas de andén. Inicio de procesamiento y organización de la información registrada en campo.			R	A
				8	8
VIERNES	Continuación del procesamiento de la información, como organización del documento en curso y sistematización en softwares como AutoCAD, google earth y Arcgis.			R	A
				8	8
SABADO				R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)	
 ● Espacio 1 cm	 ● 30 cm

 74 cm	 30 cm
•	•
•	•

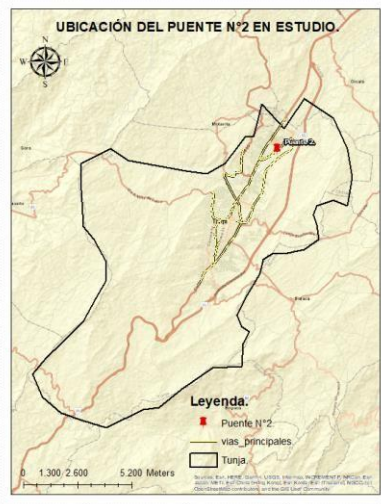
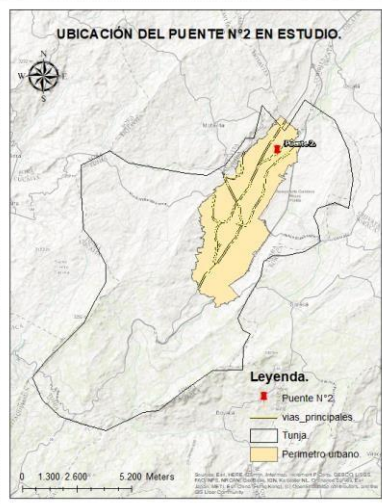
APORTES DEL ESTUDIANTE

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Glória Esperanza Católico González.	Nombre:	Harold Alexander Álvarez Castañeda.	Nombre:	Lina Juliana Castillo Alarcón.
Empresa		Universidad		Estudiante	

	UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL	Logo Empresa
---	---	--



Nombre empresa	Secretaria de cultura, turismo y patrimonio territorial.			
Nombre estudiante	Lina Juliana Castillo Alarcón.			
Semana No.	5	Rango fecha	12 08 2024 - 16 08 2024	Total Horas Aprobadas 40

ACTIVIDADES REALIZADAS		Horas	
	Actividad	R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	Realización de mapas con la ubicación del puente número 2 en estudio, ubicado a un costado de la universidad de Boyacá; con información relevante como perímetro urbano, avenidas principales interconectadas y suelos de protección en formato shape (shp). La búsqueda de la información satelital siempre requiere de un tiempo considerable para la filtración de información y datos de calidad.	R	A
		8	8
MARTES	Organización de la información obtenida, estructuración de los mapas con alto detalle y análisis general de la zona.	R	A
		8	8
MIÉRCOLES	Sistematización del puente n°1 en estudio a un costado de la clínica medilaser en programas como AutoCAD y ArcMap. Dibujo del puente escalado a medidas reales y arco georreferenciado.	R	A
		8	8
JUEVES	Continuación del procesamiento de la información recolectada en campo (medidas de cada roca que integra el puente), análisis de la construcción del puente tipo arco; registro de la información por capas.	R	A
		8	8
VIERNES	Compilación de la información y finalización del proceso en AutoCAD realizando una vista en planta del puente número 1 en estudio y otras vistas en alzado, agregando una ubicación general de patologías presentes en el puente.	R	A
		8	8
SABADO		R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)			
			



APORTES DEL ESTUDIANTE

Firma 		Firma 		Firma 	
Nombre:	Glória Esperanza Católico González.	Nombre:	Harold Alexander Álvarez Castañeda.	Nombre:	Lina Juliana Castillo Alarcón.
Empresa		Universidad		Estudiante	



	UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL		Logo Empresa

Nombre empresa		Secretaria de cultura, turismo y patrimonio territorial.					
Nombre estudiante		Lina Juliana Castillo Alarcón					
Semana No.	6	Rango fecha	19-08-2024	-	23-08-2024	Total Horas Aprobadas	16

ACTIVIDADES REALIZADAS				Horas	
Actividad				R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	Día festivo.			R	A
				0	
MARTES	Toma de medidas del tramo faltante del puente en estudio al costado de la universidad de Boyacá, este registro se realizó roca por roca, tratando de identificar a su vez el estado actual de las mismas.			R	A
				8	8
MIÉRCOLES	Organización de la información obtenida en campo, interpretación del dibujo y compilación con las medidas del otro tramo, para iniciar con el proceso de sistematización.			R	A
				8	8
JUEVES				R	A
VIERNES				R	A
SABADO				R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)	
	•
•	•
•	•




APORTES DEL ESTUDIANTE	

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Gloria Esperanza Católico González.	Nombre:	Harold Alexander Álvarez Castañeda.	Nombre:	Lina Juliana Castillo Alarcón.
Empresa		Universidad		Estudiante	



	UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL	Logo Empresa
---	---	--

Nombre empresa	Secretaria de cultura, turismo y patrimonio territorial.			
Nombre estudiante	Lina Juliana Castillo Alarcón			
Semana No.	7	Rango fecha	26-08-2024 - 30-08-2024	Total Horas Aprobadas 40

ACTIVIDADES REALIZADAS		Horas	
Actividad		R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	Reunión con la arquitecta tutora, donde se explica el trabajo a realizar, el enfoque de este y la próxima organización con el grupo de pasantes. Distribución de tareas como la consulta de estudios de vulnerabilidad en bienes patrimoniales. Inicio de consulta estudios de vulnerabilidad sísmica en tipologías de adobe, en fuentes internacionales, teniendo como base la construcción y el estudio de estructuras en países como Perú y México.	R	A
		8	8
MARTES	Investigación de estudios de vulnerabilidad sísmica en tipologías de bareque, realizando cuadros comparativos de construcciones patrimoniales y contemporáneas, identificando métodos constructivos.	R	A
		8	8
MIÉRCOLES	Consulta de información registrada de construcciones en tipología de tapia en fuentes nacionales e internacionales.	R	A
		8	8
JUEVES	Continuación de la búsqueda y depuración la información de interés y de valor para el informe.	R	A
		8	8
VIERNES	Consolidación y organización del documento en curso, con la información que se consultó en las distintas fuentes bibliográficas.	R	A
		8	8
SABADO		R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)									
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="199 1564 565 1596">TIPO DE FALLA</th><th data-bbox="565 1564 792 1596">ESQUEMA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="199 1596 565 1690"> Flexión perpendicular al plano del muro. Agrietamiento horizontal en la base o a una altura intermedia y agrietamientos verticales adicionales. Esto se presenta frecuentemente en muros largos. </td><td data-bbox="565 1596 792 1690">  </td></tr> <tr> <td data-bbox="199 1690 565 1785"> Falla por flexión perpendicular al plano del muro con agrietamiento vertical en la zona central. Agrietamiento diagonal que constituye el mecanismo de falla y fisuración en la parte superior. </td><td data-bbox="565 1690 792 1785">  </td></tr> <tr> <td data-bbox="199 1785 565 1890"> Falla por flexión perpendicular al plano en las esquinas no confinadas de muros suntuos, o en esquinas no conectadas efectivamente con los muros transversales. </td><td data-bbox="565 1785 792 1890">  </td></tr> </tbody> </table>	TIPO DE FALLA	ESQUEMA	Flexión perpendicular al plano del muro. Agrietamiento horizontal en la base o a una altura intermedia y agrietamientos verticales adicionales. Esto se presenta frecuentemente en muros largos.		Falla por flexión perpendicular al plano del muro con agrietamiento vertical en la zona central. Agrietamiento diagonal que constituye el mecanismo de falla y fisuración en la parte superior.		Falla por flexión perpendicular al plano en las esquinas no confinadas de muros suntuos, o en esquinas no conectadas efectivamente con los muros transversales.		
TIPO DE FALLA	ESQUEMA								
Flexión perpendicular al plano del muro. Agrietamiento horizontal en la base o a una altura intermedia y agrietamientos verticales adicionales. Esto se presenta frecuentemente en muros largos.									
Falla por flexión perpendicular al plano del muro con agrietamiento vertical en la zona central. Agrietamiento diagonal que constituye el mecanismo de falla y fisuración en la parte superior.									
Falla por flexión perpendicular al plano en las esquinas no confinadas de muros suntuos, o en esquinas no conectadas efectivamente con los muros transversales.									

APORTES DEL ESTUDIANTE

Firma 		Firma 		Firma 	
Nombre:	Gloria Esperanza Católico González.	Nombre:	Harold Alexander Álvarez Castañeda.	Nombre:	Lina Juliana Castillo Alarcón.
Empresa		Universidad		Estudiante	

	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL				Logo Empresa	



Nombre empresa		Secretaria de cultura, turismo y patrimonio territorial.					
Nombre estudiante		Lina Juliana Castillo Alarcón.					
Semana No.	8	Rango fecha	02-09-2024	-	06-09-2024	Total Horas Aprobadas	40

ACTIVIDADES REALIZADAS						Horas	
Actividad						R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	Primera revisión de la información consultada, por parte del arquitecto encargado y sugerencias recibidas. Inicio de las correcciones del informe teórico y primera revisión del trabajo del puente número 1 (levantamiento de las medidas tomadas).					R	A
						8	8
MARTES	Ampliación de la información requerida en el informe teórico y organización de esta.					R	A
						8	8
MIÉRCOLES	Segunda revisión del puente número 1 en estudio, en formato DWG por parte del arquitecto, sugerencias y comentarios acerca del mismo con conceptos arquitectónicos por corregir, igualmente ubicación adecuada de las patologías percibidas. Inicio de las correcciones mencionadas.					R	A
						8	8
JUEVES	Continuación de las correcciones dadas, como medidas proporcionales, tipo de arco visualizado y correcta disposición de las patologías, bien sean mecánicas, físicas o antrópicas.					R	A
						8	8
VIERNES	Análisis del puente en estudio, teniendo en cuenta que, por ser una construcción muy antigua, el estudio de esta conlleva un tiempo considerable, en busca de información precisa en métodos constructivos.					R	A
						8	8
SABADO						R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)	
•	•
•	•
•	•

APORTES DEL ESTUDIANTE

--

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Gloria Esperanza Católico González.	Nombre:	Harold Alexander Álvarez Castañeda.	Nombre:	Lina Juliana Castillo Alarcón.
Empresa		Universidad		Estudiante	

	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL	Logo Empresa
---	---	-----------------



Nombre empresa	Secretaria de cultura, turismo y patrimonio territorial.			
Nombre estudiante	Lina Juliana Castillo Alarcón			
Semana No.	9	Rango fecha	09-09-2024 - 13-09-2024	Total Horas Aprobadas 40

ACTIVIDADES REALIZADAS				Horas	
Actividad				R:Reportadas A:Aprobadas	
LUNES	Búsqueda de información histórica de los puentes en la ciudad, y de estructuras declaradas como patrimoniales.			R	A
				8	8
MARTES	Registro de patologías del puente, mejoramiento en el análisis de las mimas y en la toma fotográfica de estas. Digitalización de la información captada.			R	A
				8	8
MIÉRCOLES	Reunión general con los demás integrantes de la pasantía en la unidad de patrimonio territorial, en compañía de los arquitectos líderes. Explicación detallada del trabajo a realizar, análisis de trabajos antes realizados que funcionan como ejemplos guía. Recorrido por toda la casa del fundador con el fin de conocer la importancia de la realización de planos arquitectónicos con las medidas reales y exactas. Organización y asignación de tareas dentro del equipo de trabajo e inicio de estas.			R	A
				8	8
JUEVES	Reconocimiento de las actividades dadas, estudio de patologías como sus significados y los distintos tipos, análisis preliminar de dicha estructura y el estado en el que se encuentra.			R	A
				8	8
VIERNES	Inicio de la toma de medidas en la casa del fundador, análisis del plano de dicha estructura patrimonial y organización del trabajo realizado en grupo.			R	A
				8	8
SABADO				R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)			
•		•	

• •		• •	
--------	--	--------	---

APORTES DEL ESTUDIANTE			

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Gloria Esperanza Católico González.	Nombre:	Harold Alexander Álvarez Castañeda.	Nombre:	Lina Juliana Castillo Alarcón.
Empresa		Universidad		Estudiante	



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

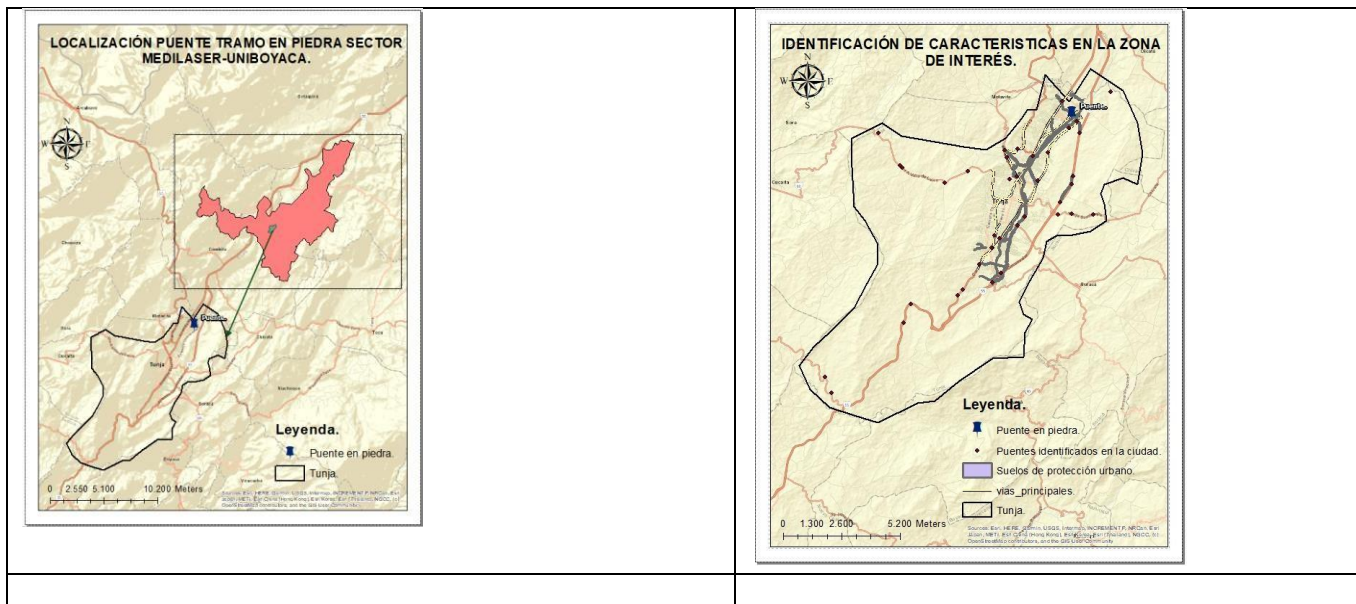
FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL

Nombre empresa	Secretaria de cultura, turismo y patrimonio territorial.				
Nombre estudiante	Lina Juliana Castillo Alarcón.				
Semana No.	1	Rango fecha	15 07 2024	-	19 07 2024
Total Horas Aprobadas				36	



ACTIVIDADES REALIZADAS				Horas	
Actividad				R:Reportadas A:Aprobadas	
LUNES	Reunión inicial en la secretaria de cultura, turismo y patrimonio territorial, con los arquitectos, quienes me explicaron las actividades y el objetivo de ellas. Asignación de dos puentes con tramo en piedra en la ciudad de Tunja, que serán objetivos de estudio, de estos dieron instrucciones de ubicación específicas.			R	A
				8	8
MARTES	Visita a los lugares de estudio en el barrio Muiscas, donde se ubican los puentes cuyo objetivo es declararlos bien patrimonial. Toma de fotografías iniciales, para verificar el estado de ellos de forma visual.			R	A
				4	4
MIÉRCOLES	Creación de documento preliminar, con localización de la zona de estudio. Revisión de información existente y normativa que puede aplicar a puentes.			R	A
				8	8
JUEVES	Creación de mapas con la localización del puente de estudio número 1 ubicado en el barrio muiscas específicamente en la carrera 2 a este. Realización de mapa con información consultada en formatos shapes, como vías principales, suelos de protección urbano y puentes identificados en la ciudad.			R	A
				8	8
VIERNES	Organización de la información obtenida y análisis de esta. Recopilando la información en un documento que fue revisado por el arquitecto encargado, quien realizo objetivamente comentarios del mismo y menciono los temas que se podían agregar al mismo.			R	A
				8	8
SABADO				R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)





APORTES DEL ESTUDIANTE



Firma 		Firma 		Firma 	
Nombre:	Gloria Esperanza Católico González.	Nombre:	Harold Alexander Álvarez Castañeda.	Nombre:	Lina Juliana Castillo Alarcón.
Empresa		Universidad		Estudiante	

	UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL	Logo Empresa
---	---	--


Nombre empresa		Secretaria de cultura, turismo y patrimonio territorial.					
Nombre estudiante		Lina Juliana Castillo Alarcón					
Semana No.	10	Rango fecha	16 09 2024	-	20 09 2024	Total Horas Aprobadas	40

ACTIVIDADES REALIZADAS		Horas	
	Actividad	R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	Organización de las medidas tomadas, con apoyo de un plano inicial brindado y reconocimiento de las patologías encontradas, con registro específico de fotos.	R	A
		8	8
MARTES	Digitalización de las medidas tomadas en el software especializado para diseño AutoCAD, de la planta del primer piso, teniendo en cuenta el área construida distribuida en oficinas y espacios comunes.	R	A
		8	8
MIÉRCOLES	Digitalización y realización del plano de la segunda planta.	R	A
		8	8
JUEVES	Ubicación de patologías por medio de fotografías, de forma general, y realización de detalles finales en los planos realizados.	R	A
		8	8
VIERNES	Revisión por parte del arquitecto tutor de la información presentada en formato DWG, el cual sugiere varias correcciones considerables acerca de la exactitud de las medidas presentadas y ubicación de las patologías encontradas. Sugiere realizar de nuevo la actividad con la toma de medidas precisas de toda el área de la casa del fundador. Distribución de dicha tarea en grupos de tres e inicio nuevamente de la actividad, con mejores y más herramientas de medida.	R	A
		8	8
SABADO		R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)	
Evidencia de la toma de medidas.	Evidencia de las patologías halladas.

	
PLANTA PRIMER PISO 	PATOLOGIAS REGISTRO FOTOGRAFICO PLANTA SEGUNDO PISO   ALUMENOS (ALUMENOS): Ventanas, ruptura láminas vidrio HUMEDADES: Escalón del material del muro HONGOS: GRIETAS: CORROSION: HONGOS NEGROS Y ALGA POR HUMEDAD

APORTES DEL ESTUDIANTE

Firma 	Firma 	Firma 
Nombre: Gloria Esperanza Católico González.	Nombre: Harold Alexander Álvarez Castañeda.	Nombre: Lina Juliana Castillo Alarcón.
Empresa	Universidad	Estudiante

	UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL	Logo Empresa
---	---	-----------------

Nombre empresa	Secretaria de cultura, turismo y patrimonio territorial.				
Nombre estudiante	Lina Juliana Castillo Alarcón.				
Semana No.	11	Rango fecha	23-09-2024 - 28-09-2024	Total Horas Aprobadas	47

ACTIVIDADES REALIZADAS					Horas	
Actividad					R:Reportadas A:Aprobadas	
LUNES	Toma de medidas de la primera planta de la casa del fundador, zona de oficinas (biblioteca, oficina principal de la secretaria), salón de expresidentes y depósitos.				R	A
					8	8
MARTES	Registro de las medidas de las zonas comunes de la casa del fundador, pasillos, zonas de jardín, zona dispuesta como oficina de la policía de turismo.				R	A
					8	8
MIÉRCOLES	Toma de medidas en las partes internas faltantes, debido a que esto se restringía por temas de horario, disponibilidad de acceso (llaves) y disponibilidad de los funcionarios que las ocupan. Continuación de la toma de medidas en escaleras y la segunda planta de la casa parte externa de la misma.				R	A
					8	8
JUEVES	Toma de medidas de la parte interna de la segunda planta de la casa del fundador, lo que integra recámara, comedor, despacho, salón principal, oratorio, costurero, baño, comedor y balcones.				R	A
					8	8
VIERNES	Registro de medidas faltantes como la oficina de la segunda planta y toma fotográfica de las patologías presentes en esta zona.				R	A
					8	8
SABADO	Acompañamiento a la unidad de patrimonio en el desarrollo del concurso de dibujo y fotografía programados dentro del marco del mes del patrimonio. Apoyo en el registro de las personas inscritas en las diferentes categorías, acompañamiento por grupos en el parque Pinzón mientras se cumplía el tiempo asignado del concurso, y recepción del material por parte de los concursantes.				R	A
					8	7

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)	
Acompañamiento concurso de dibujo. 	



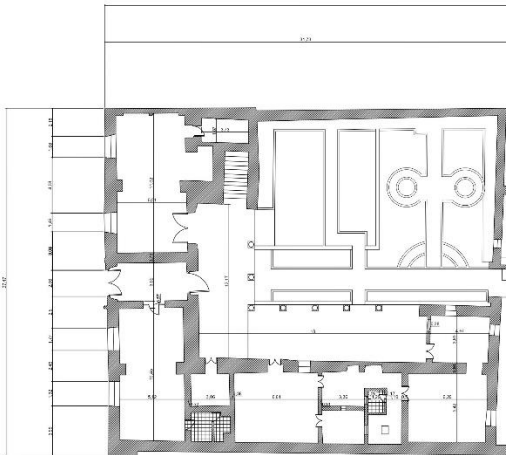
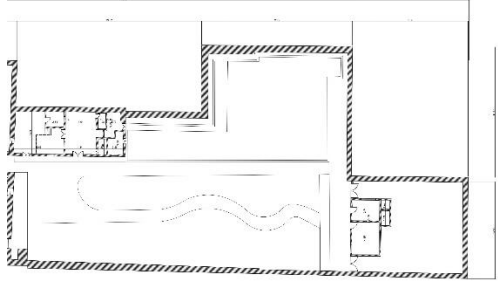
APORTES DEL ESTUDIANTE

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Gloria Esperanza Católico González.	Nombre:	Harold Alexander Álvarez Castañeda.	Nombre:	Lina Juliana Castillo Alarcón.
Empresa		Universidad		Estudiante	

	UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL	Logo Empresa
---	---	--

Nombre empresa	Secretaria de cultura, turismo y patrimonio territorial.		
Nombre estudiante	Lina Juliana Castillo Alarcón.		
Semana No.	12	Rango fecha 30-09-2024 - 04-10-2024	Total Horas Aprobadas 40

ACTIVIDADES REALIZADAS		Horas	
	Actividad	R:Reportadas A:Aprobadas	
LUNES	Sistematización de las medidas de la primera planta, en el software de diseño AUTOCAD, primera parte como oficinas principales, academia boyacense, biblioteca y salón de expresidentes, junto con el jardín más próximo. Para este diseño se tuvieron en cuenta las diagonales como facilidad en la exactitud de las medidas.	R	A
		8	8
MARTES	Sistematización de las medidas de la primera planta, en el software de diseño AUTOCAD, oficinas faltantes ubicadas en medio de los jardines, oficina de la policía de turismo y el jardín.	R	A
		8	8
MIÉRCOLES	Sistematización de las medidas de la segunda planta en su totalidad, en el software de diseño AUTOCAD.	R	A
		8	8
JUEVES	Realización de cortes longitudinal, transversal y diseño de la fachada principal.	R	A
		8	8
VIERNES	Detalles finales del plano de la segunda planta, con la respectiva ubicación de las patologías halladas por medio de softwares de dibujo.	R	A
		8	8
SABADO		R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)	
	


	UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL		Logo Empresa

Nombre empresa		Secretaria de cultura, turismo y patrimonio territorial.					
Nombre estudiante		Lina Juliana Castillo Alarcón					
Semana No.	13	Rango fecha	07-10-2024	-	11-10-2024	Total Horas Aprobadas	40

ACTIVIDADES REALIZADAS						Horas	
Actividad						R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	Revisión del levantamiento por parte de los arquitectos, quienes dan respectivas correcciones en temas de patologías, ya que hacía falta la ubicación con mas detalle de las mismas. Inicio de las correcciones dadas.					R	A
						8	8
MARTES	Ubicación de las patologías en la primera planta.					R	A
						8	8
MIÉRCOLES	Realización de la correcta ubicación de las patologías de la segunda planta, con evidencia fotográfica de estas.					R	A
						8	8
JUEVES	Recorrido por la casa del fundador con el fin de tomar fotografías de patologías faltantes. Organización de las evidencias fotográficas en el documento de clasificación de patologías.					R	A
						8	8
VIERNES	Representación de las patologías en la totalidad del plano correspondiente a la casa del fundador.					R	A
						8	8
SABADO						R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)	
•	•
•	•
•	•

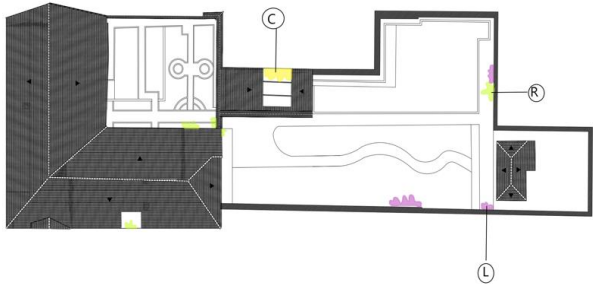
APORTES DEL ESTUDIANTE	

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Gloria Esperanza Católico González.	Nombre:	Harold Alexander Álvarez Castañeda.	Nombre:	Lina Juliana Castillo Alarcón.
Empresa		Universidad		Estudiante	

	UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL	Logo Empresa
---	---	--



Nombre empresa	Secretaria de cultura, turismo y patrimonio territorial.			
Nombre estudiante	Lina Juliana Castillo Alarcón.			
Semana No.	14	Rango fecha	14-10-2024 - 18-10-2024	Total Horas Aprobadas 40

ACTIVIDADES REALIZADAS			Horas	
Actividad			R:Reportadas A:Aprobadas	
LUNES	Revisión del trabajo realizado por parte del arquitecto tutor, quien sugiere correcciones en la totalidad de las patologías. Inicio de las correcciones anteriormente mencionadas.		R	A
			8	8
MARTES	Recorrido por la casa del fundador en compañía de los arquitectos, con el fin de identificar con precisión las patologías y la adecuada clasificación de las mismas. Registro fotográfico.		R	A
			8	8
MIÉRCOLES	Construcción del plano de la cubierta.		R	A
			8	8
JUEVES	Ubicación de patologías de cubierta, con el apoyo de fotografías por drones, proporcionada en la unidad de patrimonio.		R	A
			8	8
VIERNES	Recepción de sugerencias y correcciones en la construcción de la cubierta. Respectiva corrección en la planimetría de cubierta.		R	A
			8	8
SABADO			R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)	
	

APORTES DEL ESTUDIANTE



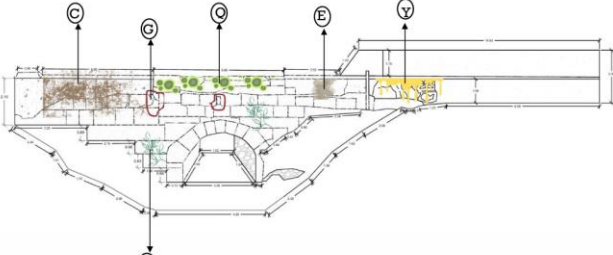
--

Firma 		Firma 		Firma 	
Nombre:	Gloria Esperanza Católico González.	Nombre:	Harold Alexander Álvarez Castañeda.	Nombre:	Lina Juliana Castillo Alarcón.
Empresa		Universidad		Estudiante	

	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL	Logo Empresa
---	---	--



Nombre empresa	Secretaria de cultura, turismo y patrimonio territorial.			
Nombre estudiante	Lina Juliana Castillo Alarcón.			
Semana No.	15	Rango fecha	21-10-2024 - 25-10-2024	Total Horas Aprobadas 40

ACTIVIDADES REALIZADAS		Horas	
	Actividad	R:Reportadas A:Aprobadas	
LUNES	Corrección del levantamiento del puente de acuerdo con comentarios dados por los arquitectos, adecuada representación de las patologías identificadas en el puente pinzón.	R 8	A 8
MARTES	Realización del adecuado acotamiento del puente y organización del documento final con las correcciones dadas.	R 8	A 8
MIÉRCOLES	Revisión de la planimetría de la casa del fundador, agregando en su totalidad las cotas, perfeccionamiento de estas en tema de tamaño y tipo de letra.	R 8	A 8
JUEVES	Acotamiento de los cortes y fachadas, y ubicación de las patologías en estas.	R 8	A 8
VIERNES	Compilación de la información, como planos y muestra de patologías. Perfeccionamiento y corrección del levantamiento de la casa del fundador para entrega final del producto.	R 8	A 8
SABADO		R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)			
			
			

•	•
---	---

APORTES DEL ESTUDIANTE	

Firma 		Firma 		Firma 	
Nombre:	Gloria Esperanza Católico González.	Nombre:	Harold Alexander Álvarez Castañeda.	Nombre:	Lina Juliana Castillo Alarcón.
Empresa		Universidad		Estudiante	


	UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL		Logo Empresa

Nombre empresa		Secretaria de cultura, turismo y patrimonio territorial.					
Nombre estudiante		Lina Juliana Castillo Alarcón.					
Semana No.	16	Rango fecha	28-10-2024	-	01-11-2024	Total Horas Aprobadas	40

ACTIVIDADES REALIZADAS						Horas	
Actividad						R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	Correcciones y perfeccionamiento de las actividades dadas.					R	A
						8	8
MARTES	Perfeccionamiento del levantamiento del puente.					R	A
						8	8
MIÉRCOLES	Corrección y perfeccionamiento del levantamiento de la casa del fundador.					R	A
						8	8
JUEVES	Correcciones finales de las tareas encargadas.					R	A
						8	8
VIERNES	Entrega final de los productos, revisión y aprobación de las mismas.					R	A
						8	8
SABADO						R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)	
•	•
•	•
•	•

APORTES DEL ESTUDIANTE	

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Gloria Esperanza Católico González.	Nombre:	Harold Alexander Álvarez Castañeda.	Nombre:	Lina Juliana Castillo Alarcón.
Empresa		Universidad		Estudiante	



	UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL		Logo Empresa

Nombre empresa		Secretaria de cultura, turismo y patrimonio territorial.					
Nombre estudiante		Lina Juliana Castillo Alarcón.					
Semana No.	17	Rango fecha	04-11-2024	-	08-11-2024	Total Horas Aprobadas	28

ACTIVIDADES REALIZADAS						Horas	
Actividad						R:Reportadas A:Aprobadas	
LUNES	Día festivo.					R	A
						0	
MARTES	Organización del documento final a entregar, debido a que la última revisión fue parcial y se realizaron las sugerencias de compilar todo y proponer de forma adecuada el plano con las respectivas evidencias fotográficas de las patologías identificadas.					R	A
						8	8
MIÉRCOLES	Continuación de los detalles finales de la casa del fundador, y compilación de toda la información del levantamiento del puente pinzón.					R	A
						8	8
JUEVES	Reunión con los arquitectos encargados quienes revisaron minuciosamente los productos entregados y realizaron las respectivas críticas y sugerencias de cada apartado, enfatizando en la representación adecuada de las patologías identificadas.					R	A
						4	4
VIERNES	Corrección de la representación patológica total de la casa del fundador.					R	A
						8	8
SABADO						R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)	
•	•
•	•
•	•

APORTES DEL ESTUDIANTE	

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Gloria Esperanza Católico Gonzáles.	Nombre:	Harold Alexander Álvarez Castañeda.	Nombre:	Lina Juliana Castillo Alarcón.
Empresa		Universidad		Estudiante	


	UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL		Logo Empresa

Nombre empresa		Secretaria de cultura, turismo y patrimonio territorial.					
Nombre estudiante		Lina Juliana Castillo Alarcón.					
Semana No.	18	Rango fecha	11-11-2024	-	15-11-2024	Total Horas Aprobadas	28

ACTIVIDADES REALIZADAS						Horas	
Actividad						R:Reportadas A:Aprobadas	
LUNES	Día festivo.					R	A
						0	
MARTES	Corrección de las sugerencias dadas por los arquitectos en el levantamiento del puente pinzón, realizando nuevamente el dibujo de las patologías en los planos correspondientes.					R	A
						8	8
MIÉRCOLES	Correcciones finales del levantamiento de la casa del fundador, mejor organización de las fotografías que muestran las patologías por cada sección de la casa y finalización del dibujo de las mismas.					R	A
						8	8
JUEVES	Acuerdo y conversación con la arquitecta encargada, quien indica la entrega de las actividades vía correo electrónico, para la respectiva evaluación de las mismas. Recepción por parte de la arquitecta de los mencionados trabajos.					R	A
						4	4
VIERNES	Revisión por parte de la arquitecta tutora, quien a su vez realiza la evaluación del trabajo desarrollado durante el tiempo de prácticas y da sus respectivas observaciones. Lo que respecta al producto entregado, hace una última sugerencia y es la organización de la presentación, para percibir mejor las patologías en cuanto al tamaño de las fotografías. Corrección oportuna de esta sugerencia.					R	A
						8	8
SABADO						R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)	
•	•
•	•
•	•

APORTES DEL ESTUDIANTE	

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Gloria Esperanza Católico González.	Nombre:	Harold Alexander Álvarez Castañeda.	Nombre:	Lina Juliana Castillo Alarcón.

Empresa	Universidad	Estudiante
---------	-------------	------------

	UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL		Logo Empresa

Nombre empresa		Secretaria de cultura, turismo y patrimonio territorial.					
Nombre estudiante		Lina Juliana Castillo Alarcón.					
Semana No.	19	Rango fecha	18-11-2024	-	22-11-2024	Total Horas Aprobadas	12

ACTIVIDADES REALIZADAS						Horas	
Actividad						R:Reportadas A:Aprobadas	
LUNES	Finalización de las correcciones de la casa del fundador y envío de las mismas junto con el formato editable del DWG, para la respectiva revisión de esto, y aprobación final de las mismas.					R	A
						8	8
MARTES	Finalización del apoyo en el ejercicio profesional brindado en la secretaria de cultura, turismo y patrimonio territorial, en conjunto con los demás pasantes y la arquitecta tutora.					R	A
						4	4
MIÉRCOLES						R	A
JUEVES						R	A
VIERNES						R	A
SABADO						R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)	
•	•
•	•
•	•

APORTES DEL ESTUDIANTE	

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Gloria Esperanza Católico González.	Nombre:	Harold Alexander Álvarez Castañeda.	Nombre:	Lina Juliana Castillo Alarcón.
Empresa		Universidad		Estudiante	

