




UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



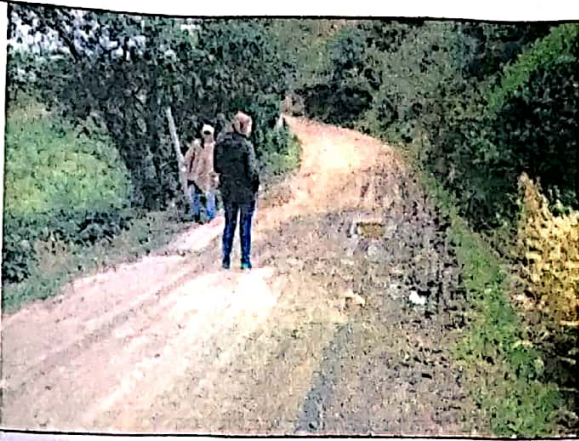
Nombre empresa	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIACHOQUE		
Nombre estudiante	Carlos Alberto Avila Burgos		
Semana No.	1	Rango fecha	30-08-2018 - 01-09-2018
Total Horas Aprobadas			28

		ACTIVIDADES REALIZADAS	Horas	
			Actividad	
			R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES			R	A
MARTES			R	A
MIERCOLES			R	A
JUEVES	Se hizo un reconocimiento fotográfico de los predios urbanos del municipio, se ubicaron delimitaron y anexaron en el plano de ordenamiento territorial del municipio de Siachoque con el programa de AutoCAD.		R	A
			10	
VIERNES	Se efectuó una salida a campo a las veredas de cormechoque, san José, sector la laguna y al sector peña negra, para ubicar zonas críticas en las que es necesario la construcción de alcantarillados viales por razones de estancamiento de aguas y de escorrentía alta, para así drenar el exceso de agua que afecta la via y el paso de los habitantes del sector.		R	A
			10	
SABADO	Se realizó una cotización de perfiles, platinas, pernos y persianas metálicas para la ampliación de la plaza de mercado.		R	A
			8	

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)



[Handwritten signature]



APORTES DEL ESTUDIANTE

Conocimiento de materiales de obra, manejo de AutoCAD e inspección de obra.

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Wilson Eduardo Acuña Ávila	Nombre:	Yeffer Fuquen Guerrero	Nombre:	Carlos Alberto Ávila Burgos
	Empresa		Universidad		Estudiante

UNIVERSIDAD DE COCABAMB



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



Nombre empresa		ALCALDIA MUNICIPAL DE SIACHOQUE		
Nombre estudiante		Carlos Alberto Avila Burgos		
Semana No.	2	Rango fecha	03-09-2018 - 07-09-2018	Total Horas Aprobadas 45




ACTIVIDADES REALIZADAS		Horas	
Actividad		R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	Se realizó la elaboración del informe de la primera salida de campo, donde se identificaron las necesidades de la comunidad y se determinó las cantidades de tubería de concreto a usar para la elaboración de las alcantarillas rurales, demostrando causas, efectos y soluciones.	R 9	A
MARTES	Se hizo una visita en conjunto con corpoboyaca a unas zonas protegidas de paramo y de propiedad del municipio, en las cuales existen fauna y flora que requieren protección y en donde se han presentado casos de invasión por gente de la comunidad. Se identificaron los casos y se dio la máxima colaboración a corpoboyaca para que tome medidas al tema.	R 9	A
MIERCOLES	Se efectuó una salida a campo a las veredas de Firaya, Tocavita, sector la mina y al sector cuatro esquinas parte alta, para ubicar zonas críticas en las que es necesaria la construcción de alcantarillados viales por razones de estancamiento de aguas y de escorrentía alta, para así drenar el exceso de agua que afecta la vía y el paso de los habitantes del sector. También se visitó un colegio donde se plantea construir una cancha multideportiva y unos andenes de paso de estudiantes para las aulas y el baño, se tomaron medidas, niveles y se determinó en que partes se van a ubicar	R 9	A
JUEVES	Se ejecutó la elaboración del informe de la segunda salida de campo, donde se identificaron las necesidades de la comunidad y se determinó las cantidades de tubería de concreto a usar para la elaboración de las alcantarillas rurales, demostrando causas, efectos y soluciones	R 9	A
VIERNES	Se efectuó una salida a campo a las veredas de Turga arriba y Turga abajo, para ubicar zonas críticas en las que es necesaria la construcción de alcantarillados viales por razones de estancamiento de aguas y de escorrentía alta, para así drenar el exceso de agua que afecta la vía y el paso de los habitantes del sector. También se visitó una vivienda donde se solicitó dotación de tubería para la incorporación de acueducto domiciliario, donde se midió y se determinó el suministro adecuado.	R 9	A
SABADO		R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)



APORTES DEL ESTUDIANTE

Conocimiento de la elaboración de obras de acueducto y de drenaje, preparación de Informes y apoyo en la enfatización de conciencia ambiental y desarrollo sostenible.

Firma 	Firma 	Firma 
Nombre: Wilson Eduardo Acuña Ávila	Nombre: Yeffer Fuquen Guerrero	Nombre: Carlos Alberto Ávila Burgos
Empresa	Universidad	Estudiante

Se recomienda riesgo 5 para las salidas a campo o a obras.

Proxima asesoría debe ser de 40 min mínimo con el pasante

Miércoles de 11:00 am a 12 m. para asesorías de todos cada 15 días



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



Nombre empresa	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIACHOQUE		
Nombre estudiante	Carlos Alberto Avila Burgos		
Semana No.	3	Rango fecha	10-09-2018 - 14-09-2018
			Total Horas Aprobadas 43

ACTIVIDADES REALIZADAS

	Actividad	Horas	
		R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	Se ejecutó la elaboración del informe de la inspección en donde ubicamos las alcantarillas a construir, se identificaron las necesidades de la comunidad y se determinó las cantidades de tubería de concreto a usar para la elaboración de las alcantarillas rurales, demostrando causas, efectos y soluciones	R 8.5	A 8.5
MARTES	Se trabajó en el plano de las instalaciones de la alcaldía, acotándolo e identificando las distintas oficinas que se encuentran en el lugar para luego presentarlo como informe.	R 8.5	A 8.5
MIÉRCOLES	Se efectuó una salida a la vereda guaticha arriba, para ubicar zonas críticas en las que es necesario la construcción de alcantarilladas viales por razones de estancamiento de aguas y de escorrentía alta, para así drenar el exceso de agua que afecta la vía y el paso de los habitantes del sector.	R 8.5	A 8.5
JUEVES	Se ejecutó la elaboración del informe de la inspección en donde ubicamos las alcantarillas a construir, se identificaron las necesidades de la comunidad y se determinó las cantidades de tubería de concreto a usar para la elaboración de las alcantarillas rurales, demostrando causas, efectos y soluciones	R 8.5	A 8.5
VIERNES	Se trabajó en la recopilación de datos del alcantarillado urbano del municipio desde el plan maestro de alcantarillado como insumo para la actualización del EOT.	R 9	A 9
SABADO		R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al Informe final)

•	•
•	•
•	•

APORTES DEL ESTUDIANTE

Conocimiento para el diagnóstico de obras de acueducto y de drenaje, preparación de informes, manejo de información y de Auto CAD

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Wilson Eduardo Azuña Ávila	Nombre:	Yeffer Fuquen Guerrero	Nombre:	Carlos Alberto Avila Burgos
Empresa		Universidad		Estudiante	



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS – SECCIONAL TUNJA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



Nombre empresa		ALCALDIA MUNICIPAL DE SIACHOQUE			
Nombre estudiante		Carlos Alberto Avila Burgos			
Semana No.	4	Rango fecha	17-09-2018	-	21-09-2018
Total Horas Aprobadas					43

ACTIVIDADES REALIZADAS		Horas	
Actividad		R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	Se trabajó en la recopilación de datos del alcantarillado urbano del municipio desde el plan maestro de alcantarillado como insumo para la actualización del EOT.	R 8.5	A
MARTES	Se hizo una visita a la plaza de mercado donde se evidencia represamiento de aguas en los canales de la cubierta de la estructura. Se realizó un registro fotográfico de la obra con ayuda de un empleado de la alcaldía para determinar las posibles causas que ocasionan esta problemática y que representan un riesgo a futuro de las condiciones de la estructura.	R 8.5	A
MIERCOLES	se ubicaron los pozos de inspección en el plano del municipio para la actualización del EOT	R 8.5	A
JUEVES	se trazó a red de alcantarillado urbano en el plano del municipio para la actualización del EOT	R 8.5	A
VIERNES	se terminó el plano del alcantarillado urbano para la actualización del EOT, el cual contiene los pozos de inspección, el trazado de la tubería, la dirección del flujo, sus cotas, diámetros, longitudes y los materiales de tubería utilizados.	R 9	A
SABADO		R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al Informe final)	
•	•
•	•
•	•

APORTES DEL ESTUDIANTE

Lectura, comprensión y digitalización de planos y conocimiento para la formulación de redes de alcantarillado urbano.

Firma	Firma	Firma
Nombre: Wilson Eduardo Acuña Ávila	Nombre: Yeffer Fuquen Guerrero	Nombre: Carlos Alberto Avila Burgos
Empresa	Universidad	Estudiante



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



Nombre empresa	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIACHOQUE		
Nombre estudiante	Carlos Alberto Avila Burgos		
Semana No.	5	Rango fecha	24-09-2018 - 28-09-2018
			Total Horas Aprobadas
			43

ACTIVIDADES REALIZADAS

	Actividad	Horas	
		R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	Se realizó la medición de la fachada de la casa de la cultura para calcular en área exterior total, requerida para calcular la cantidad de pintura necesaria para la realización del trabajo de pintada de la fachada de la infraestructura.	8.5	
MARTES	Se hizo la revisión de pozos de inspección y de tuberías del sector oeste para identificar materiales de tramos de tubería de alcantarillado urbano.	8.5	
MIERCOLES	se realizó una visita y se midió la longitud de conexión de un pozo sellado al pozo 63, en la calle 5 con carrera 5, el cual no tiene la pendiente necesaria para su conexión y trae inconvenientes a habitantes del sector, los cuales no pueden hacer uso del alcantarillado urbano.	8.5	
JUEVES	se midió y determino la dirección de un terreno en la zona central del municipio donde se plantea construir una vivienda.	8.5	
VIERNES	Se trabajó en la recopilación de datos de la red y usuarios del acueducto urbano del municipio y se trazó toda la red en AutoCAD destinado para la actualización del EOT.	9	
SABADO			

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)

•	•
•	•
•	•

APORTES DEL ESTUDIANTE

Viendo el evidente deterioro en que se encontraba una de las construcciones más representativas del municipio de Siachoque, se decidió intervenir pintando la fachada, cambiando así el ambiente del parque central y dando ejemplo a las demás construcciones para que sigan el mismo enfoque de colores. Se colaboró también en la recopilación de información de acueducto y alcantarillado municipal, facilitando así los datos en caso de una falla y encontrando falencias en puntos donde el servicio no es óptimo para trabajar al respecto.

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Wilson Eduardo Acuña Ávila	Nombre:	Yeffier Fuquen Guerrero	Nombre:	Carlos Alberto Avila Burgos
Empresa		Universidad		Estudiante	



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



Nombre empresa		ALCALDIA MUNICIPAL DE SIACHOQUE			
Nombre estudiante		Carlos Alberto Avila Burgos			
Semana No.	6	Rango fecha	01-10-2018 - 05-10-2018	Total Horas Aprobadas	43

ACTIVIDADES REALIZADAS

	Actividad	Horas	
		R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	Se ubicaron los usuarios de la red del acueducto urbano en el plano del municipio en AutoCAD destinado para la actualización del EOT.	R 8.5	A
MARTES	Se realizó una visita a terreno el cual sufre de movimiento de tierras por alto nivel freático causado por infiltración de aguas de escorrentía. En el sitio se evidencio la problemática y se plantearon medidas para mitigar los daños	R 8.5	A
MIERCOLES	se terminó el plano de red de acueducto urbano para la actualización del EOT, el cual contiene los el trazado de la tubería por zonas, dirección del flujo y los usuarios.	R 8.5	A
JUEVES	se efectuó la supervisión a las medidas de mitigación de riesgos en la zona estudiada, en la cual se realizó la elaboración de un canal natural y se nivelaron partes del terreno con ayuda de una retroexcavadora tipo pajarita, quitando así grietas por donde se presentaba la mayor infiltración de aguas y que también generaba problemática a los habitantes de la zona ya que el ganado sufría riesgos al caer en las grietas. También se estableció el punto de elaboración de una alcantarilla que drene el caudal del sitio.	R 8.5	A
VIERNES	Se determinaron y trazaron rutas de eventos de cabalgata, ruta ciclística, carnaval de la alegría y de circulación vehicular para las festividades del municipio.	R 9	A
SABADO		R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al Informe final)

•	•
•	•
•	•

APORTES DEL ESTUDIANTE

Se colaboró en la recopilación de información de la red de acueducto municipal, facilitando así los datos en caso una emergencia y de ayuda para la actualización del EOT.
También se efectuó el trabajo de supervisión de adecuación de terreno para evitar que se sigan incrementando las fallas geológicas por infiltración de aguas terrenos abajo y mejorando la calidad de vida de los dueños del terreno los cuales subsisten en gran parte de la ganadería y que a causa de las grietas impedían tener ganado en el sector.
Se trabajó en las rutas de los eventos de las fiestas las cuales ayudan en comercio y hacen que crezca el municipio culturalmente

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Wilson Eduardo Acuña Ávila	Nombre:	Yeffer Fuquen Guerrero	Nombre:	Carlos Alberto Ávila Burgos
Empresa:		Universidad		Estudiante	



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



Nombre empresa		ALCALDIA MUNICIPAL DE SIACHOQUE			
Nombre estudiante		Carlos Alberto Avila Burgos			
Semana No.	7	Rango fecha	08-10-2018	-	12-10-2018
Total Horas Aprobadas					48

ACTIVIDADES REALIZADAS		Horas	
Actividad		R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	Se realizó la importación del trazado de las rutas de los eventos de las festividades al mapa del municipio, señalando rutas, cierre de vías, inicio y fin de recorridos.	R 8.5	A <i>[Signature]</i>
MARTES	Se modificaron y determinaron las rutas y cierres de vías finales de las festividades, y se elaboró una descripción detallada de los recorridos.	R 8.5	A <i>[Signature]</i>
MIÉRCOLES	Se trabajó la elaboración del informe de la zona intervenida, en el cual incluye registro fotográfico del terreno, el antes y después del trabajo realizado.	R 8.5	A <i>[Signature]</i>
JUEVES	Se terminó el informe del terreno intervenido, mostrando evidencias de la problemática y el trabajo de mitigación hecho.	R 8.5	A <i>[Signature]</i>
VIERNES	Se colaboró en el evento de la cabalgata, la cual dio apertura al primer día de festividades del municipio, ayudando en información y acompañamiento.	R 9	A <i>[Signature]</i>
SABADO	Se ayudó en el evento del car audio, el cual hacia parte de las festividades del municipio y lo organizaba secretaria de planeación.	R 5	A <i>[Signature]</i>

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al Informe final)	
•	•
•	•
•	•

APORTES DEL ESTUDIANTE

Se sirvió de apoyo en la logística, ayudando a movilización de habitantes y visitantes del municipio en festividades.
 Se realizó el informe de justificación del trabajo hecho en la zona afectada, ayudando a los habitantes del sector y mostrando la problemática y los trabajos de mitigación hechos en la zona.

Firma <i>[Signature]</i>	Firma <i>[Signature]</i>	Firma <i>[Signature]</i>
Nombre: Wilson Eduardo Acuña Ávila	Nombre: Yeffer Fuquen Guerrero	Nombre: Carlos Alberto Ávila Burgos
Empresa	Universidad	Estudiante



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



Nombre empresa		ALCALDIA MUNICIPAL DE SIACHOQUE			
Nombre estudiante		Carlos Alberto Avila Burgos			
Semana No.	8	Rango fecha	15-10-2018 - 19-10-2018	Total Horas Aprobadas	34

ACTIVIDADES REALIZADAS

	Actividad	Horas	
		R: Reportadas	A: Aprobadas
LUNES	<i>FESTIVO</i>		
MARTES	Se ayudó en la movilidad, dando paso nuevamente por las calles que estaban cerradas por las fiestas y normalizando el tránsito de entrada y salida al municipio	R 8.5	A <i>[Handwritten mark]</i>
MIERCOLES	Se realizó una visita a una zona de riesgo en la vereda tocavita donde hay movimiento de tierras y en la cual el rio se ha llevado gran parte de la bancada del terreno, comprometiendo en gran parte una vía de acceso vehicular.	R 8.5	A <i>[Handwritten mark]</i>
JUEVES	se realizó el informe de la actividad de car audio realizada en festividades, mostrando los vehículos y las reacciones de la gente	R 8.5	A <i>[Handwritten mark]</i>
VIERNES	se realizó una visita al terreno intervenido donde se hizo el canal para ver la funcionalidad de la obra	R 8.5	A
SABADO		R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)

•	•
•	•
•	•

APORTES DEL ESTUDIANTE

Se colaboró en la normalización del tráfico del municipio después de festividades y se visitó una zona intervenida para ver el desempeño de las obras realizadas. Además se revisó otra zona afectada a las orillas del rio, la cual tiene riesgo de derrumbe.

Firma <i>[Signature]</i>	Firma <i>[Signature]</i>	Firma <i>[Signature]</i>
Nombre: Wilson Eduardo Acuña Ávila	Nombre: Yeffer Fuquen Guerrero	Nombre: Carlos Alberto Ávila Burgos
Empresa	Universidad	Estudiante



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



Nombre empresa	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIACHOQUE		
Nombre estudiante	Carlos Alberto Avila Burgos		
Semana No.	9	Rango fecha	22-10-2018 - 26-10-2018
Total Horas Aprobadas			43

ACTIVIDADES REALIZADAS		Horas	
Actividad		R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	Se realizó una visita con el alcalde, encargados de la alcaldía y en conjunto con la policía y los bomberos a una zona de riesgo donde hubo movimiento en masa, en el lugar se cerró el acceso a la vía y se determinó el área destinada para la construcción de un paso peatonal provisional, mientras se toman medidas en el caso.	8.5	A
MARTES	se elaboró la ruta de evacuación de la alcaldía del municipio de Siachoque.	8.5	A
MIÉRCOLES	Se inspeccionó la habilitación de un paso peatonal provisional en la zona del derrumbe en la vereda cormechoque abajo con ayuda de una retroexcavadora tipo pajarita.	8.5	A
JUEVES	se supervisó la construcción de una alcantarilla en una zona intervenida en la vereda cormechoque abajo con ayuda de un maestro.	8.5	A
VIERNES	se elaboró el informe de la zona del deslizamiento y de la construcción de la alcantarilla en la vereda cormechoque abajo	9	A
SABADO			

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)	
•	•
•	•
•	•

APORTES DEL ESTUDIANTE

Se elaboró la ruta de evacuación para la alcaldía de Siachoque, la cual es muy necesaria en caso de cualquier emergencia. Además, se revisó otra zona afectada por el movimiento en masa a las orillas del río en la vereda cormechoque abajo, y se supervisó la construcción de un camino peatonal provisional. También se construyó la alcantarilla que estaba pendiente en la zona intervenida en la vereda cormechoque, para que drene todas las aguas provenientes del canal y de la montaña, para así tener un manejo más adecuado de las aguas que han presentado tantos inconvenientes en la zona.

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Wilson Eduardo Acuña Ávila	Nombre:	Yeffer Fuquen Guerrero	Nombre:	Carlos Alberto Avila Burgos



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



Nombre empresa	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIACHOQUE		
Nombre estudiante	Carlos Alberto Avila Burgos		
Semana No.	10	Rango fecha	29-10-2018 - 02-11-2018
Total Horas Aprobadas			43

ACTIVIDADES REALIZADAS		Horas	
Actividad		R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	Se estudiaron los temas incluidos en la actualización del esquema de ordenamiento territorial para socializarlos con la comunidad en las reuniones establecidas en las veredas del municipio de Siachoque.	R 8.5	A 8.5
MARTES	Se realizaron las reuniones establecidas para exponer todos los estudios, planes y uso de tierras establecidos en la actualización del esquema de ordenamiento territorial en las veredas tocavita y san José, en conjunto con la empresa consultora contratada para la actualización, proyectemos soluciones	R 8.5	A 8.5
MIERCOLES	Se consultó en la página de proyectos tipo DNP los requisitos y costos para solicitar y construir una cancha sintética y un parque en el municipio de Siachoque	R 8.5	A 8.5
JUEVES	Se visitó en conjunto con un encargado de corpoboyacá un lote del municipio donde hay unos sembrados de árbol de pino, los cuales están en zona de paramo y no son propios ni convenientes en el ecosistema. Estos se contaron y midieron para sacar un estimado de la cantidad de madera que hay para su aprovechamiento.	R 8.5	A 8.5
VIERNES	Se realizaron las reuniones establecidas para exponer todos los estudios, planes y usos de tierras establecidos en la actualización del esquema de ordenamiento territorial en las veredas san Martín y cormechoque arriba, en conjunto con la empresa consultora contratada para la actualización, proyectemos soluciones	R 9	A 9
SABADO		R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al Informe final)

•	•
•	•
•	•

APORTES DEL ESTUDIANTE

Se colaboró en informar a la comunidad de las veredas sobre los estudios, planes y como va a ser el uso de tierras en la actualización del esquema de ordenamiento territorial del municipio de Siachoque, para que ellos estén al tanto de qué restricciones van a tener y del cómo van a disponer de sus tierras, de los nuevos proyectos planteados y de las zonas de peligro; minería, de paramo, etc. También se ayudó con corpoboyacá a calcular la cantidad de árboles de pino en una zona de paramo para hacer aprovechamiento de la madera y sembrar especies propias del ecosistema.

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Wilson Eduardo Acuña Ávila	Nombre:	Yeffer Fuquen Guerrero	Nombre:	Carlos Alberto Ávila Burgos



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



Nombre empresa		ALCALDIA MUNICIPAL DE SIACHOQUE			
Nombre estudiante		Carlos Alberto Avila Burgos			
Semana No.	11	Rango fecha	05-11-2018	-	09-11-2018
Total Horas Aprobadas					36




ACTIVIDADES REALIZADAS		Horas	
Actividad		R:Reportadas	A:Aprobadas
		R	A
LUNES			
MARTES	se realizó una visita a la escuela urbana para observar un problema de fuga de agua, se revisaron las cajas de inspección y se evidencio que no están funcionando correctamente, que posiblemente están tapadas y a causa de esto se está infiltrando el agua por debajo de la losa de concreto colindante a las aulas.	R 9	A
MIERCOLES	se hizo una visita a las escuelas maría auxiliadora para evidenciar un debilitamiento que tiene la estructura de unas aulas, las cuales están en peligro de colapso. También se fue a la escuela san Martin, y se tomaron medidas y se analizaron los trabajos necesarios para la adecuación de la cancha multifuncional.	R 9	A
JUEVES	se inspeccionaron unas obras entregadas por un contratista en el colegio urbano, las cuales están presentando fallas de fugas e infiltración en los baños.	R 9	A
VIERNES	se realizó el presupuesto de la construcción de la cancha de la escuela san Martin.	R 9	A
SABADO		R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al Informe final)	
•	•
•	•
•	•

APORTES DEL ESTUDIANTE

Se colaboró en la inspección de las cajas de inspección de la escuela urbana para determinar el problema de la fuga, y se evidenció que el agua no pasa por algunas cajas, determinando así que el problema se debe a una obstrucción en algún tramo entre ellas, causando así que el agua busque salida por debajo de la losa de concreto. También se visitaron las escuelas de María auxiliadora y san Martin para evidenciar la problemática y necesidades, se hizo un registro fotográfico de las estructuras en María auxiliadora y de la cancha multifuncional en san Martin para presentar la solicitud de remodelación de las obras requeridas. Además, se inspeccionaron unas obras entregadas por el contratista encargado de la construcción de los baños en el colegio urbano, las cuales presentaron fugas en el primer piso he infiltración del segundo piso. Aquí es necesario pasar el informe en la alcaldía, para que tome las medidas necesarias con el contratista

2

Firma 	Firma 	Firma 
Nombre: Wilson Eduardo Acuña Avila	Nombre: Yeffer Facuen Guerrero Universidad	Nombre: Carlos Alberto Avila Burgos Estudiante
Empresa	Universidad	Estudiante

RECIBIDO 28 NOV 2018



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



Nombre empresa		ALCALDIA MUNICIPAL DE SIACHOQUE			
Nombre estudiante		Carlos Alberto Avila Burgos			
Semana No.	12	Rango fecha	12-11-2018 - 16-11-2018	Total Horas Aprobadas	36

		ACTIVIDADES REALIZADAS	Horas	
			R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES		Actividad	R	A
MARTES	se terminó el presupuesto de la cancha multifuncional de la escuela san Martin, anexando el APU de las modificaciones.	R	A	
		9		
MIÉRCOLES	se hizo una visita a las escuela maría auxiliadora para realizar un registro más detallado del comportamiento y características de la estructura afectada.	R	A	
		9		
JUEVES	Se visitó un punto en la vereda cormechoque abajo, donde la comunidad pide la habilitación de la vía y la construcción de una alcantarilla que recoja las aguas de una quebrada.	R	A	
		9		
VIERNES	se anexó al informe del suministro para la construcción de alcantarillas verdales los registros tomados en el sector tierra azul, de la vereda Siachoque abajo.	R	A	
		9		
SABADO		R	A	




EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)	
•	•
•	•
•	•

APORTES DEL ESTUDIANTE

se hizo una visita a la escuela de María auxiliadora para recopilar información le la composición y características de los cimientos y de toda la estructura afectada para presentar un informe a la alcaldía donde se evidencie el estado de la obra y las acciones pertinentes.

Además, se realizó el presupuesto de construcción de la cancha multifuncional de la escuela san Martin y se calcularon las cantidades de obra para la construcción de la alcantarilla en la vereda Siachoque abajo, para que así los habitantes del sector, puedan disfrutar de una vía habilitada para el paso vehicular y que los estudiantes de la escuela tengan un ambiente óptimo para la recreación.

[Handwritten signature]

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Wilson Eduardo Acuña Avila	Nombre:	Yeffer Fuen Guerrero	Nombre:	Carlos Alberto Avila Burgos
	Empresa		Universidad		Estudiante

RECIBIDO 28 NOV 2018



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS – SECCIONAL TUNJA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



Nombre empresa		ALCALDIA MUNICIPAL DE SIACHOQUE			
Nombre estudiante		Carlos Alberto Avila Burgos			
Semana No.	13	Rango fecha	19-11-2018 - 23-11-2018	Total Horas Aprobadas	43

ACTIVIDADES REALIZADAS		Horas	
Actividad		R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	Se realizó el informe anexando los registros fotográficos, las medidas y necesidades encontradas en la obra y la carta de petición de la comunidad con firmas de los habitantes del sector para la construcción de la alcantarilla en el sector de la vereda Siachoque abajo, sector tierra azul.	8.5	A
MARTES	Se realizaron las modificaciones al presupuesto de la construcción de la cancha de la escuela san Martin.	8.5	A
MIERCOLES	Se elaboró un trazado detallado de las dimensiones y materiales con los que se va a construir la alcantarilla en la vereda Siachoque abajo, sector tierra azul, para calcular un estimado de cantidades de obra.	8.5	A
JUEVES	Se calcularon las cantidades de obra para la construcción de la alcantarilla en la vereda Siachoque abajo, sector tierra azul.	8.5	A
VIERNES	Se hizo el cálculo de la cantidad de pintura requería para la demarcación de la cancha multifuncional en la escuela de san Martin	9	A
SABADO			

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)	
•	•
•	•
•	•

APORTES DEL ESTUDIANTE

se terminó el presupuesto de construcción de la cancha multifuncional de la escuela san Martin, para agilizar la gestión de su ejecución y la cual necesitan sus estudiantes para su correcta recreación y desarrollo. Además se determinaron las cantidades de obra para la construcción de la alcantarilla en la vereda Siachoque abajo, que habilitaría la vía para paso vehicular.

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Wilson Eduardo Acuña Ávila	Nombre:	Yeffer Fuquén Guerrero	Nombre:	Carlos Alberto Ávila Burgos
	Empresa		Universidad		Estudiante



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS – SECCIONAL TUNJA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



Nombre empresa	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIACHOQUE		
Nombre estudiante	Carlos Alberto Avila Burgos		
Semana No.	14	Rango fecha	26-11-2018 - 30-11-2018
			Total Horas Aprobadas 43

ACTIVIDADES REALIZADAS		Horas	
Actividad		R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	se colaboró en el presupuesto para proceso de contratación para a la instalación de las luces navideñas en el parque central del municipio de Siachoque.	R 8.5	A
MARTES	Se hizo un registro del material existente para la instalación de la decoración navideña en el parque central del municipio	R 8.5	A
MIÉRCOLES	se hizo un inventario del material defectuoso y se sacó un estimado del material faltante para la instalación del alumbrado del parque central del municipio	R 8.5	A
JUEVES	se realizaron las primeras pruebas de iluminación del árbol navideño y de tubería blanca instalada en las materas del parque central	R 8.5	A
VIERNES	se supervisó la instalación de las letras iluminadas con el nombre del municipio en el parque central de Siachoque	R 9	A
SABADO		R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)

•	•
•	•
•	•

APORTES DEL ESTUDIANTE

Se colaboró con el presupuesto para el proceso de contratación, supervisión y control de la instalación del alumbrado navideño del municipio de Siachoque, para que los habitantes disfruten de un ambiente navideño agradable y fomentar el turismo en la zona.

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Wilson Eduardo Acuña Ávila	Nombre:	Yeffer Fuquen Guerrero	Nombre:	Carlos Alberto Avila Burgos
Empresa		Universidad		Estudiante	



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



Nombre empresa		ALCALDIA MUNICIPAL DE SIACHOQUE		
Nombre estudiante		Carlos Alberto Avila Burgos		
Semana No.	15	Rango fecha	03-12-2018 - 07-12-2018	Total Horas Aprobadas 43

ACTIVIDADES REALIZADAS		Horas	
Actividad		R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	Se colaboró con el suministro, supervisión e instalación de figuras navideñas alrededor de las materas del parque central del municipio	8.5	8.5
MARTES	se hizo el inventario de manguera de luz blanca instalada en materas y postes para el seguimiento del contrato	8.5	8.5
MIERCOLES	Se colaboró con el suministro, supervisión e instalación de arcos navideños alrededor de las materas del parque central del municipio	8.5	8.5
JUEVES	se empezó la realización del informe de suministro e instalación del alumbrado navideño, con registro fotográfico del avance, materiales utilizados y características del contrato.	8.5	8.5
VIERNES	se culminó la instalación del alumbrado navideño en el parque central del municipio de Siachoque, dando apertura a la noche de velitas y a la época decembrina.	9	9
SABADO			

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)

-
-
-

APORTES DEL ESTUDIANTE

Se colaboró con el suministro, supervisión y control de la instalación del alumbrado navideño del municipio de Siachoque, para que los habitantes disfruten de un ambiente navideño agradable y fomentar el turismo en la zona.

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Wilson Eduardo Acuña Ávila	Nombre:	Yeffier Fuquen Guerrero	Nombre:	Carlos Alberto Ávila Burgos
Empresa		Universidad		Estudiante	



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



Nombre empresa	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIACHOQUE				
Nombre estudiante	Carlos Alberto Avila Burgos				
Semana No.	16	Rango fecha	10-12-2018 - 14-12-2018	Total Horas Aprobadas	43

ACTIVIDADES REALIZADAS		Horas	
Actividad		R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	se realizó el inventario total de luces instaladas y se hizo el registro fotográfico del alumbrado navideño para luego añadirlo al informe.	R 8.5	A 8.5
MARTES	se hizo una visita a la vereda guaticha donde necesitan la adecuación de dos alcantarillas que no están en funcionamiento y las cuales son indispensables para la correcta evacuación de aguas y la estabilidad de la carretera.	R 8.5	A 8.5
MIERCOLES	se hicieron unas visitas a unas viviendas en la vereda de tocavita en zona de paramo, sin conexión de servicios públicos para determinar la validación de la solicitud de conexión.	R 8.5	A 8.5
JUEVES	se realizó una visita a la casa del señor Manuel Desalvador en la vereda de Tocavita, donde solicitaron suministro de tubería para la conexión al acueducto verdal. Aquí se midió la brecha donde va a ir la tubería para rectificar que las cantidades solicitadas son las necesitadas.	R 8.5	A 8.5
VIERNES	se terminó el informe de instalación del alumbrado navideño, donde se anexó el proceso de instalación de inicio a fin, las características y costos del proyecto.	R 9	A 9
SABADO		R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)	
•	•
•	•
•	•

APORTES DEL ESTUDIANTE

Se realizó un inventario detallado de las luces instaladas por el contratista en el municipio de Siachoque, para verificar el cumplimiento del contrato y conforme a esto se hizo la realización del informe del trabajo realizado. Además, se efectuó la visita a dos puntos en la vereda tocavita para inspeccionar la necesidad del arreglo de las alcantarillas que están tapadas. se visitaron unas viviendas en zona de paramo para validar la instalación de servicios públicos que están solicitando y se midieron las cantidades necesarias para el suministro de tubería para la conexión a la red de acueducto del domicilio del señor Manuel Desalvador en la vereda de Tocavita

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Wilson Eduardo Acuña Ávila	Nombre:	Yeffer Fuquen Guerrero	Nombre:	Carlos Alberto Avila Burgos



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL






Nombre empresa		ALCALDIA MUNICIPAL DE SIACHOQUE			
Nombre estudiante		Carlos Alberto Avila Burgos			
Semana No.	17	Rango fecha	17-12-2018 - 21-12-2018	Total Horas Aprobadas	43

ACTIVIDADES REALIZADAS		Horas	
Actividad		R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	se colaboró con la supervisión del inicio de obra de la adecuación de la calle 3 entre carreras 6 y 7, donde se hicieron actividades correspondientes a demolición de la carpeta asfáltica existente.	8.5	A
MARTES	Se ayudó con la elaboración del informe de supervisión de cumplimiento de contrato de prestación del servicio público para la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos en el marco de la ley 1575 de 2012 para la jurisdicción del municipio de Siachoque - Boyacá.	8.5	A
MIÉRCOLES	Se ayudó con la elaboración del informe de supervisión de cumplimiento de contrato de suministro de combustible (gasolina corriente regular y diésel corriente - acpm) para el funcionamiento y operación del banco de maquinaria, buses escolares y vehículos de propiedad del municipio de Siachoque y vehículos adscritos a la estación de policía del municipio de Siachoque – Boyacá, para la vigencia 2018	8.5	A
JUEVES	Se ayudó con la elaboración del informe de supervisión de cumplimiento de contrato de prestación de servicios como inspector de la operación y funcionamiento del banco de maquinaria, buses y demás vehículos de propiedad del municipio del municipio de Siachoque - Boyacá.	8.5	A
VIERNES	Se colaboró con la elaboración del informe de supervisión de cumplimiento de contrato de prestación de servicios como operador de maquinaria amarilla motoniveladora de propiedad del municipio del municipio de Siachoque - Boyacá	9	A
SABADO			

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)	
•	•
•	•
•	•

APORTES DEL ESTUDIANTE

Se supervisó el trabajo de demolición de la carpeta asfáltica existente de la calle 3 entre carreras 6 y 7, contrato que está en proceso de ejecución para la pavimentación de la vía que es un acceso a la cabecera del municipio. Además, se ayudó con la elaboración de informes de supervisión de cumplimiento de los contratos de la prestación de servicios durante el año 2018 de la gestión integral de riesgos prestada por los bomberos, el suministro de combustible prestado por la estación de servicio, la inspección de la operación de la maquinaria y vehículos del municipio, y del cumplimiento del contrato de prestación del servicio de operador de la motoniveladora del municipio.

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Wilson Eduardo Acuña Avila	Nombre:	Yeffer Fuquen Guerrero	Nombre:	Carlos Alberto Ávila Burgos
	Empresa		Universidad		Estudiante





UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



Nombre empresa	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIACHOQUE				
Nombre estudiante	Carlos Alberto Avila Burgos				
Semana No.	18	Rango fecha	24-12-2018 - 28-12-2018	Total Horas Aprobadas	30

ACTIVIDADES REALIZADAS		Horas	
Actividad		R:Reportadas	A:Aprobadas
		R	A
LUNES		0	
MARTES		0	
MIERCOLES	Se realizó una visita a la escuela urbana para inspeccionar estado de los muros que cercan el establecimiento y verificar el problema reportado. Se encontró la caída de la estructura de los muros en la parte trasera de la escuela.	R 10	A
JUEVES	Se supervisó la realización del estudio de suelos con la empresa contratada, para sacar muestras de la zona afectada y esclarecer las causas del siniestro en la escuela urbana.	R 10	A
VIERNES	Se colaboró con la elaboración del informe de vulnerabilidad de los muros de la escuela urbana, mostrando los trabajos realizados en el estudio de suelos de la zona afectada y el registro fotográfico de las condiciones en que se encuentran los muros para tomar las medidas correspondientes al caso.	R 10	A
SABADO		R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)	
•	•
•	•
•	•

APORTES DEL ESTUDIANTE

Se ayudó con los trabajos de inspección de la zona afectada, los estudios de suelos y la realización del informe de vulnerabilidad de la estructura del cercamiento de la escuela urbana, para así tomar las medidas pertinentes que ayuden a normalizar la integridad de los muros afectados.

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Wilson Eduardo Acuña Ávila	Nombre:	Yeffer Fuquen Guerrero	Nombre:	Carlos Alberto Avila Burgos
	Empresa		Universidad		Estudiante



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



Nombre empresa		ALCALDIA MUNICIPAL DE SIACHOQUE			
Nombre estudiante		Carlos Alberto Avila Burgos			
Semana No.	19	Rango fecha	31-12-2018	-	04-01-2019
					Total Horas Aprobadas
					20

		Actividad	Horas	
			R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES			R	A
			0	
MARTES			R	A
			0	
MIÉRCOLES			R	A
			0	
JUEVES	Se colaboró con la elaboración del informe de supervisión de cumplimiento de contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión como técnico electricista para el mantenimiento, preventivo y correctivo de la red de alumbrado del municipio de Siachoque- Boyacá		R	A
			10	
VIERNES	Se colaboró con la elaboración del informe de supervisión de cumplimiento de contrato de prestación de servicios para realización de valúo y levantamiento topográfico de predios de interés hídrico en el municipio de Siachoque- Boyacá		R	A
			10	
SABADO			R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)	
•	•
•	•
•	•

APORTES DEL ESTUDIANTE

Se ayudó con la elaboración de informes de supervisión de cumplimiento de los contratos de la prestación de servicios durante el año 2018 de apoyo a la gestión como técnico electricista para el mantenimiento, preventivo y correctivo de la red de alumbrado, y del contrato de prestación de servicios para realización de valúo y levantamiento topográfico de predios de interés hídrico en el municipio de Siachoque.

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Wilson Eduardo Acuña Ávila	Nombre:	Yeffer Fuquen Guerrero	Nombre:	Carlos Alberto Avila Burgos
	Empresa		Universidad		Estudiante



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



Nombre empresa		ALCALDIA MUNICIPAL DE SIACHOQUE				
Nombre estudiante		Carlos Alberto Avila Burgos				
Semana No.	20	Rango fecha	07-01-2019	-	11-01-2019	
					Total Horas Aprobadas	40

		Actividad	Horas	
			R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES			R	A
			0	
MARTES	Se colaboró con la elaboración del informe de supervisión de cumplimiento de contrato de estudios y diseños para la formulación de proyectos de mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huella en el municipio de Siachoque - Boyacá.		R	A
			10	
MIÉRCOLES	Se colaboró con la elaboración del informe de supervisión de cumplimiento de contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en la vereda san francisco del municipio toca descrito en la escritura pública nº 54 del 3 de junio de 1980 notaria del circuito de toca.		R	A
			10	
JUEVES	Se colaboró con la elaboración del informe de supervisión de cumplimiento de contrato de mejoramiento y adecuaciones de la parte eléctrica del polideportivo de propiedad del municipio de Siachoque - Boyacá.		R	A
			10	
VIERNES	Se realizó una visita a la casa del señor Juan Vargas en la vereda tocavita, donde hubo un incendio en un cuarto por una falla eléctrica que ocasionó un corto que desato el incendio. Se está solicitando reparación de daños por parte de la alcaldía.		R	A
			10	
SABADO			R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)	
•	•
•	•
•	•

APORTES DEL ESTUDIANTE

Se ayudó con la elaboración de informes de supervisión de cumplimiento del contrato de mínima cuantía de estudios y diseños para la formulación de proyectos de mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huella en el municipio, contrato de mejoramiento y adecuaciones de la parte eléctrica del polideportivo de propiedad del municipio y del contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en la vereda san francisco del municipio toca. Además, se realizó una visita a la vivienda del señor Juan Vargas en la vereda tocavita donde hubo un incendio, para evidenciar los daños causados y presentar una propuesta de reparación de víctimas en el despacho de la alcaldía de Siachoque.

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Wilson Eduardo Acuña	Nombre:	Yeffer Fuquen	Nombre:	Carlos Alberto Ávila



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



Nombre empresa		ALCALDIA MUNICIPAL DE SIACHOQUE			
Nombre estudiante		Carlos Alberto Avila Burgos			
Semana No.	21	Rango fecha	14-01-2019	-	18-01-2019
Total Horas Aprobadas					43

ACTIVIDADES REALIZADAS		Horas	
Actividad		R: Reportadas	A: Aprobadas
LUNES	Se hizo la elaboración del informe de los daños causados por el incendio en la vivienda del señor Juan Vargas, en la vereda tocavita para sacar un estimado de pérdidas materiales, para hacer la solicitud de reparación de víctimas.	R 8.5	A <input checked="" type="checkbox"/>
MARTES	elaboración del presupuesto del costo de conexión de un punto de acueducto y alcantarillado para nuevos usuarios.	R 8.5	A <input checked="" type="checkbox"/>
MIERCOLES	se realizó una visita a la vereda cormechoque abajo donde hay deslizamiento de material granular de la estructura de la vía en el sitio. Se encontró que en la zona afectada hay una alcantarilla que carece de la aleta de la estructura por donde escurre el agua de la carretera y en la cual se genera socavación.	R 8.5	A <input checked="" type="checkbox"/>
JUEVES	Se realizó el informe de la vía afectada en la vereda cormechoque abajo.	R 8.5	A <input checked="" type="checkbox"/>
VIERNES	Se supervisó los trabajos de excavación mecánica para habilitar y dar apertura al poso de inspección situado en la calle 3 entre carreras 6 y 7, en la vía que se está arreglando, para posteriormente realizar las obras de pavimentación.	R 9	A <input checked="" type="checkbox"/>
SABADO		R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)

•	•
•	•
•	•

APORTES DEL ESTUDIANTE

Se elaboró el informe de los daños causados por el incendio en la vivienda del señor Juan Vargas en la vereda tocavita, para presentar la propuesta de reparación de víctimas en el despacho de la alcaldía de Siachoque. También se elaborará el presupuesto del costo de conexión domiciliaria al servicio de acueducto y alcantarillado, además de realizar visitas a una vía afectada e inspección de obras de un tramo de carretera en la cabecera municipal que se está remodelando.

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Wilson Eduardo Acuña Ávila	Nombre:	Yeffer Fuquen Guerrero	Nombre:	Carlos Alberto Avila Burgos
	Empresa		Universidad		Estudiante



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



Nombre empresa		ALCALDIA MUNICIPAL DE SIACHOQUE			
Nombre estudiante		Carlos Alberto Avila Burgos			
Semana No.	22	Rango fecha	21-01-2019 - 26-01-2019	Total Horas Aprobadas	43

ACTIVIDADES REALIZADAS

	Actividad	Horas	
		R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	Se recopiló información de las actas de las actividades y obras contratadas y supervisadas por la secretaria de planeación de Siachoque durante el periodo 2018 para la realización del informe de gestión 2018.	R 8.5	A
MARTES	Se trabajó en la elaboración del informe de gestión del 2018 por la secretaria de planeación y obras públicas del municipio de Siachoque.	R 8.5	A
MIÉRCOLES	se terminó el informe de gestión del 2018 de la secretaria de planeación y obras públicas del municipio.	R 8.5	A
JUEVES	Se trabajó en la elaboración de la presentación de la gestión hecha por secretaria de planeación y obras públicas durante el año 2018.	R 8.5	A
VIERNES	Se terminó la presentación de la gestión hecha por secretaria de planeación y obras públicas durante el año 2018.	R 9	A
SABADO		R	A

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)

•	•
•	•
•	•

APORTES DEL ESTUDIANTE

Se ayudó en la recopilación de información de contratos, actividades y obras realizada por la secretaria de planeación y obras públicas del municipio de Siachoque para la elaboración del informe de la gestión hecha por esta dependencia durante el año 2018.

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Wilson Eduardo Acuña Ávila	Nombre:	Yeffer Fuquen Guerrero	Nombre:	Carlos Alberto Avila Burgos
	Empresa		Universidad		Estudiante
