











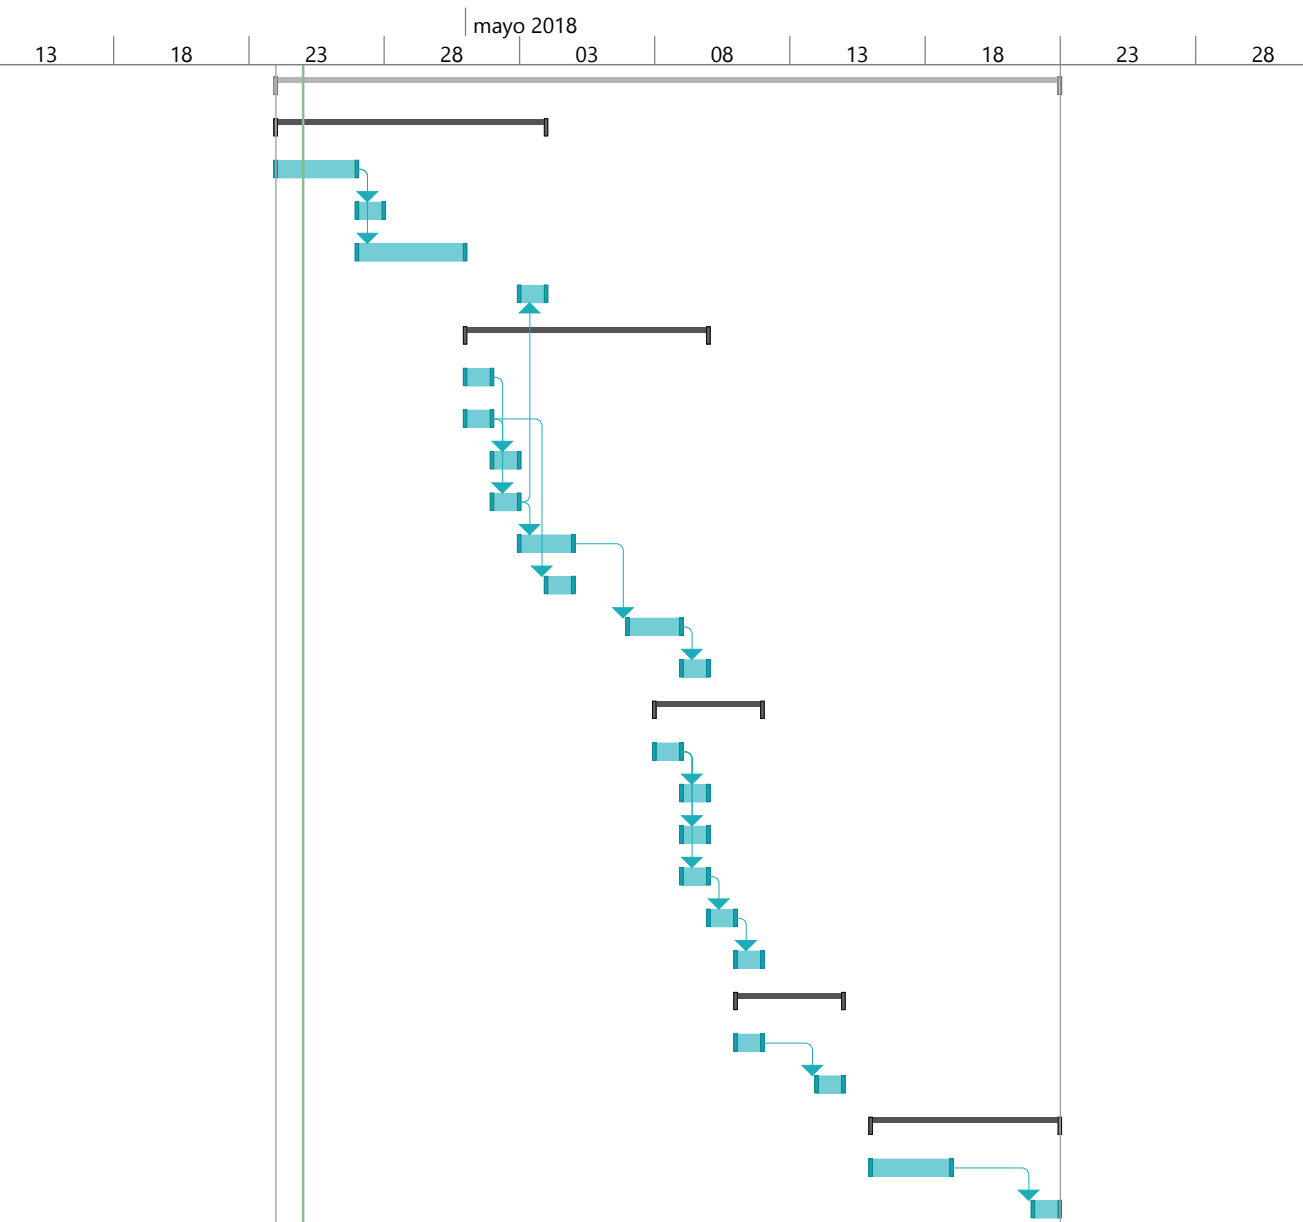








Id	Mod de tarea	Duración	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Prede
0		21 días	REPARACION MURO DE CONTENCIÓN SANTAFE DE ANTIOQUIA	mar 24/04/18	mar 22/05/18	
1		8 días	IMPERMEABILIZACIÓN PISCINA	mar 24/04/18	jue 03/05/18	
2		3 días	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y MORTERO	mar 24/04/18	jue 26/04/18	
3		1 día	RETIRO DE ESCOMBROS	vie 27/04/18	vie 27/04/18	2
4		2 días	IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA, INCLUYE EMBOQUILLADO	vie 27/04/18	lun 30/04/18	2
5		1 día	INSTALACIÓN DE ROMPEOLAS	jue 03/05/18	jue 03/05/18	10
6		7 días	IMPERMEABILIZACIÓN PLAYA	mar 01/05/18	mié 09/05/18	
7		1 día	DEMOLICIÓN DE PISO Y MORTERO	mar 01/05/18	mar 01/05/18	
8		1 día	DEMOLICIÓN DE REVOQUE	mar 01/05/18	mar 01/05/18	
9		1 día	RETIRO DE ESCOMBROS	mié 02/05/18	mié 02/05/18	8
10		1 día	INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO	mié 02/05/18	mié 02/05/18	7
11		2 días	MORTERO DE NIVELACIÓN E:5CM PARA PISO	jue 03/05/18	vie 04/05/18	10
12		1 día	REVOQUE PARA MURO IMPERMEABILIZADO	vie 04/05/18	vie 04/05/18	8
13		2 días	INSTALACIÓN DE TABLETA DE GREES MAS GRANITO	lun 07/05/18	mar 08/05/18	11
14		1 día	SOCALO EN MEDIA CAÑA IMPERMEABILIZADO	mié 09/05/18	mié 09/05/18	13
15		4 días	REPARACIONES COLUMNAS Y VIGAS	mar 08/05/18	vie 11/05/18	
16		1 día	PICADO Y SANEADO DE SUPERFICIE	mar 08/05/18	mar 08/05/18	
17		1 día	LIMPIEZA DE ACERO MANUAL INCLUYE DISOLVENTE	mié 09/05/18	mié 09/05/18	16
18		1 día	ACERO DE REFUERZO FY:60.000 PSI	mié 09/05/18	mié 09/05/18	16
19		1 día	PINTURA ANTICORROSIVA TIPO SIKATOP ARMATEC 110 EPOCEM	mié 09/05/18	mié 09/05/18	16
20		1 día	MORTERO DE REPARACIÓN TIPO SIKATOP 123 PLUS O SIMILAR	jue 10/05/18	jue 10/05/18	19
21		1 día	PINTURA PROTECTORA DE CONCRETO TIPO SIKA FERROGUAR 903	vie 11/05/18	vie 11/05/18	20
22		2 días	REPARACIONES FISURAS	vie 11/05/18	lun 14/05/18	
23		1 día	PREPARACIÓN DE FISURA	vie 11/05/18	vie 11/05/18	
24		1 día	INYECCIÓN DE RESINA TIPO SIKADUR 52 O SIMILAR, INCLUYE SELLO	lun 14/05/18	lun 14/05/18	23
25		5 días	REPARACION EFLORECENCIAS	mié 16/05/18	mar 22/05/18	
26		3 días	LAVADO DE MURO Y CIELO PLACA, INCLUYE LAVADO INICIAL EN S	mié 16/05/18	vie 18/05/18	
27		1 día	HIDROFUGO BASE SOLVENTE O BASE ALCOHOL PARA MURO	mar 22/05/18	mar 22/05/18	26



Proyecto: REPARACION MURO
Fecha: mié 25/04/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Proyecto: REPARACION MURO
 Fecha: mié 25/04/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo	
