EDIFICIO TORREON-CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
PROGRAMA GENERAL DE OBRAS
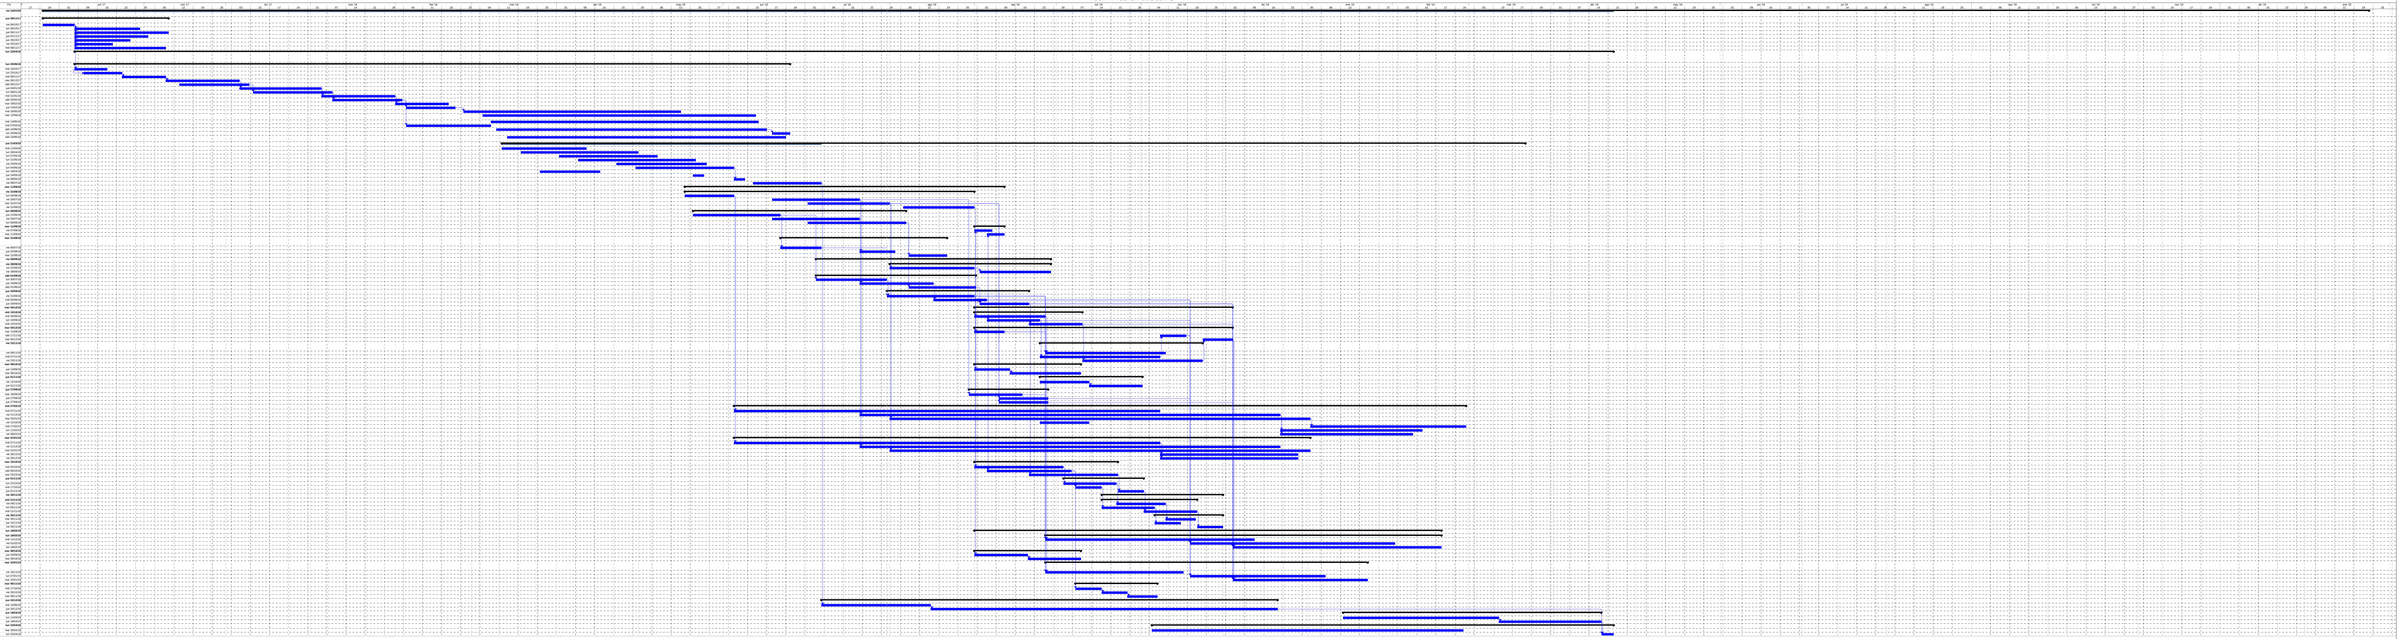
No.	Descripción de actividad	Duración(D)	Comienzo	Fin
1	**PROYECTO RUNAYACTA**	**791 días**	**lun 2/08/17**	**lun 13/08/18**
2	**PRELIMINARES**	**30 días**	**lun 2/08/17**	**jue 14/09/17**
3	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE CONSTRUCCION	10 días	lun 2/08/17	vie 18/08/17
4	CAMPAMENTO	17 días	lun 2/08/17	lun 21/08/17
5	CARACTERIZACION DE TERRENO	10 días	lun 2/08/17	vie 18/08/17
6	CERRAMIENTO PROTECCIONES VECINOS	20 días	lun 7/08/17	jue 31/08/17
7	ACOMETIDAS DE ENERGIA	10 días	lun 7/08/17	vie 18/08/17
8	ASEO	10 días	lun 7/08/17	vie 18/08/17
9	ADT	10 días	lun 7/08/17	vie 18/08/17
10	**CIMENTACION, ESTRUCTURA Y ACABADOS**	**639 días**	**lun 7/08/17**	**lun 13/08/18**
11	**CIMENTACION**	**192 días**	**lun 7/08/17**	**lun 15/04/18**
12	PRELIMINARES	10 días	lun 7/08/17	vie 18/08/17
13	PILOTES (12 m)	30 días	lun 21/08/17	lun 2/10/17
14	DEMOLEDORES, ALISTADO DE TERRENO	17 días	lun 28/08/17	vie 15/09/17
15	PANTALLA EXTRAS COSTADO NORTE	10 días	lun 4/09/17	vie 15/09/17
16	PANTALLA EXTRAS COSTADO NORTE	20 días	mié 13/12/17	lun 8/01/18
17	PANTALLA EXTRAS COSTADO ORIENTAL	10 días	lun 4/09/17	vie 15/09/17
18	PANTALLA EXTRAS COSTADO ORIENTAL	20 días	lun 11/12/17	lun 8/01/18
19	PANTALLA EXTRAS COSTADO SUR	10 días	lun 4/09/17	vie 15/09/17
20	PANTALLA EXTRAS COSTADO SUR	20 días	lun 18/12/17	lun 15/01/18
21	PANTALLA EXTRAS COSTADO OCCIDENTE	10 días	lun 4/09/17	vie 15/09/17
22	PANTALLA EXTRAS COSTADO OCCIDENTE	20 días	lun 18/12/17	lun 15/01/18
23	ANCLAJES, GUIAS DE MAMPRES Y ARRIAGLAS DE COLUMNAS	70 días	lun 4/09/17	mié 13/12/17
24	COLUMNAS TIPO	70 días	lun 18/09/17	mié 13/12/17
25	ANCLAJES, GUIAS DE MAMPRES PANTALLAS	70 días	lun 18/09/17	mié 13/12/17
26	ARMADO Y FUNDIR PLACA FONDO	70 días	lun 18/09/17	mié 13/12/17
27	INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS	7 días	lun 18/09/17	lun 25/09/17
28	ARMADO Y FUNDIR PLACA TIPO PLACA ALDEMAIA	10 días	lun 18/12/17	vie 29/12/17
29	**ESTRUCTURA**	**94.25 días**	**lun 1/10/18**	**jue 15/04/18**
30	COLUMNAS SOTANO 2 TIPO 1	20 días	lun 1/10/18	mié 11/04/18
31	COLUMNAS SOTANO 2 TIPO 2 AND Y PISO 1	10 días	lun 1/10/18	vie 12/10/18
32	COLUMNAS Y MURO PISO 2	10.25 días	lun 1/10/18	lun 15/10/18
33	ARMAR Y FUNDIR PLACA PISO 1	15 días	lun 8/10/18	lun 29/10/18
34	COLUMNAS PISO 3 AL PISO 7	20 días	lun 15/10/18	mié 14/11/18
35	ARMAR Y FUNDIR PLACA PISO 2 - CUBIERTA	17.5 días	lun 15/10/18	vie 9/11/18
36	COLUMNAS PISO 8 AL PISO 12 CUBIERTA	20 días	lun 16/11/18	mié 12/12/18
37	ESCALERA PISO 1 A PISO 3	7 días	lun 12/10/18	jue 19/10/18
38	ESCALERA PISO 3 A PISO 7	7 días	lun 26/10/18	jue 1/11/18
39	ESTUDIANTIL Y PRIMER PLACA PISO 2 Y CUBIERTA	10 días	lun 17/09/18	vie 28/09/18
40	ASEO	10 días	lun 1/10/18	vie 12/10/18
41	**MAMPOSTERIA**	**90.5 días**	**lun 18/09/18**	**vie 31/01/19**
42	**MURO DE PLANTA (MAN FORMATO)**	**90.5 días**	**lun 18/09/18**	**vie 31/01/19**
43	PISO 1	10 días	lun 18/09/18	vie 28/09/18
44	PISO 2	10 días	lun 29/09/18	vie 12/10/18
45	PISO 3	10 días	lun 8/10/18	mié 24/10/18
46	PISO 4	10 días	lun 22/10/18	vie 7/11/18
47	**MURO EN BLOQUE**	**50.5 días**	**lun 5/11/18**	**vie 14/04/19**
48	PISO 5	10 días	lun 5/11/18	vie 16/11/18
49	PISO 6	10 días	lun 19/11/18	vie 30/11/18
50	PISO 7	10 días	lun 3/12/18	vie 14/12/18
51	**MURO EN DRY WALL**	**5 días**	**lun 17/12/18**	**vie 21/12/18**
52	PISO 8	5 días	lun 17/12/18	vie 21/12/18
53	PISO 9	5 días	lun 31/12/18	vie 4/01/19
54	PISO 10	5 días	lun 14/01/19	vie 18/01/19
55	**PROLONGACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS**	**50.5 días**	**lun 17/09/18**	**vie 14/04/19**
56	PISO 1	10 días	lun 17/09/18	vie 28/09/18
57	PISO 2	10 días	lun 29/09/18	vie 12/10/18
58	PISO 3	10 días	lun 8/10/18	mié 24/10/18
59	**PARÉTES**	**37 días**	**lun 26/09/18**	**vie 16/11/18**
60	PISO 1	10 días	lun 26/09/18	vie 10/10/18
61	PISO 2	10 días	lun 11/10/18	vie 25/10/18
62	PISO 3	17 días	lun 29/10/18	vie 16/11/18
63	**ALISTADO PISOS**	**37 días**	**lun 26/09/18**	**vie 16/11/18**
64	PISO 1	10 días	lun 26/09/18	vie 10/10/18
65	PISO 2	10 días	lun 11/10/18	vie 25/10/18
66	PISO 3	17 días	lun 29/10/18	vie 16/11/18
67	**APAÑADOS PISOS**	**52.5 días**	**lun 10/10/18**	**mié 19/12/18**
68	PISO 1 (ESCALERAS Y EMBELLIMENTO	10 días	lun 10/10/18	vie 24/10/18
69	PISO 2	10 días	lun 26/10/18	vie 9/11/18
70	PISO 3	10 días	lun 12/11/18	vie 23/11/18
71	PISO 4	10 días	lun 26/11/18	vie 10/12/18
72	**PISO EN PVC**	**12.5 días**	**lun 10/12/18**	**mié 19/12/18**
73	PISO 5	5 días	lun 10/12/18	vie 14/12/18
74	PISO 6	5 días	lun 17/12/18	vie 21/12/18
75	PISO 7	5 días	lun 31/12/18	vie 4/01/19
76	**CIELORASOS EN DRY WALL Y SUPERGRADO**	**17.5 días**	**lun 23/01/19**	**vie 15/02/19**
77	PISO 1	10 días	lun 23/01/19	vie 06/02/19
78	PISO 2	10 días	lun 30/01/19	vie 07/02/19
79	PISO 3	10 días	lun 13/02/19	vie 27/02/19
80	**CUBIERTA**	**10 días**	**lun 11/03/19**	**vie 22/03/19**
81	ESTRUCTURA METALICA	10 días	lun 11/03/19	vie 22/03/19
82	ENVIDO DE FACHADAS	10 días	lun 18/03/19	vie 29/03/19
83	**LAVADO DE FACHADAS**	**10 días**	**lun 25/03/19**	**vie 12/04/19**
84	ANDAMIOS	10 días	lun 25/03/19	vie 12/04/19
85	LIMPIEZA(BISELADA LABADO)	10 días	lun 25/03/19	vie 12/04/19
86	**VIDRIERIA**	**10 días**	**lun 25/03/19**	**vie 12/04/19**
87	VENTANERIA	10 días	lun 25/03/19	vie 12/04/19
88	PISO 2	10 días	lun 25/03/19	vie 12/04/19
89	PISO 3	10 días	lun 25/03/19	vie 12/04/19
90	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**110 días**	**lun 17/09/18**	**vie 15/02/19**
91	PISO 1	110 días	lun 17/09/18	vie 15/02/19
92	PISO 2	110 días	lun 29/09/18	vie 15/02/19
93	PISO 3	110 días	lun 12/10/18	vie 15/02/19
94	CUBIERTA	10 días	lun 25/03/19	vie 12/04/19
95	SUBESTACION	10 días	lun 25/03/19	vie 12/04/19
96	CUARTO ELECTRICO	10 días	lun 25/03/19	vie 12/04/19
97	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**110 días**	**lun 17/09/18**	**vie 15/02/19**
98	PISO 1	110 días	lun 29/09/18	vie 15/02/19
99	PISO 2	110 días	lun 12/10/18	vie 15/02/19
100	PISO 3	110 días	lun 26/10/18	vie 15/02/19
101	CUARTO BOMBAS	10 días	lun 18/03/19	vie 29/03/19
102	CUARTO ELECTRICO	10 días	lun 18/03/19	vie 29/03/19
103	**INSTALACION PISOS PUNTO FIJO**	**10.5 días**	**lun 11/02/19**	**mié 27/02/19**
104	PISO 1	10 días	lun 11/02/19	vie 22/02/19
105	PISO 2	10 días	lun 18/02/19	vie 01/03/19
106	PISO 3	10 días	lun 25/02/19	vie 08/03/19
107	**CARPINTERIA METALICA**	**10.5 días**	**lun 11/02/19**	**mié 27/02/19**
108	PISO 1	10 días	lun 11/02/19	vie 22/02/19
109	PISO 2	10 días	lun 18/02/19	vie 01/03/19
110	PISO 3	10 días	lun 25/02/19	vie 08/03/19
111	**CARPINTERIA MADERA (Puertas y muebles)**	**17.5 días**	**lun 17/09/18**	**mié 10/10/18**
112	PISO 1 (PUERTA PRIMERA)	17.5 días	lun 17/09/18	mié 10/10/18
113	PISO 2	10 días	lun 29/09/18	vie 12/10/18
114	PISO 3	10 días	lun 12/10/18	vie 26/10/18
115	**ESTUCO Y PINTURA (1,2 Y 3 MANO)**	**110 días**	**lun 17/09/18**	**vie 15/02/19**
116	ESTUCO EN MUROS Y CIELORASOS	110 días	lun 17/09/18	vie 15/02/19
117	PISO 1	10 días	lun 17/09/18	vie 12/10/18
118	PISO 2	10 días	lun 29/09/18	vie 12/10/18
119	PISO 3	10 días	lun 12/10/18	vie 26/10/18
120	PISO 4	10 días	lun 26/10/18	vie 09/11/18
121	PISO 5	10 días	lun 9/11/18	vie 23/11/18
122	PISO 6	10 días	lun 23/11/18	vie 07/12/18
123	**BATERIA BAÑOS (ENCHAPES, CIELORASOS, APARATOS, MESONES)**	**90.5 días**	**lun 17/09/18**	**vie 31/01/19**
124	PISO 1	10 días	lun 17/09/18	vie 28/09/18
125	PISO 2	10 días	lun 29/09/18	vie 12/10/18
126	**ESCALERA**	**10 días**	**lun 30/10/18**	**vie 09/11/18**
127	PISO 1	7 días	lun 30/10/18	jue 1/11/18
128	PISO 2	7 días	lun 12/11/18	jue 19/11/18
129	PISO 3	7 días	lun 27/11/18	jue 06/12/18
130	**ASCENSOR**	**10 días**	**lun 17/09/18**	**vie 28/09/18**
131	INSTALACION EQUIPO SOMETIDO	10 días	lun 17/09/18	vie 28/09/18
132	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA	10 días	lun 17/09/18	vie 28/09/18
133	**ENCHAPES**	**90.5 días**	**lun 17/09/18**	**vie 31/01/19**
134	ASEO	10 días	lun 17/09/18	vie 28/09/18
135	**ASEO**	**110 días**	**lun 17/09/18**	**vie 15/02/19**
136	ASEO GENERAL	10 días	lun 17/09/18	vie 28/09/18
137	ENTREGA	5 días	lun 29/01/19	vie 1/02/19
