Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		PROPUESTA DE INTERVENCION PARA REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PARQUEADERO CONJUNTO NOGAL NOVATERRA - MOSQUERA CUND	232 días	mar 9/01/24	mié 27/11/24	
2		Aprobacion de la propuesta de intervencion	0 días	mar 9/01/24	mar 9/01/24	
3		Plan de intervencion y coordinacion	5 días	mar 9/01/24	lun 15/01/24	2
4		Tramites permisos y licencias	20 días	mar 9/01/24	lun 5/02/24	3CC
5		Socializacion	3 días	mar 16/01/24	jue 18/01/24	3
6		**EJECUCION DE OBRAS**	**224 días**	**vie 19/01/24**	**mié 27/11/24**	
7		**MODULO 1**	**57 días**	**vie 19/01/24**	**lun 8/04/24**	
8		**Preliminares**	**50 días**	**vie 19/01/24**	**jue 28/03/24**	
9		Construccion cerramiento en tela verde	2 días	vie 19/01/24	lun 22/01/24	5
10		Localizacion y Replanteo	50 días	vie 19/01/24	jue 28/03/24	9CC
11		**Demoliciones**	**37 días**	**mar 6/02/24**	**mié 27/03/24**	
12		Corte y demolicion de viguetas y losa	20 días	mar 6/02/24	lun 4/03/24	10CC+2 días;4
13		Escarificacion de columnas	20 días	mar 13/02/24	lun 11/03/24	12CC+5 días
14		Perforacion vigas principales para anclaje de refuerzos	20 días	mar 20/02/24	lun 18/03/24	13CC+5 días
15		Excavacion manual en material comun 0.00 a 2.00 m	30 días	jue 15/02/24	mié 27/03/24	13CC+2 días
16		**Reforzamiento estructuras**	**35 días**	**mar 20/02/24**	**lun 8/04/24**	
17		Instalacion anclaje para mensulas	10 días	mar 20/02/24	lun 4/03/24	14CC
18		Encamisado de columnas con lamina de AC 3/8"	35 días	mar 20/02/24	lun 8/04/24	13CC+5 días
19		Armado de canastas de refuerzo recalce vigas	30 días	mar 27/02/24	lun 8/04/24	18CC+5 días
20		Armado de canastas de refuerzo viguetas y losa	7 días	mar 5/03/24	mié 13/03/24	12
21		Encofrado vigas para recalse	10 días	mar 5/03/24	lun 18/03/24	19CC+5 días
22		Encofrado de viguetas y losa	5 días	mar 5/03/24	lun 11/03/24	12;20CC
23		Vaciado de concreto autonivelante para columnas	6 días	mar 5/03/24	mar 12/03/24	18CC+10 días
24		Vaciado de concreto autonivelante para recalce vigas	6 días	mar 12/03/24	mar 19/03/24	19CC+10 días
25		Vaciado viguetas y losa	1 día	mar 12/03/24	mar 12/03/24	22
26		Desencofrado	2 días	mié 27/03/24	jue 28/03/24	25FC+10 días
27		Aseo final modulo	2 días	vie 29/03/24	lun 1/04/24	26
28		**MODULO 2**	**51 días**	**vie 29/03/24**	**vie 7/06/24**	
29		**Preliminares**	**40 días**	**vie 29/03/24**	**jue 23/05/24**	
30		Construccion cerramiento en tella verde	2 días	vie 29/03/24	lun 1/04/24	26
31		Localizacion y Replanteo	40 días	vie 29/03/24	jue 23/05/24	30CC
32		**Demoliciones**	**37 días**	**lun 1/04/24**	**mar 21/05/24**	
33		Corte y demolicion de viguetas y losa	20 días	lun 1/04/24	vie 26/04/24	31CC+1 día
34		Escarificacion de columnas	20 días	lun 8/04/24	vie 3/05/24	33CC+5 días
35		Perforacion vigas principales para anclaje de refuerzos	20 días	lun 15/04/24	vie 10/05/24	34CC+5 días
36		Excavacion manual en material comun 0.00 a 2.00 m	30 días	mié 10/04/24	mar 21/05/24	34CC+2 días
37		**Reforzamiento estructuras**	**40 días**	**lun 15/04/24**	**vie 7/06/24**	
38		Instalacion anclaje para mensulas	10 días	lun 15/04/24	vie 26/04/24	35CC
39		Encamisado de columnas con lamina de AC 3/8"	35 días	lun 15/04/24	vie 31/05/24	34CC+5 días
40		Armado de canastas de refuerzo recalce vigas	35 días	lun 22/04/24	vie 7/06/24	39CC+5 días
41		Armado de canastas de refuerzo viguetas y losa	7 días	lun 29/04/24	mar 7/05/24	33
42		Encofrado vigas para recalse	10 días	lun 29/04/24	vie 10/05/24	40CC+5 días
43		Encofrado de viguetas y losa	5 días	lun 29/04/24	vie 3/05/24	33;41CC
44		Vaciado de concreto autonivelante para columnas	6 días	lun 29/04/24	lun 6/05/24	39CC+10 días
45		Vaciado de concreto autonivelante para recalce vigas	6 días	lun 13/05/24	lun 20/05/24	42CC+10 días
46		Vaciado viguetas y losa	1 día	lun 6/05/24	lun 6/05/24	43
47		Desencofrado	2 días	mar 21/05/24	mié 22/05/24	46FC+10 días
48		Aseo final modulo	2 días	jue 23/05/24	vie 24/05/24	47
49		**MODULO 3**	**51 días**	**lun 27/05/24**	**lun 5/08/24**	
50		**Preliminares**	**39 días**	**lun 27/05/24**	**jue 18/07/24**	
51		Construccion cerramiento en tella verde	2 días	lun 27/05/24	mar 28/05/24	48
52		Localizacion y Replanteo	39 días	lun 27/05/24	jue 18/07/24	51CC
53		**Demoliciones**	**37 días**	**mar 28/05/24**	**mié 17/07/24**	
54		Corte y demolicion de viguetas y losa	20 días	mar 28/05/24	lun 24/06/24	52CC+1 día
55		Escarificacion de columnas	20 días	mar 4/06/24	lun 1/07/24	54CC+5 días
56		Perforacion vigas principales para anclaje de refuerzos	20 días	mar 11/06/24	lun 8/07/24	55CC+5 días
57		Excavacion manual en material comun 0.00 a 2.00 m	30 días	jue 6/06/24	mié 17/07/24	55CC+2 días
58		**Reforzamiento estructuras**	**40 días**	**mar 11/06/24**	**lun 5/08/24**	
59		Instalacion anclaje para mensulas	10 días	mar 11/06/24	lun 24/06/24	56CC
60		Encamisado de columnas con lamina de AC 3/8"	35 días	mar 11/06/24	lun 29/07/24	55CC+5 días
61		Armado de canastas de refuerzo recalce vigas	35 días	mar 18/06/24	lun 5/08/24	60CC+5 días

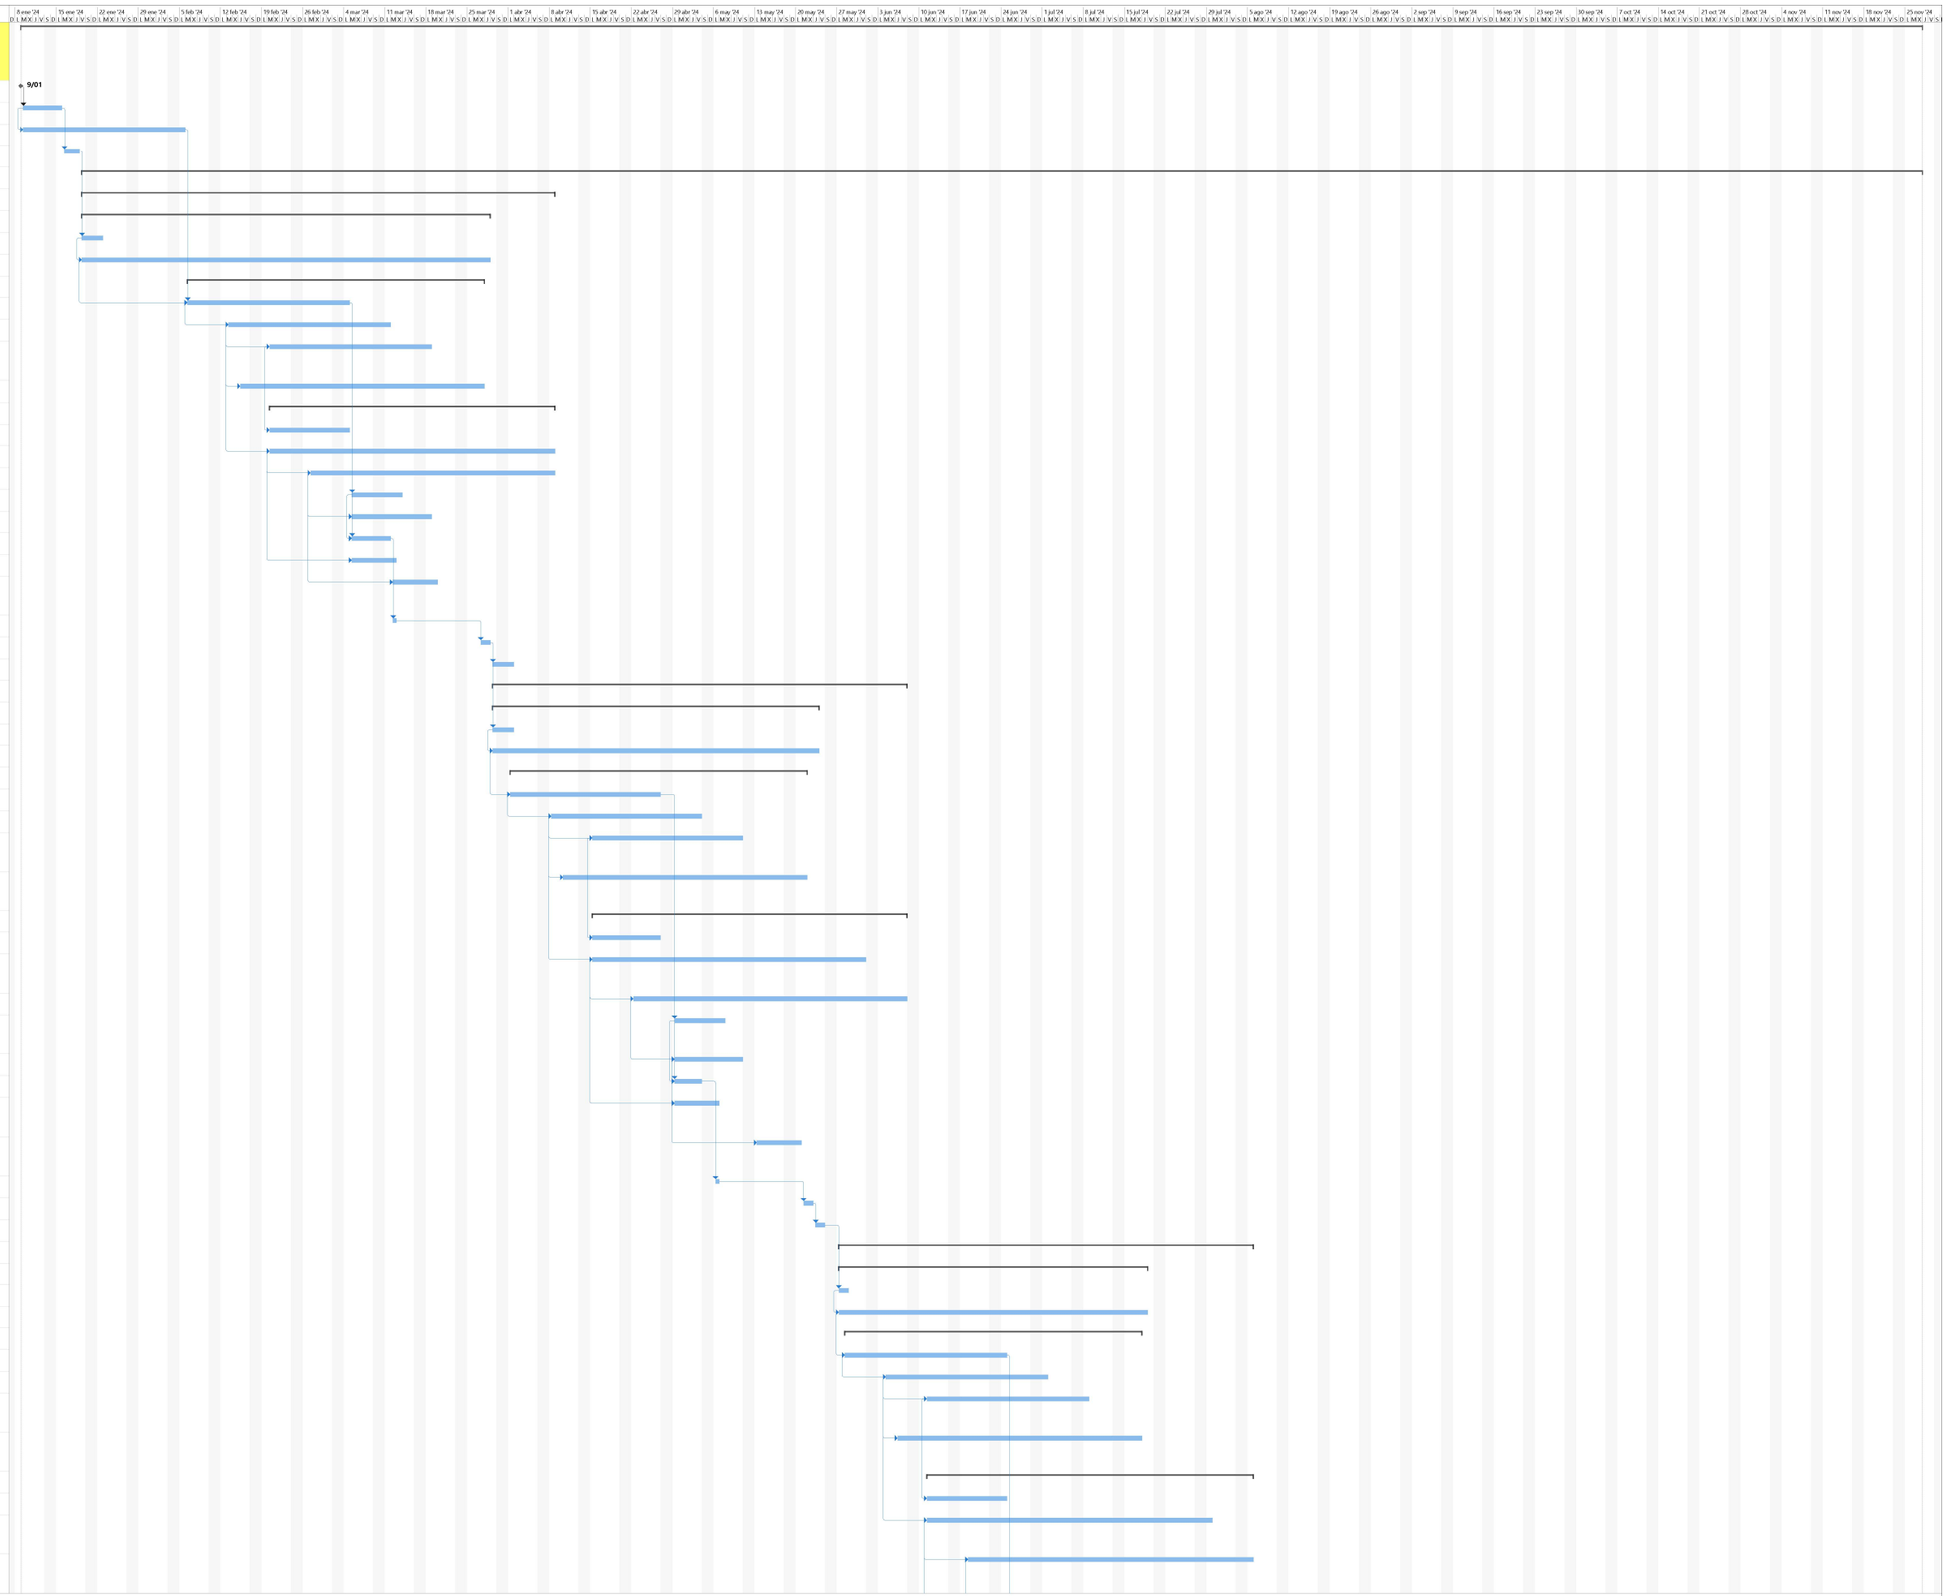

Proyecto: CRONOGRAMA PARA
Fecha: mar 12/12/23

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · sólo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · sólo duración · Resumen manual · sólo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
62		Armado de canastas de refuerzo viguetas y losa	7 días	mar 25/06/24	mié 3/07/24	54
63		Encofrado vigas para recalse	10 días	mar 25/06/24	lun 8/07/24	61CC+5 días
64		Encofrado de viguetas y losa	5 días	mar 25/06/24	lun 1/07/24	54;62CC
65		Vaciado de concreto autonivelante para columnas	6 días	mar 25/06/24	mar 2/07/24	60CC+10 días
66		Vaciado de concreto autonivelante para recalce vigas	6 días	mar 2/07/24	mar 9/07/24	61CC+10 días
67		Vaciado viguetas y losa	1 día	mar 2/07/24	mar 2/07/24	64
68		Desencofrado	2 días	mié 17/07/24	jue 18/07/24	67FC+10 días
69		Aseo final modulo	2 días	vie 19/07/24	lun 22/07/24	68
70		**MODULO 4**	**51 días**	**mar 23/07/24**	**mar 1/10/24**	
71		**Preliminares**	**39 días**	**mar 23/07/24**	**vie 13/09/24**	
72		Construccion cerramiento en tella verde	2 días	mar 23/07/24	mié 24/07/24	60
73		Localizacion y Replanteo	39 días	mar 23/07/24	vie 13/09/24	72CC
74		**Demoliciones**	**37 días**	**mié 24/07/24**	**jue 12/09/24**	
75		Corte y demolicion de viguetas y losa	20 días	mié 24/07/24	mar 20/08/24	73CC+1 día
76		Escarificacion de columnas	20 días	mié 31/07/24	mar 27/08/24	75CC+5 días
77		Perforacion vigas principales para anclaje de refuerzos	20 días	mié 7/08/24	mar 3/09/24	76CC+5 días
78		Excavacion manual en material comun 0.00 a 2.00 m	30 días	vie 2/08/24	jue 12/09/24	76CC+2 días
79		**Reforzamiento estructuras**	**40 días**	**mié 7/08/24**	**mar 1/10/24**	
80		Instalacion anclaje para mensulas	10 días	mié 7/08/24	mar 20/08/24	77CC
81		Encamisado de columnas con lamina de AC 3/8"	35 días	mié 7/08/24	mar 24/09/24	76CC+5 días
82		Armado de canastas de refuerzo recalce vigas	35 días	mié 14/08/24	mar 1/10/24	81CC+5 días
83		Armado de canastas de refuerzo viguetas y losa	7 días	mié 21/08/24	jue 29/08/24	75
84		Encofrado vigas para recalse	10 días	mié 21/08/24	mar 3/09/24	82CC+5 días
85		Encofrado de viguetas y losa	5 días	mié 21/08/24	mar 27/08/24	75;83CC
86		Vaciado de concreto autonivelante para columnas	6 días	mié 21/08/24	mié 28/08/24	81CC+10 días
87		Vaciado de concreto autonivelante para recalce vigas	6 días	mié 28/08/24	mié 4/09/24	82CC+10 días
88		Vaciado viguetas y losa	1 día	mié 28/08/24	mié 28/08/24	85
89		Desencofrado	2 días	jue 12/09/24	vie 13/09/24	88FC+10 días
90		Aseo final modulo	2 días	lun 16/09/24	mar 17/09/24	89
91		**MODULO 5**	**51 días**	**mié 18/09/24**	**mié 27/11/24**	
92		**Preliminares**	**35 días**	**mié 18/09/24**	**mar 5/11/24**	
93		Construccion cerramiento en tella verde	2 días	mié 18/09/24	jue 19/09/24	90
94		Localizacion y Replanteo	35 días	mié 18/09/24	mar 5/11/24	93CC
95		**Demoliciones**	**37 días**	**jue 19/09/24**	**vie 8/11/24**	
96		Corte y demolicion de viguetas y losa	20 días	jue 19/09/24	mié 16/10/24	94CC+1 día
97		Escarificacion de columnas	20 días	jue 26/09/24	mié 23/10/24	96CC+5 días
98		Perforacion vigas principales para anclaje de refuerzos	20 días	jue 3/10/24	mié 30/10/24	97CC+5 días
99		Excavacion manual en material comun 0.00 a 2.00 m	30 días	lun 30/09/24	vie 8/11/24	97CC+2 días
100		**Reforzamiento estructuras**	**40 días**	**jue 3/10/24**	**mié 27/11/24**	
101		Instalacion anclaje para mensulas	10 días	jue 3/10/24	mié 16/10/24	98CC
102		Encamisado de columnas con lamina de AC 3/8"	35 días	jue 3/10/24	mié 20/11/24	97CC+5 días
103		Armado de canastas de refuerzo recalce vigas	35 días	jue 10/10/24	mié 27/11/24	98CC+5 días
104		Armado de canastas de refuerzo viguetas y losa	7 días	jue 17/10/24	vie 25/10/24	96
105		Encofrado vigas para recalse	10 días	jue 17/10/24	mié 30/10/24	103CC+5 días
106		Encofrado de viguetas y losa	5 días	jue 17/10/24	mié 23/10/24	96;104CC
107		Vaciado de concreto autonivelante para columnas	6 días	jue 17/10/24	jue 24/10/24	102CC+10 días
108		Vaciado de concreto autonivelante para recalce vigas	6 días	jue 24/10/24	jue 31/10/24	103CC+10 días
109		Vaciado viguetas y losa	1 día	jue 24/10/24	jue 24/10/24	106
110		Desencofrado	2 días	vie 8/11/24	lun 11/11/24	109FC+10 días
111		Aseo final modulo	2 días	mar 12/11/24	mié 13/11/24	110
112		Fin intervencion estructura de parqueadero	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24	111

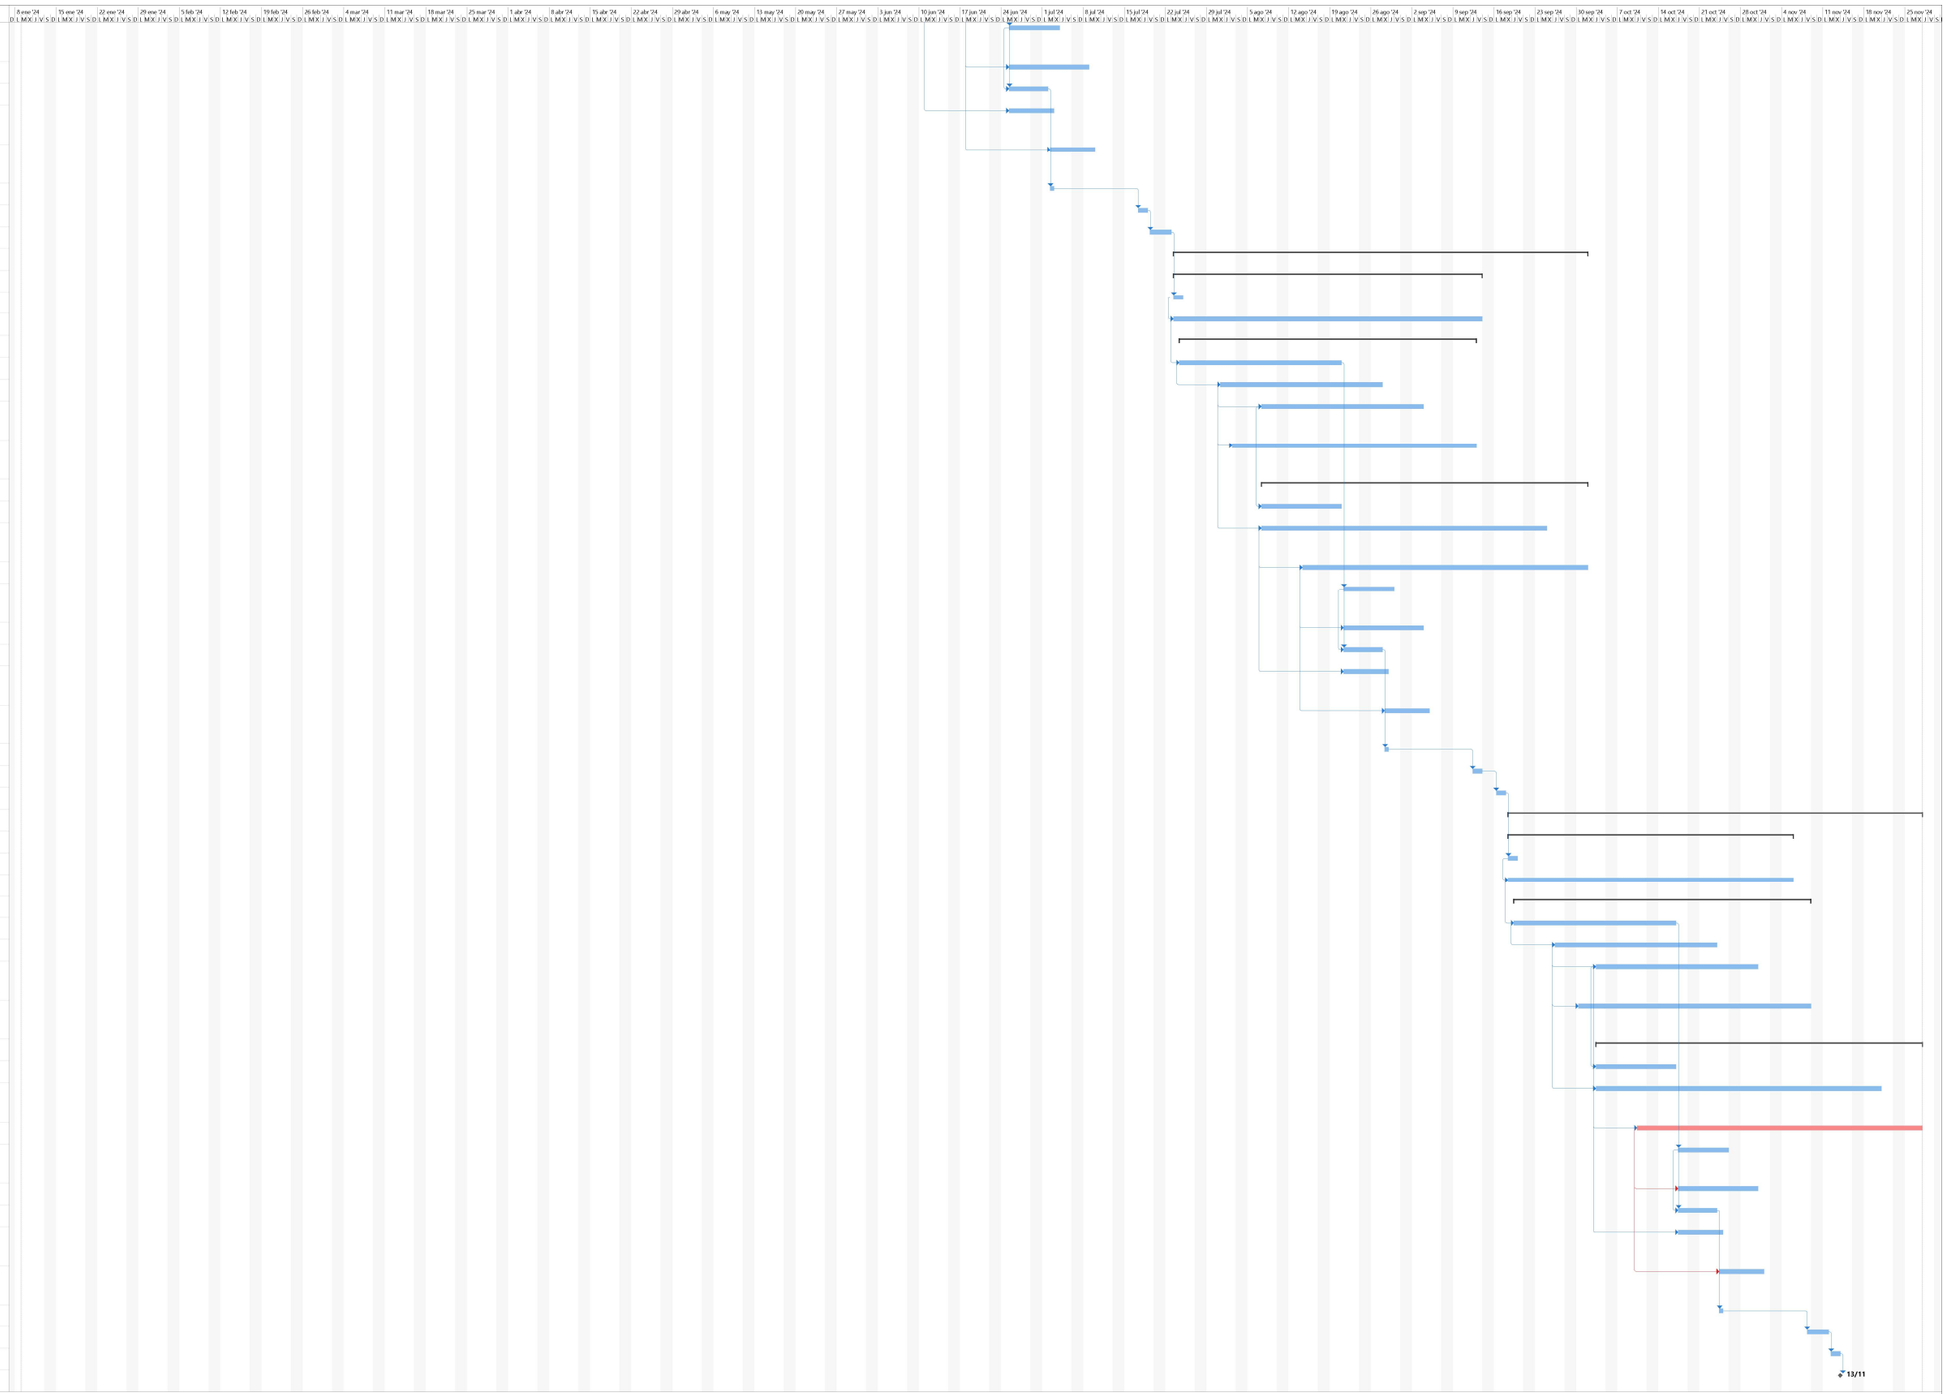

Proyecto: CRONOGRAMA PARA
Fecha: mar 12/12/23

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso
