

	<b>VERSIÓN:</b> 0
	<b>CÓDIGO:</b> FOR-PS-015
	<b>PÁGINA:</b> 1 DE 1
<b>ACTA DE REUNION</b>	

INELTEL S.A.S

<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	
<b>Comité o Grupo:</b> <b>GERENCIA PROYECTO CAMPUS</b>	<i>Acta No 03</i>
<b>Citada por:</b> Gerente de Proyecto Campus	<b>Fecha:</b> 26/10/2016
<b>Coordinador:</b> José Omar Solano	<b>Hora inicio:</b> 08:00AM <b>Fin:</b> 09:00 AM
<b>Secretario:</b> Marco Fernando Triana	<b>Lugar:</b> INELTEL BOGOTA

<b>PARTICIPANTES</b>			
<b>No.</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Teléfono</b>
1	Jose Omar Solano	Gerente de Proyecto	3105689535
2	Marco Fernando Triana	Ing. Implementación	3227614729
3	Jhonn Ortiz	Ing. Telefonía	3002658974
4	William Cristancho	Ing. Comercial	3145896636
5	Claudia Morales	Abogada	3501472596
6	Sandra Hernández	Contador	3169874562
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

<b>PUNTOS DE DISCUSION</b>
----------------------------

	<b>VERSIÓN: 0</b>
	<b>CÓDIGO: FOR-PS-015</b>
	<b>PÁGINA: 1 DE 1</b>
<b>ACTA DE REUNION</b>	

**INELTEL S.A.S**

<b>1</b>	Presentación de las generalidades del proyecto.
<b>2</b>	Entrega formal de cronograma y actividades
<b>3</b>	Delegación de actividades conforme el cronograma
<b>4</b>	
<b>5</b>	
<b>6</b>	

<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>
<p>Abre la reunión el Gerente de Proyecto José Omar Solano dándole la bienvenida a todos y cada uno de los interesados y colaboradores del proyecto. Plantea el objetivo de la reunión el cual es comentar e informar sobre un proyecto de infraestructura tecnológica para la Universidad Central de Colombia. El gerente del proyecto comenta a grandes rasgos los requerimientos de la Universidad Central y hace entrega formal del cronograma de ejecución del proyecto con cada una de las fases y subfases y sus respectivas actividades a realizar.</p>
<b>ANALISIS DE DESEMPEÑO DE COSTOS Y AGENDA</b>




VERSIÓN: 0

CÓDIGO: FOR-PS-015

PÁGINA: 1 DE 1

**ACTA DE REUNION**

**INELTEL S.A.S**

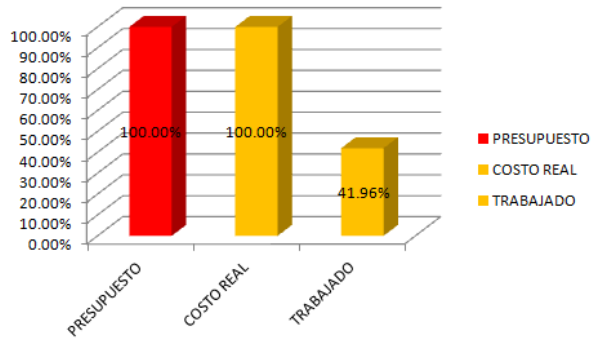

DESEMPEÑO DEL COSTO		
IDC	0.4	ALARMA
Variación del costo	-19,635.00	

DESEMPEÑO DE AGENDA		
IDA	0.41961853	OK
Variación de Agenda	-18,105.00	



**VERSIÓN: 0**

**CÓDIGO: FOR-PS-015**

**PÁGINA: 1 DE 1**

## **ACTA DE REUNION**

**INELTEL S.A.S**

### **OBSERVACIONES:**

En el mes 3, se activó el riesgo R002, el cual contempla que alguno de los trabajadores tuviera una incapacidad de tiempo prolongado. En vista de este evento se debió realizar un control de cambios y buscar una persona de reemplazo, que se logró conseguir en una semana. En consecuencia, el cronograma se alteró una semana, pero el presupuesto se siguió ejecutando conforme se venía planteando.
