



Id		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesoras	17	22	27	octubre 2026	2	7
0			0	Plan de proyecto para el diseño de la PMO en 4G Architecture	159 días	\$37,226.00	jue 1/10/26	vie 28/05/27							
1			1	Inicio del proyecto	8 días	\$1,458.00	jue 1/10/26	mar 13/10/26							
2			1.1	Elaborar el acta de constitución	5 días	\$690.00	jue 1/10/26	mié 7/10/26							
3			1.2	Identificar a los interesados clave	3 días	\$768.00	jue 8/10/26	mar 13/10/26	2						
4			2	Diagnóstico organizacional (línea Cladding)	29 días	\$8,496.00	mié 14/10/26	mié 25/11/26							
5			2.1	Recolectar información	7 días	\$2,156.00	mié 14/10/26	jue 22/10/26	3						
6			2.2	Analizar prácticas actuales de gestión de	10 días	\$2,720.00	vie 23/10/26	vie 6/11/26	5						
7			2.3	Evaluar el nivel de madurez organizacional (OPM3	5 días	\$1,300.00	lun 9/11/26	vie 13/11/26	6						
8			2.4	Elaborar informe diagnóstico	4 días	\$1,312.00	mar 17/11/26	vie 20/11/26	7						
9			2.5	Presentar y validar diagnóstico	3 días	\$1,008.00	lun 23/11/26	mié 25/11/26	8						
10			3	Gestión del Alcance	8 días	\$1,972.00	jue 26/11/26	lun 7/12/26							
11			3.1	Plan de Gestión del Alcan	2 días	\$520.00	jue 26/11/26	vie 27/11/26	9						
12			3.2	Matriz de Requisitos documentada	2 días	\$504.00	lun 30/11/26	mar 1/12/26	11						


Proyecto: Plan de proyecto par
Fecha: vie 4/09/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesoras	17	22	27	octubre 2026	2	7
13			3.3	Documento de Alcance detallado	2 días	\$576.00	mié 2/12/26	jue 3/12/26	12						
14			3.4	EDT aprobada	1 día	\$140.00	vie 4/12/26	vie 4/12/26	13						
15			3.5	Diccionario de la EDT	1 día	\$232.00	lun 7/12/26	lun 7/12/26	14						
16			4	Gestión del Cronograma	7 días	\$1,708.00	mié 9/12/26	jue 17/12/26							
17			4.1	Plan de Gestión del Cronograma	2 días	\$520.00	mié 9/12/26	jue 10/12/26	15						
18			4.2	Lista de actividades derivadas de la EDT	1 día	\$140.00	vie 11/12/26	vie 11/12/26	17						
19			4.3	Secuenciación y red lógica	1 día	\$140.00	lun 14/12/26	lun 14/12/26	18						
20			4.4	Estimación de duraciones	1 día	\$268.00	mar 15/12/26	mar 15/12/26	19						
21			4.5	Cronograma aprobado (línea base)	2 días	\$640.00	mié 16/12/26	jue 17/12/26	20						
22			5	Gestión de los Costos	6 días	\$1,416.00	vie 18/12/26	lun 28/12/26							
23			5.1	Plan de Gestión de Costos	2 días	\$520.00	vie 18/12/26	lun 21/12/26	21						
24			5.2	Estimación de costos	2 días	\$616.00	mar 22/12/26	mié 23/12/26	23						
25			5.3	Presupuesto del proyecto	1 día	\$168.00	jue 24/12/26	jue 24/12/26							
26			5.3.1	Project Estimate	1 día	\$56.00	jue 24/12/26	jue 24/12/26	24						
27			5.3.2	Reserva de Contingencia	1 día	\$56.00	jue 24/12/26	jue 24/12/26	24						
28			5.3.3	Reserva de Gestión	1 día	\$56.00	jue 24/12/26	jue 24/12/26	24						
29			5.4	Línea base de costos aprobada	1 día	\$112.00	lun 28/12/26	lun 28/12/26	28;26;27						
30			6	Gestión de la Calidad	4 días	\$964.00	mar 29/12/26	lun 4/01/27							
31			6.1	Plan de Gestión de Calidad	2 días	\$520.00	mar 29/12/26	mié 30/12/26	29						

Proyecto: Plan de proyecto par Fecha: vie 4/09/26	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			


Id		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesoras	octubre 2026				
										17	22	27	2	7
32			6.2	Criterios de aceptación de entregables	1 día	\$212.00	jue 31/12/26	jue 31/12/26	31					
33			6.3	Procedimiento de revisión y control	1 día	\$232.00	lun 4/01/27	lun 4/01/27	32					
34			7	Gestión de los Recursos	4 días	\$884.00	mar 5/01/27	vie 8/01/27						
35			7.1	Plan de Gestión de Recursos	2 días	\$520.00	mar 5/01/27	mié 6/01/27	33					
36			7.2	Estructura de roles y responsabilidades (RACI)	1 día	\$252.00	jue 7/01/27	jue 7/01/27	35					
37			7.3	Asignación de recursos	1 día	\$112.00	vie 8/01/27	vie 8/01/27	36					
38			8	Gestión de las Comunicaciones	4 días	\$872.00	mar 12/01/27	vie 15/01/27						
39			8.1	Plan de Gestión de Comunicaciones	2 días	\$520.00	mar 12/01/27	mié 13/01/27	37					
40			8.2	Matriz de comunicaciones	1 día	\$140.00	jue 14/01/27	jue 14/01/27	39					
41			8.3	Reportes de avance definidos	1 día	\$212.00	vie 15/01/27	vie 15/01/27	40					
42			9	Gestión de los Riesgos	6 días	\$1,448.00	lun 18/01/27	lun 25/01/27						
43			9.1	Plan de Gestión de Riesgos	2 días	\$520.00	lun 18/01/27	mar 19/01/27	41					
44			9.2	Registro de riesgos identificado	1 día	\$260.00	mié 20/01/27	mié 20/01/27	43					
45			9.3	Análisis cualitativo de riesgos	1 día	\$288.00	jue 21/01/27	jue 21/01/27	44					
46			9.4	Estrategias de respuesta	1 día	\$240.00	vie 22/01/27	vie 22/01/27	45					
47			9.5	Reserva de contingencia justificada	1 día	\$140.00	lun 25/01/27	lun 25/01/27	46					


Proyecto: Plan de proyecto par Fecha: vie 4/09/26	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesoras	17	22	27	octubre 2026	2	7
48			10	Gestión de las Adquisiciones	2 días	\$212.00	mar 26/01/27	mié 27/01/27							
49			10.1	Plan de adquisiciones	1 día	\$112.00	mar 26/01/27	mar 26/01/27	47						
50			10.2	Identificación de recursos externos	1 día	\$100.00	mié 27/01/27	mié 27/01/27	49						
51			11	Gestión de los Interesados	3 días	\$632.00	jue 28/01/27	lun 1/02/27							
52			11.1	Plan de Gestión de Interesados	2 días	\$520.00	jue 28/01/27	vie 29/01/27	50						
53			11.2	Estrategias de involucramiento	1 día	\$112.00	lun 1/02/27	lun 1/02/27	52						
54			12	Diseño conceptual de la PMO	23 días	\$6,396.00	mar 2/02/27	lun 8/03/27							
55			12.1	Definir el tipo y enfoque de PMO	4 días	\$1,024.00	mar 2/02/27	vie 5/02/27	53						
56			12.2	Diseñar el modelo PMO objetivo	7 días	\$2,016.00	mié 10/02/27	jue 18/02/27	55						
57			12.3	Definir roles y responsabilidades	5 días	\$1,740.00	vie 19/02/27	jue 25/02/27	56						
58			12.4	Definir mecanismos de gobierno	4 días	\$992.00	vie 26/02/27	mié 3/03/27	57						
59			12.5	Validar ejecutivamente el modelo PMO	3 días	\$624.00	jue 4/03/27	lun 8/03/27	58						
60			13	Definición del catálogo de servicios PMO	16 días	\$6,464.00	mar 9/03/27	vie 2/04/27							
61			13.1	Identificar servicios prioritarios	5 días	\$2,020.00	mar 9/03/27	lun 15/03/27	59						


Proyecto: Plan de proyecto par Fecha: vie 4/09/26	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesoras	octubre 2026				
										17	22	27	2	7
62			13.2	Priorización por nivel de madurez	4 días	\$1,616.00	mar 16/03/27	vie 19/03/27	61					
63			13.3	Definir indicadores de desempeño (KPIs)	4 días	\$1,616.00	mar 23/03/27	mar 30/03/27	62					
64			13.4	Validar el catálogo de servicios	3 días	\$1,212.00	mié 31/03/27	vie 2/04/27	63					
65			14	Roadmap de implementación futura	32 días	\$3,324.00	lun 5/04/27	mié 19/05/27						
66			14.1	Definir las fases de implementación	5 días	\$1,440.00	lun 5/04/27	vie 9/04/27	64					
67			14.2	Cronogramar la macro implementación	24 días	\$1,152.00	lun 12/04/27	vie 14/05/27	66					
68			14.3	Consolidar el documento roadmap	3 días	\$732.00	lun 17/05/27	mié 19/05/27	67					
69			15	Cierre del Proyecto de Formulación	7 días	\$980.00	jue 20/05/27	vie 28/05/27						
70			15.1	Preparar la presentación ejecutiva	4 días	\$560.00	jue 20/05/27	mar 25/05/27	68					
71			15.2	Presentar a la junta directiva	1 día	\$140.00	mié 26/05/27	mié 26/05/27	70					
72			15.3	Elaborar el acta de cierre del proyecto de formulación	2 días	\$280.00	jue 27/05/27	vie 28/05/27	71					


Proyecto: Plan de proyecto par Fecha: vie 4/09/26	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

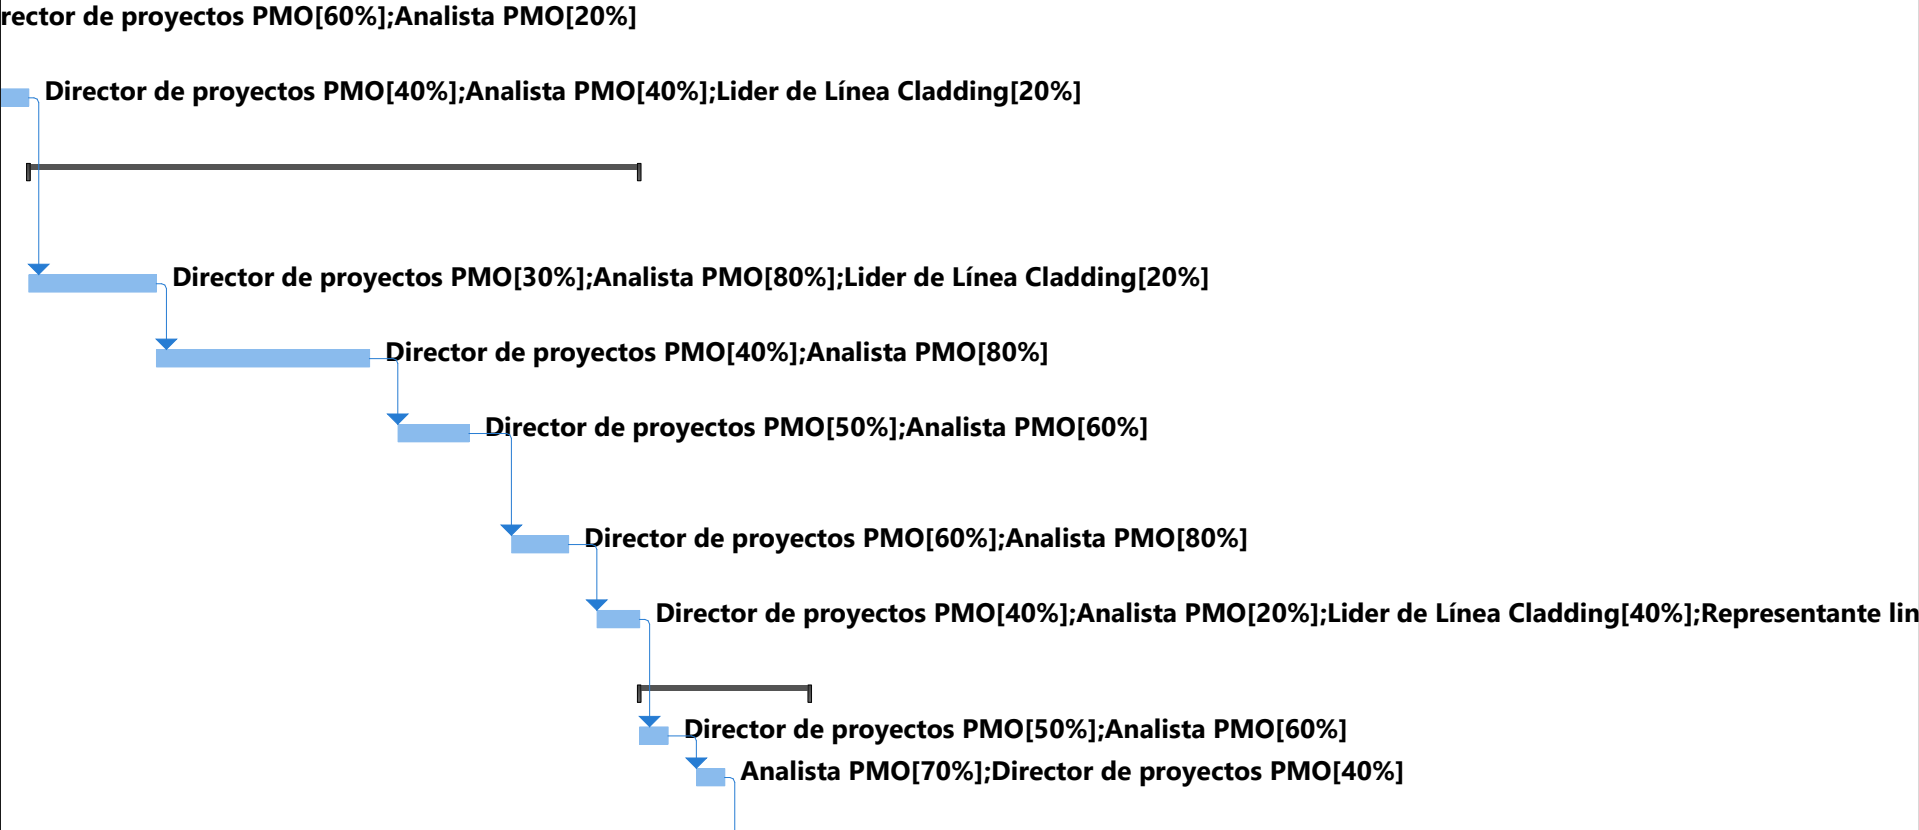


Proyecto: Plan de proyecto par Fecha: vie 4/09/26	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

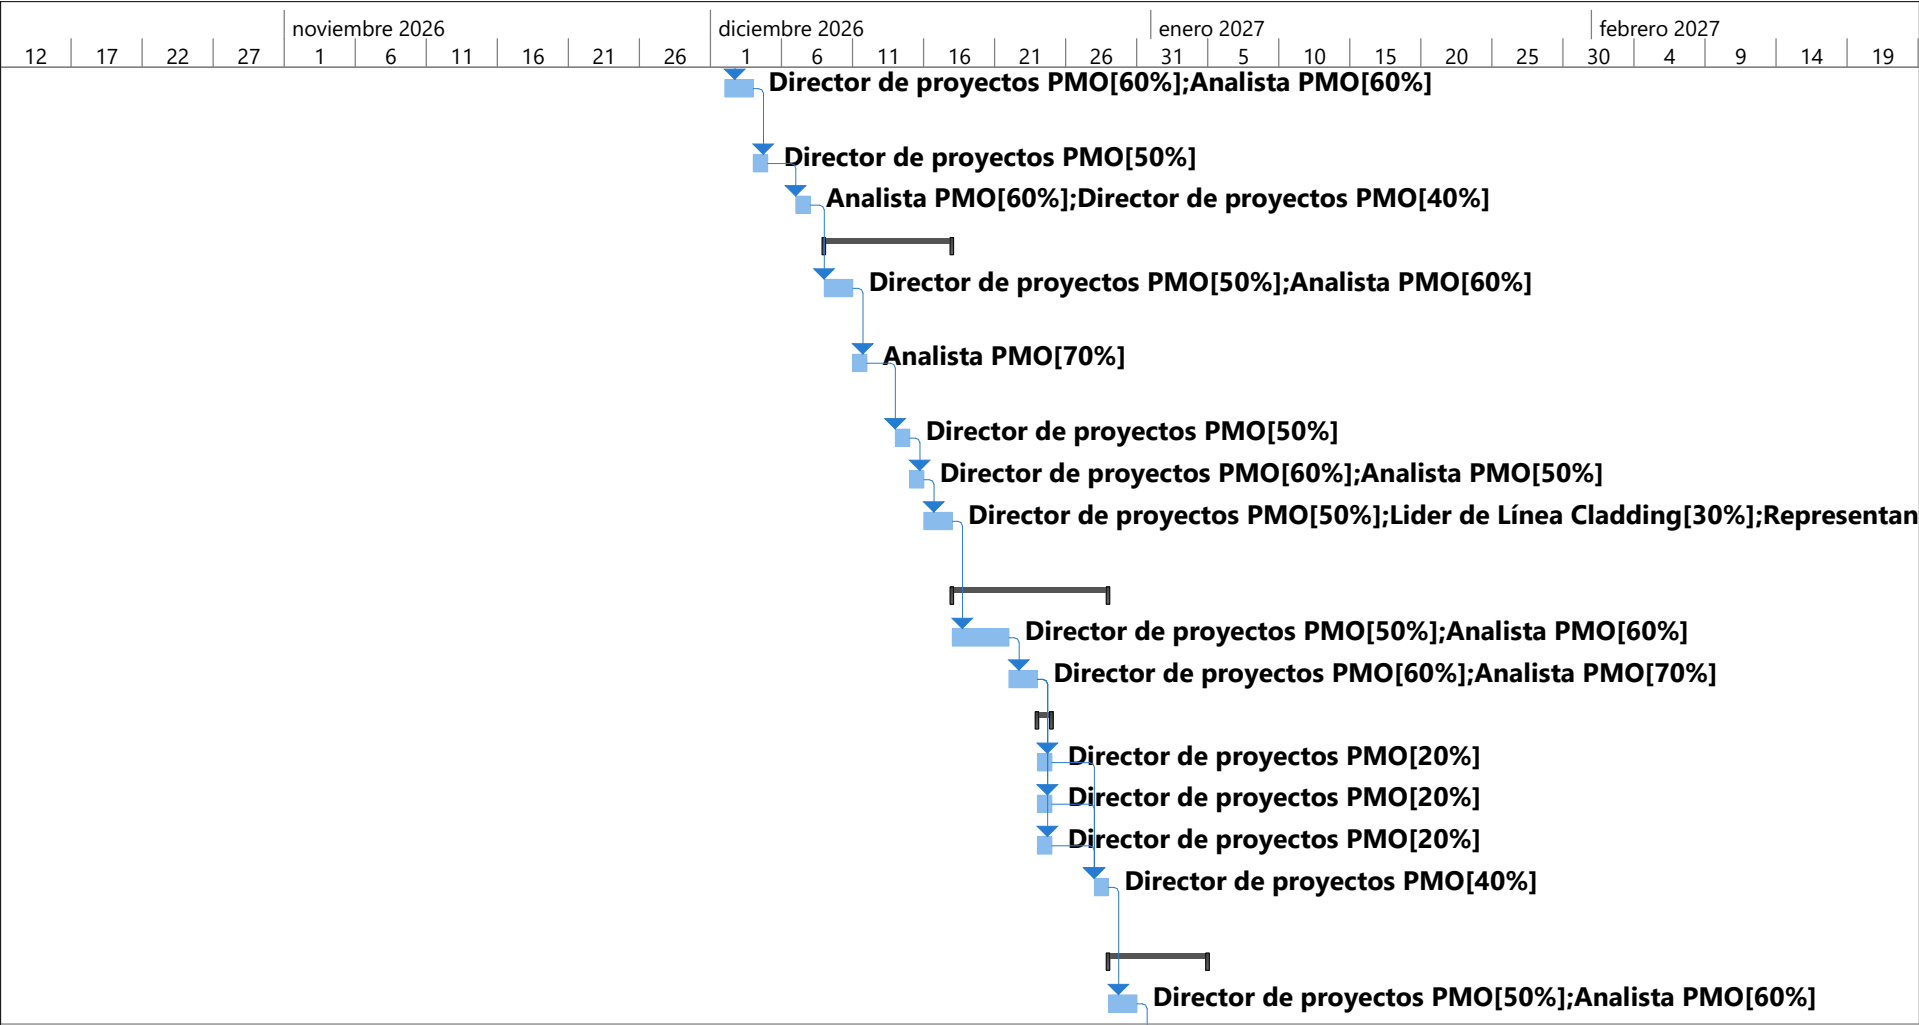


Proyecto: Plan de proyecto par Fecha: vie 4/09/26	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

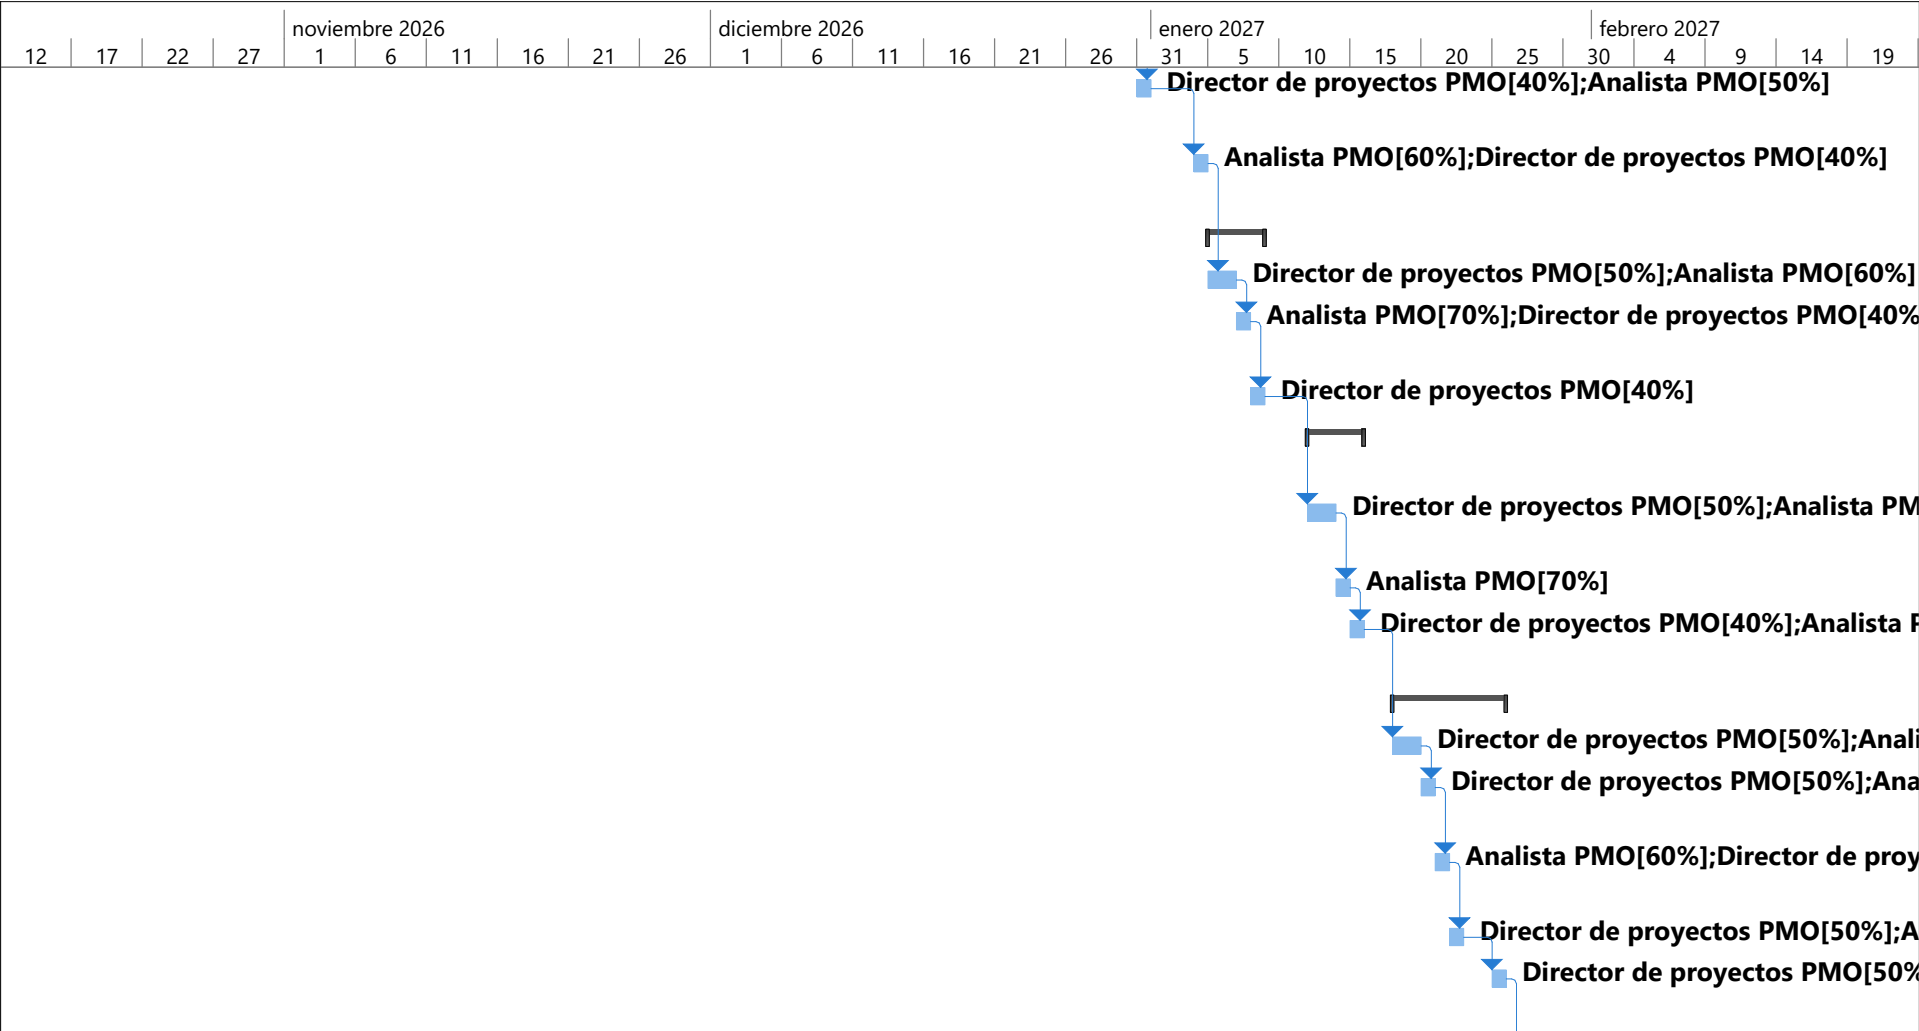

Proyecto: Plan de proyecto par Fecha: vie 4/09/26	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

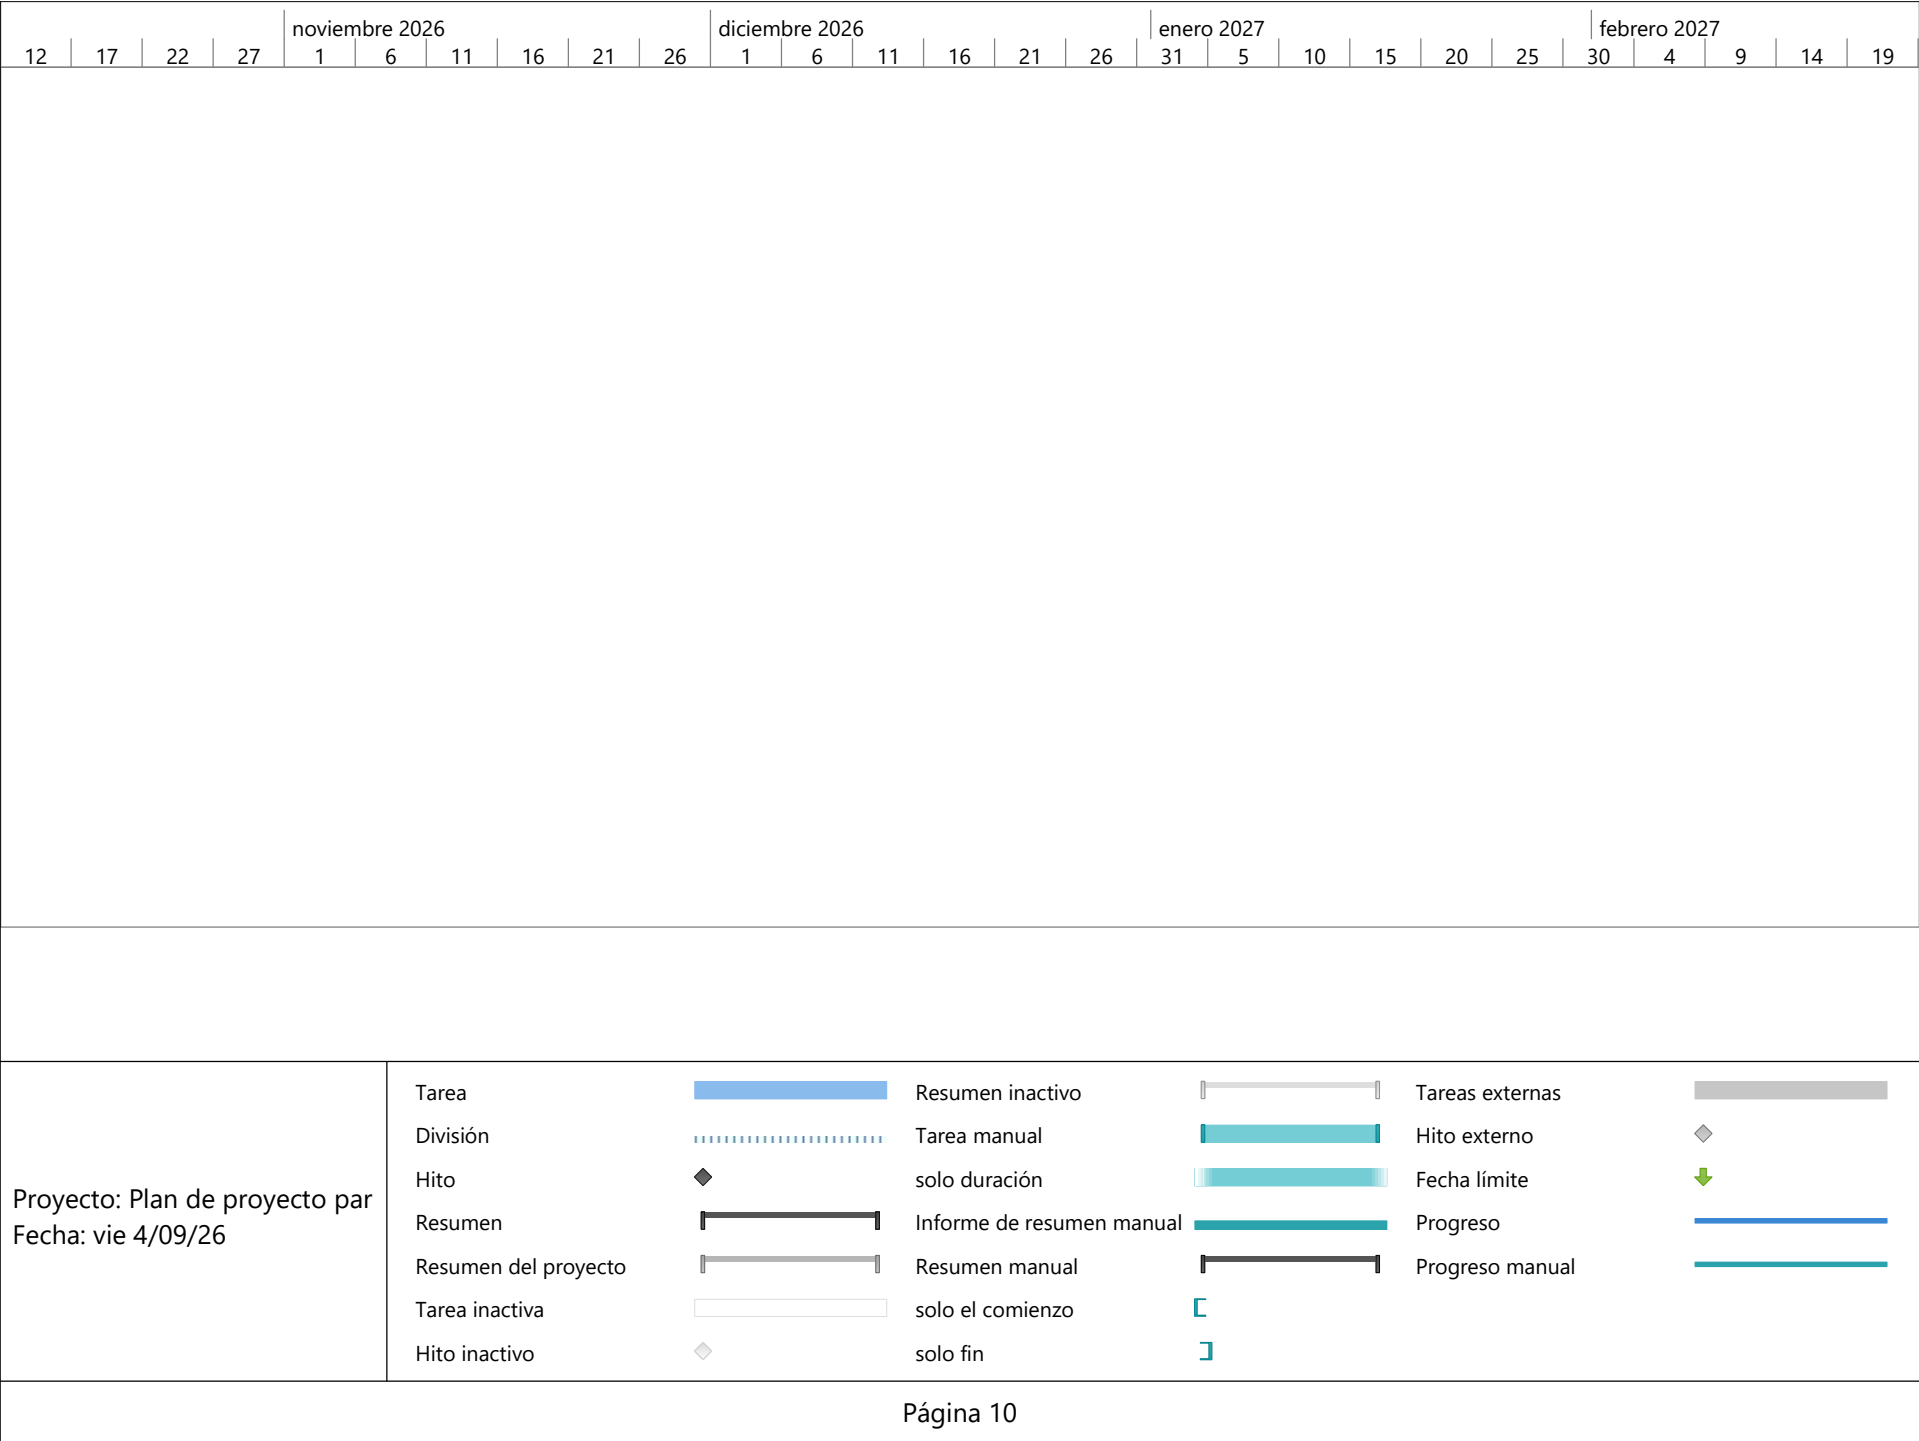

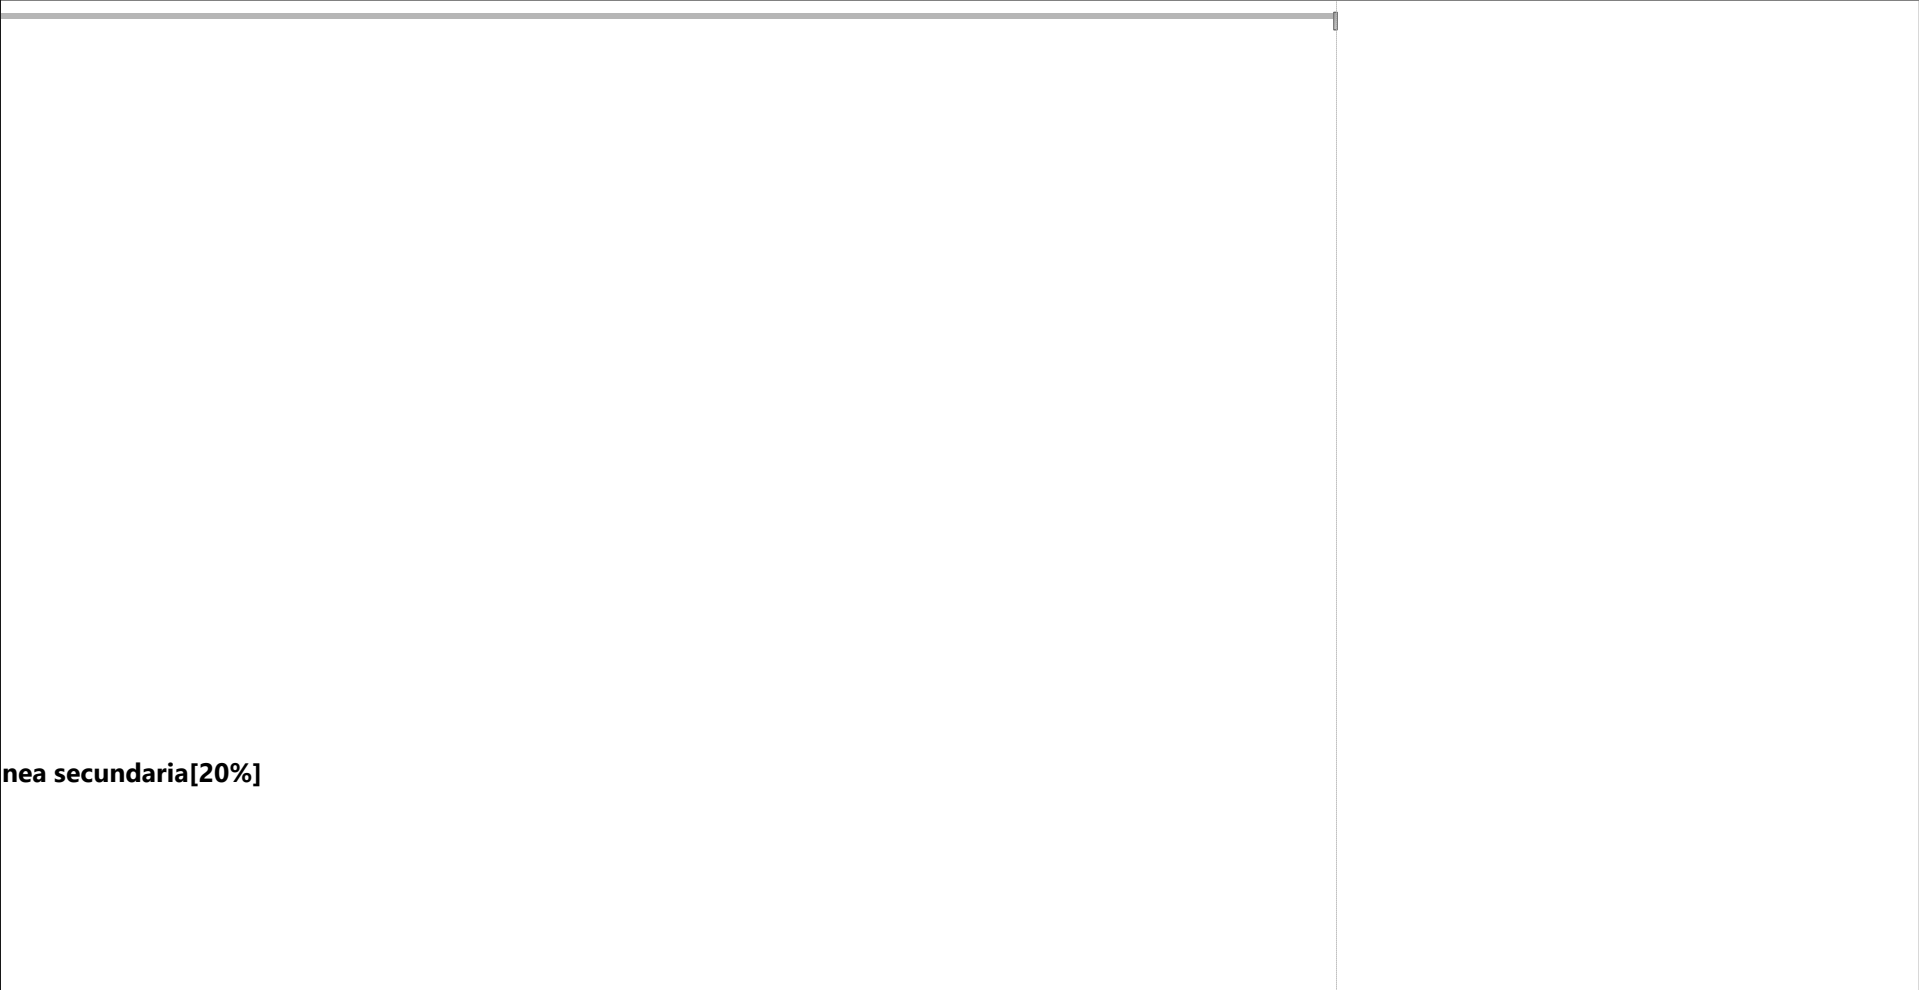

Proyecto: Plan de proyecto par Fecha: vie 4/09/26	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

