

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	12 mar '12							19 mar '12							26 mar '12							0
						D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
1	INTCOMED LTDA.	1 día?	lun 03/09/12	lun 03/09/12																							
2	Interventoría Claro Bogotá	89,5 días	lun 03/09/12	vie 04/01/13																							
3	ING. MODELO OPERATIVO	21 días	lun 03/09/12	lun 01/10/12																							
4	Ing. Conceptual	7 días	lun 03/09/12	mar 11/09/12																							
5	Objetivos	1 día	lun 03/09/12	lun 03/09/12																							
6	Aprobación objetivos	0 días	lun 03/09/12	lun 03/09/12	5																						
7	Tecnologías	2 días	mar 04/09/12	mié 05/09/12	6																						
8	Aprobacion tecnología utilizada	0 días	mié 05/09/12	mié 05/09/12	7																						
9	Normas Técnicas	2 días	jue 06/09/12	vie 07/09/12	8																						
10	Verificación documentación	0 días	vie 07/09/12	vie 07/09/12	9																						
11	Rentabilidad	2 días	lun 10/09/12	mar 11/09/12	10																						
12	Firma viabilidad financiera	0 días	mar 11/09/12	mar 11/09/12	11																						
13	Ing. Básica	4 días	mié 12/09/12	lun 17/09/12	12																						
14	Requerimientos	2 días	mié 12/09/12	jue 13/09/12																							
15	Autorizacion requerimientos	0 días	jue 13/09/12	jue 13/09/12	14																						
16	Alcance	2 días	vie 14/09/12	lun 17/09/12	15																						
17	Firma acuerdo de alcance	0 días	lun 17/09/12	lun 17/09/12	16																						
18	Ing. De Detalle	10 días	mar 18/09/12	lun 01/10/12	17																						
19	Especificaciones Técnicas	5 días	mar 18/09/12	lun 24/09/12																							
20	Aprobación	0 días	lun 24/09/12	lun 24/09/12	19																						
21	Procesos	5 días	mar 25/09/12	lun 01/10/12	20																						
22	Firma aceptación del proyecto	0 días	lun 01/10/12	lun 01/10/12	18,21,3																						
23	IMPLEMENTACIÓN	40,5 días	mar 02/10/12	mar 27/11/12	22																						
24	Procura	7 días	mar 02/10/12	mié 10/10/12																							
25	Elegir Proveedores	1 día	mar 02/10/12	mar 02/10/12																							
26	Firma aceptación proveedores	0 días	mar 02/10/12	mar 02/10/12	25																						
27	Firmar Contratos	1 día	mié 03/10/12	mié 03/10/12	26																						
28	Firmas de contratos	0 días	mié 03/10/12	mié 03/10/12	27																						
29	Gestionar Ordenes de Compra	4 días	jue 04/10/12	mar 09/10/12	28																						

Proyecto: INTCOMED_LTDA Proyecto
Fecha: mar 21/08/12

•Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido



Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

Tarea inactiva

Hito inactivo



Resumen inactivo

Tarea manual


Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin



[illegible]

Proyecto: INTCOMED_LTDA Proyecto Fecha: mar 21/08/12	•Tarea		Progreso resumido		Resumen inactivo	
	Tarea crítica		División		Tarea manual	
	Progreso		Tareas externas		Sólo duración	
	Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
	Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
	Tarea resumida		Fecha límite		Sólo el comienzo	
	Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
	Hito resumido		Hito inactivo			

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	12 mar '12							19 mar '12							26 mar '12							0
						D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
53	Capacitación	19 días	mar 27/11/12	lun 24/12/12																							
54	Definición contenidos	4 días	mar 27/11/12	lun 03/12/12																							
55	Aprobación contenidos	0 días	lun 03/12/12	lun 03/12/12	54																						
56	Ejecución	15 días	lun 03/12/12	lun 24/12/12	55																						
57	Verificación certificados	0 días	lun 24/12/12	lun 24/12/12	56																						
58	Arranque	3 días	lun 24/12/12	jue 27/12/12	57																						
59	Encendido y pruebas de sistemas de información	1 día	lun 24/12/12	mar 25/12/12																							
60	Verificación inicio	0 días	mar 25/12/12	mar 25/12/12	59																						
61	Ajuste a sistemas de información	3 días	lun 24/12/12	jue 27/12/12																							
62	Checklist arranque	0 días	jue 27/12/12	jue 27/12/12	61																						
63	Puesta en servicio	2 días	jue 27/12/12	lun 31/12/12	62																						
64	Salida a operación	1 día	jue 27/12/12	vie 28/12/12																							
65	Recibir reporte de fallas	0 días	vie 28/12/12	vie 28/12/12	64																						
66	Elaboración informe de resultados	1 día	vie 28/12/12	lun 31/12/12	65																						
67	Checklist Puesta en servicio	0 días	lun 31/12/12	lun 31/12/12	66																						
68	Entrega	3 días	lun 31/12/12	jue 03/01/13	67																						
69	Generación y entrega de informes	1 día	lun 31/12/12	mar 01/01/13																							
70	Aprobación factibilidad	0 días	mar 01/01/13	mar 01/01/13	69																						
71	Aceptación de factibilidad	2 días	mar 01/01/13	jue 03/01/13	70																						
72	Ajustes finales	2 días	lun 31/12/12	mié 02/01/13																							
73	Firma de recibido	0 días	mié 02/01/13	mié 02/01/13	72																						
74	Documentación	2 días	mié 02/01/13	vie 04/01/13	73																						
75	Recopilación documentos	1 día	mié 02/01/13	jue 03/01/13																							
76	Firma del otro sí	0 días	jue 03/01/13	jue 03/01/13	75																						
77	Verificación y entrega	1 día	jue 03/01/13	vie 04/01/13	76																						

Proyecto: INTCOMED_LTDA Proyecto
Fecha: mar 21/08/12

•Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido



Progreso resumido



División



Tareas externas



Resumen del proyecto



Agrupar por síntesis



Fecha límite



Tarea inactiva



Hito inactivo



Resumen inactivo



Tarea manual



Sólo duración



Informe de resumen manual




Resumen manual



Sólo el comienzo



Sólo fin



[illegible]

[illegible]

[illegible]

Proyecto: INTCOMED_LTDA Proyecto Fecha: mar 21/08/12	āTarea		Progreso resumido		Resumen inactivo	
	Tarea crítica		División		Tarea manual	
	Progreso		Tareas externas		Sólo duración	
	Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
	Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
	Tarea resumida		Fecha límite		Sólo el comienzo	
	Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
	Hito resumido		Hito inactivo			


21 may '12								28 may '12								04 jun '12								11 jun '12								18 jun '12								25 jun '12								02 jul '12							
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D						
Proyecto: INTCOMED_LTDA Proyecto Fecha: mar 21/08/12								•Tarea		Progreso resumido		Resumen inactivo																																											
								Tarea crítica		División		Tarea manual																																											
								Progreso		Tareas externas		Sólo duración																																											
								Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual																																											
								Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual																																											
								Tarea resumida		Fecha límite		Sólo el comienzo																																											
								Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin																																											
								Hito resumido		Hito inactivo																																													
Página 12																																																							

09 jul '12								16 jul '12								23 jul '12								30 jul '12								06 ago '12								13 ago '12								20 ago '12			
S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J											

Proyecto: INTCOMED_LTDA Proyecto
Fecha: mar 21/08/12

•Tarea		Progreso resumido		Resumen inactivo	
Tarea crítica		División		Tarea manual	
Progreso		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Fecha límite		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo			

09 jul '12								16 jul '12								23 jul '12								30 jul '12								06 ago '12								13 ago '12								20 ago '12							
S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J															
Proyecto: INTCOMED_LTDA Proyecto Fecha: mar 21/08/12								Tarea			Progreso resumido			Resumen inactivo																																									
								Tarea crítica			División			Tarea manual																																									
								Progreso			Tareas externas			Sólo duración																																									
								Hito			Resumen del proyecto			Informe de resumen manual																																									
								Resumen			Agrupar por síntesis			Resumen manual																																									
								Tarea resumida			Fecha límite			Sólo el comienzo																																									
								Tarea crítica resumida			Tarea inactiva			Sólo fin																																									
								Hito resumido			Hito inactivo																																												
Página 16																																																							

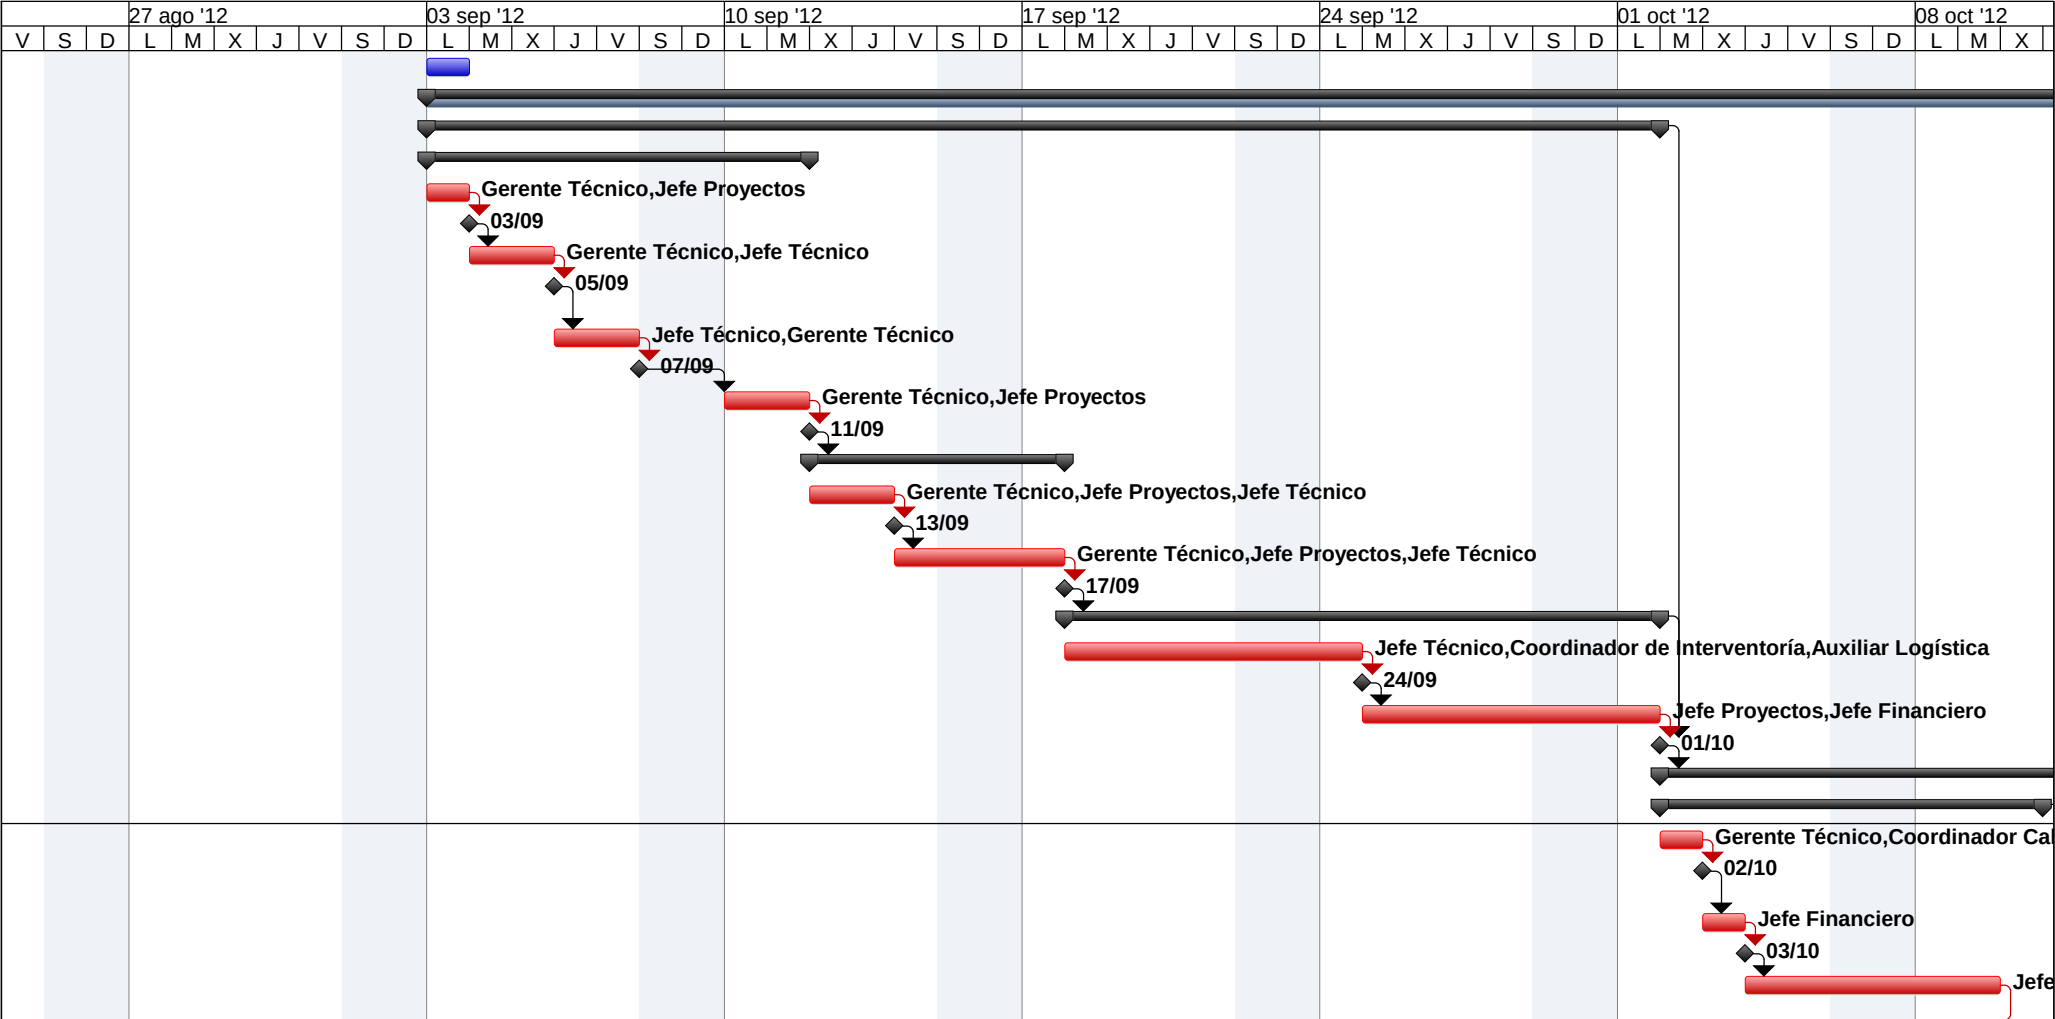


Proyecto: INTCOMED_LTDA Proyecto Fecha: mar 21/08/12	áTarea		Progreso resumido		Resumen inactivo	
	Tarea crítica		División		Tarea manual	
	Progreso		Tareas externas		Sólo duración	
	Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
	Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
	Tarea resumida		Fecha límite		Sólo el comienzo	
	Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
	Hito resumido		Hito inactivo			

[illegible]


Proyecto: INTCOMED_LTDA Proyecto Fecha: mar 21/08/12	āTarea		Progreso resumido		Resumen inactivo	
	Tarea crítica		División		Tarea manual	
	Progreso		Tareas externas		Sólo duración	
	Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
	Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
	Tarea resumida		Fecha límite		Sólo el comienzo	
	Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
	Hito resumido		Hito inactivo			

			27 ago '12							03 sep '12							10 sep '12							17 sep '12							24 sep '12							01 oct '12							08 oct '12		
V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X
Proyecto: INTCOMED_LTDA Proyecto Fecha: mar 21/08/12			āTarea		Progreso resumido		Resumen inactivo																																								
			Tarea crítica		División		Tarea manual																																								
			Progreso		Tareas externas		Sólo duración																																								
			Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual																																								
			Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual																																								
			Tarea resumida		Fecha límite		Sólo el comienzo																																								
			Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin																																								
			Hito resumido		Hito inactivo																																										
Página 20																																															

[illegible]

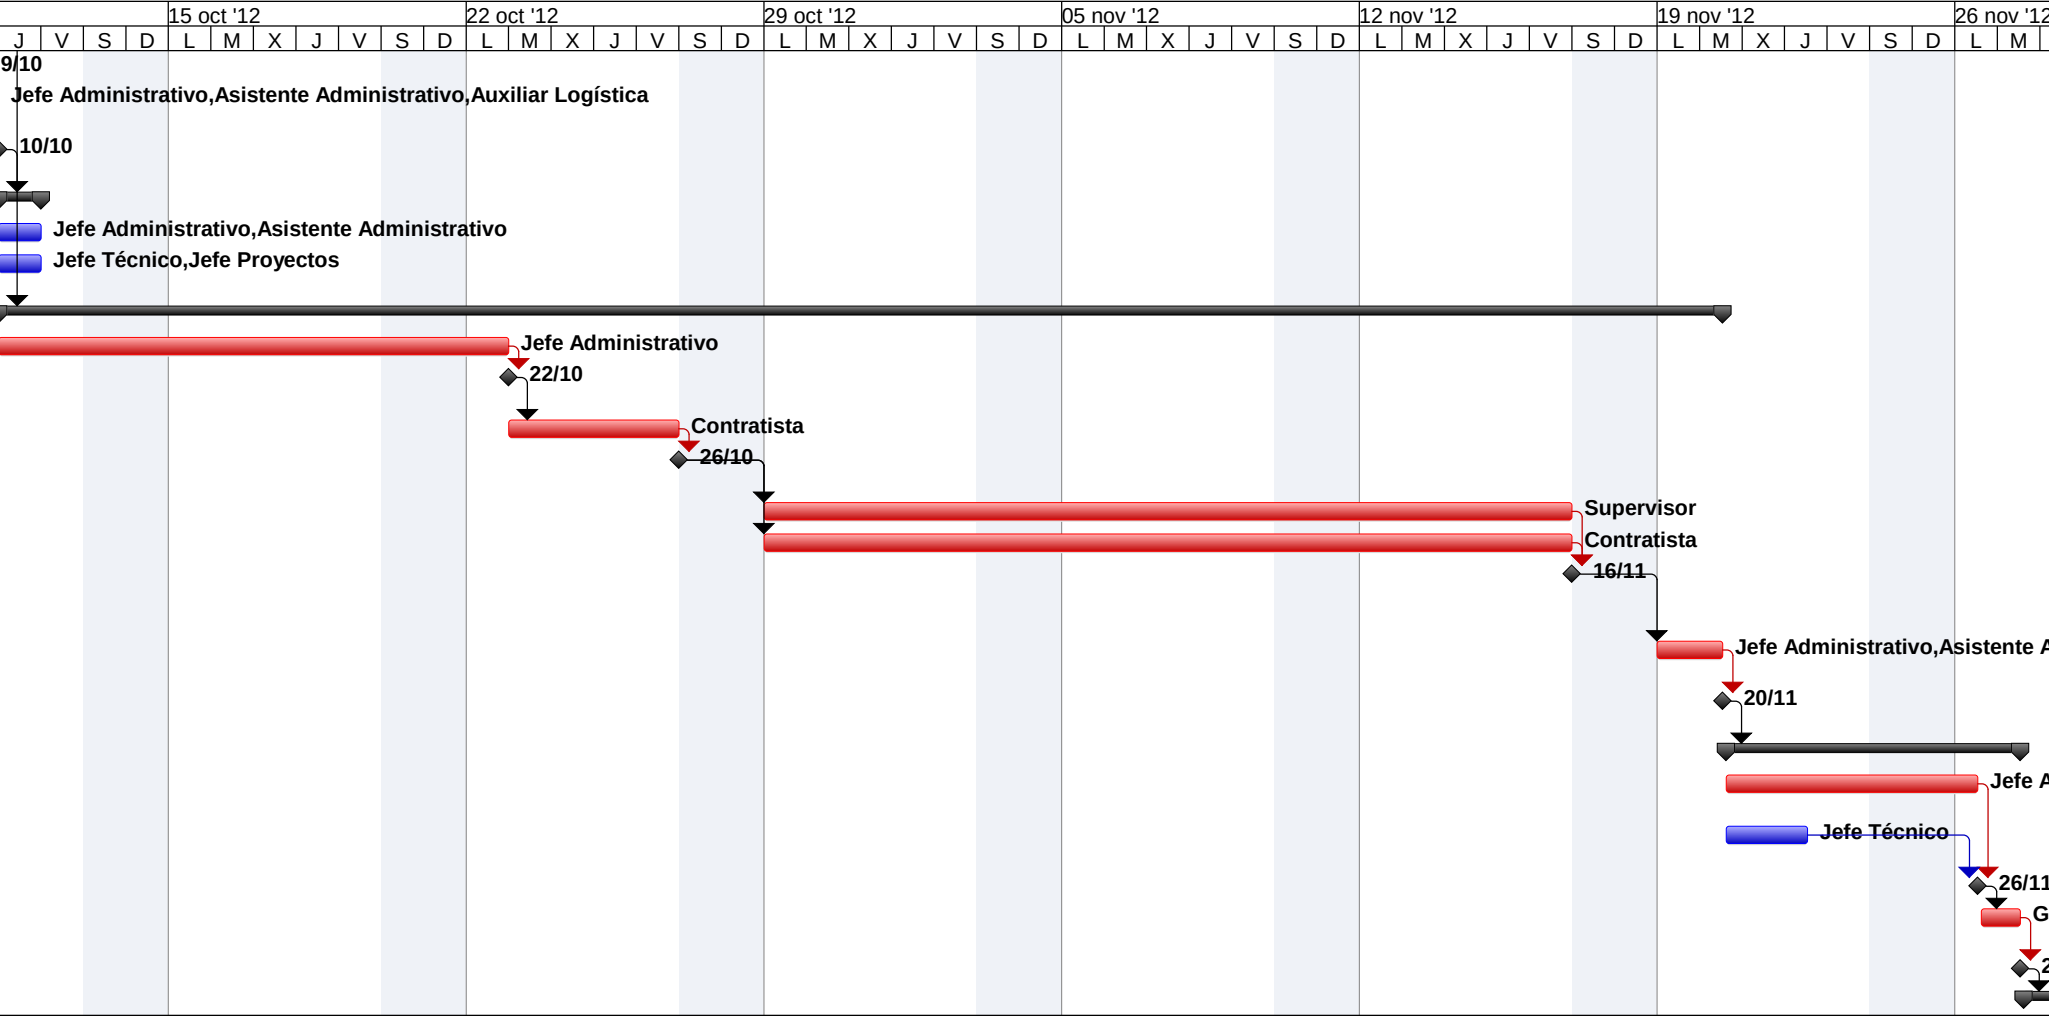

Proyecto: INTCOMED_LTDA Proyecto Fecha: mar 21/08/12	•Tarea		Progreso resumido		Resumen inactivo	
	Tarea crítica		División		Tarea manual	
	Progreso		Tareas externas		Sólo duración	
	Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
	Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
	Tarea resumida		Fecha límite		Sólo el comienzo	
	Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
	Hito resumido		Hito inactivo			

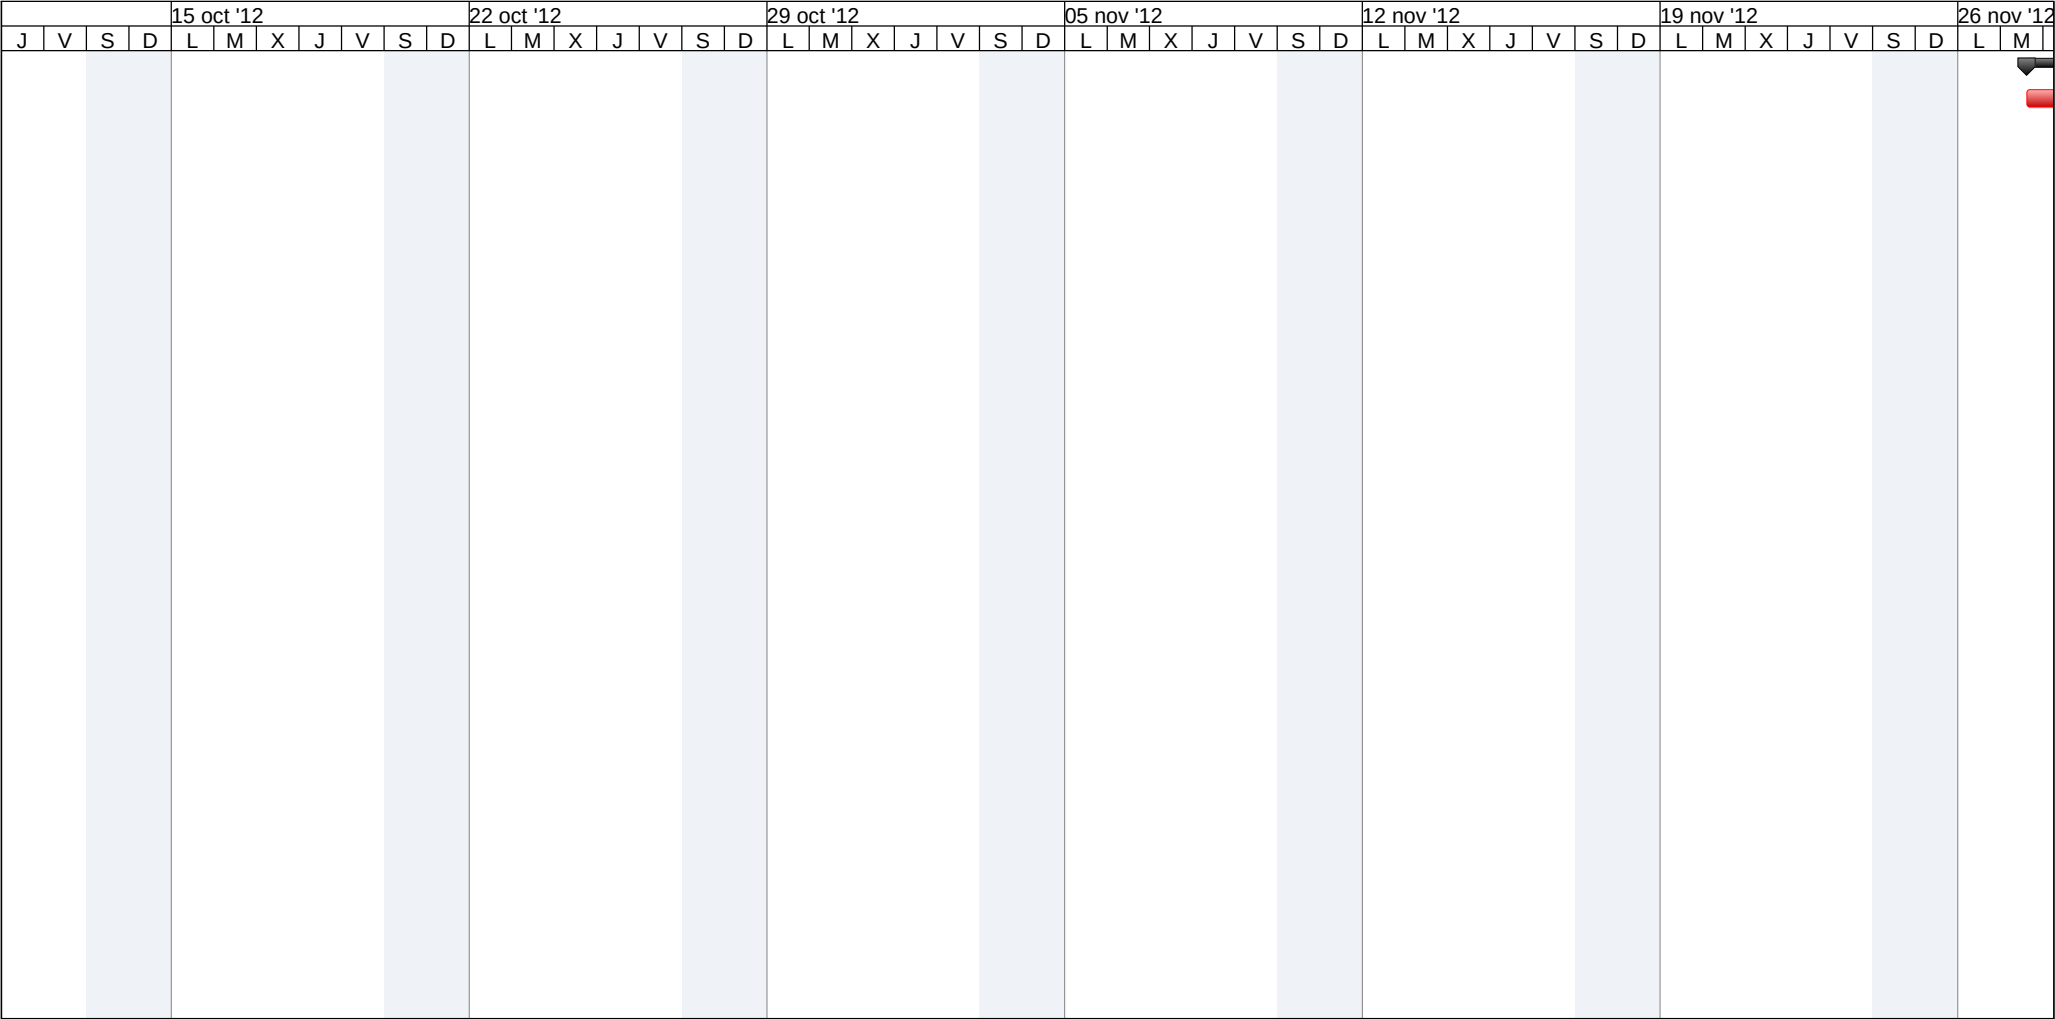

Proyecto: INTCOMED_LTDA Proyecto
Fecha: mar 21/08/12

•Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual


Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Página 23

				15 oct '12				22 oct '12				29 oct '12				05 nov '12				12 nov '12				19 nov '12				26 nov '12														
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M		
Proyecto: INTCOMED_LTDA Proyecto Fecha: mar 21/08/12				Tarea		Progreso resumido		Resumen inactivo																																		
				Tarea crítica		División		Tarea manual																																		
				Progreso		Tareas externas		Sólo duración																																		
				Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual																																		
				Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual																																		
				Tarea resumida		Fecha límite		Sólo el comienzo																																		
				Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin																																		
				Hito resumido		Hito inactivo																																				
Página 24																																										

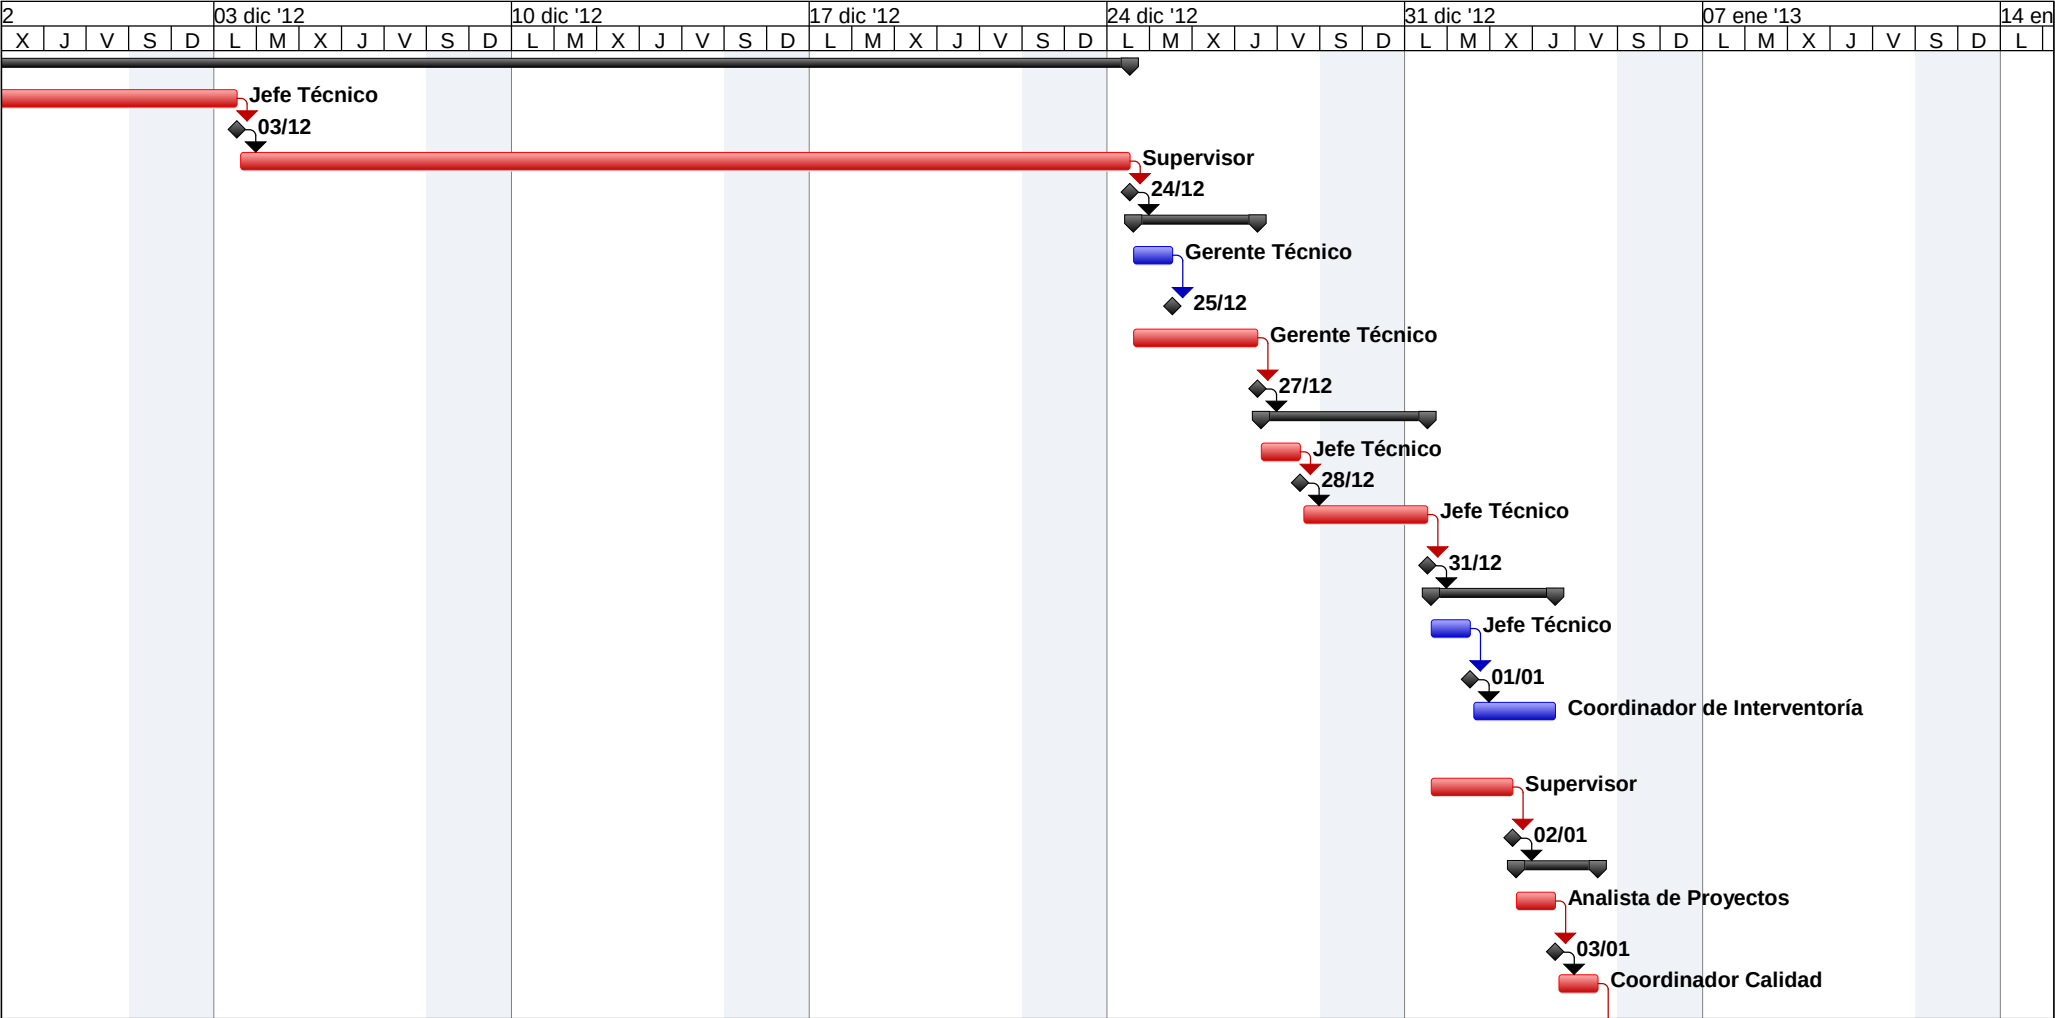

Proyecto: INTCOMED_LTDA Proyecto
Fecha: mar 21/08/12

~Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido



Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

Tarea inactiva

Hito inactivo



Resumen inactivo

Tarea manual


Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin



2

03 dic '12

10 dic '12

17 dic '12

24 dic '12

31 dic '12

07 ene '13

14 en

XJVS D

L M X J V S D

L M X J V S D

L M X J V S D

L M X J V S D

L M X J V S D

L M X J V S D

04/01

Proyecto: INTCOMED_LTDA Proyecto

Fecha: mar 21/08/12

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Página 28
