



Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	01 septiembre		01 octubre		01 noviembre	
						02/09	16/09	30/09	14/10	28/10	11/11
1		1 Proyecto NFC	306 días	lun 08/10/12	lun 09/12/13						
2		1.1 Formulacion, Diseño y Evaluación	10 días	lun 08/10/12	vie 19/10/12						
3		1.1.1 Conceptualización de la solución	2 días	lun 08/10/12	mar 09/10/12						
4		1.1.2 Ingeniería conceptual	2 días	mié 10/10/12	jue 11/10/12						
5		1.1.3 Ingeniería Básica	2 días	vie 12/10/12	lun 15/10/12						
6		1.1.4 Ingeniería de Detalle	2 días	mar 16/10/12	mié 17/10/12						
7		1.1.5 Propuesta formal	2 días	jue 18/10/12	vie 19/10/12						
8		1.1.6 Firma de contrato	0 días	vie 19/10/12	vie 19/10/12						
9		1.2 Ejecucion	34 días	lun 22/10/12	jue 06/12/12						
27		1.2.2 Webservice y Software Administración	24 días	lun 22/10/12	jue 22/11/12						
34		1.2.2.7 Configuración y parametrización de usuarios para acceso a WebService	2 días	lun 22/10/12	mar 23/10/12						
35		1.2.2.8 Finalizacion de configruación de nuevo Usuario	0 días	mar 23/10/12	mar 23/10/12						
36		1.2.2.9 Configuración de Formularios y Usuarios para acceso a Software	3 días	mié 24/10/12	vie 26/10/12						
37		1.2.2.10 Configuración Software Finalizada	0 días	vie 26/10/12	vie 26/10/12						
28		1.2.2.1 Efectuar calculos de transaccionabilidad	2 días	lun 29/10/12	mar 30/10/12						
29		1.2.2.2 Finalizacion de calculos Transaccionabilidad	0 días	mar 30/10/12	mar 30/10/12						

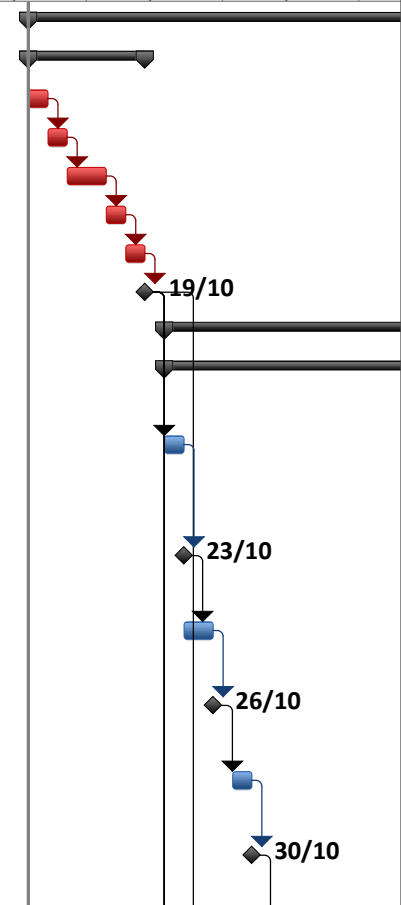


Proyecto: Proyecto1_s Fecha: vie 07/12/12	Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
	División		Hito inactivo		Sólo fin	
	Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
	Resumen		Tarea manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Sólo duración		División crítica	
	Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
	Hito externo		Resumen manual			

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	01 septiembre		01 octubre		01 noviembre	
						02/09	16/09	30/09	14/10	28/10	11/11
30		1.2.2.3 Adecuación de Servidores y instalación de Hardware Adicional requerido	4 días	mié 31/10/12	lun 05/11/12						
31		1.2.2.4 Finalización de adecuación y instalación de nuevo Hardware	0 días	lun 05/11/12	lun 05/11/12						
32		1.2.2.5 Pruebas de Software Internas	3 días	mar 06/11/12	jue 08/11/12						
33		1.2.2.6 Finalización de Pruebas Software	0 días	jue 08/11/12	jue 08/11/12						
38		1.2.2.11 Prueba de transacción	3 días	vie 09/11/12	mar 13/11/12						
39		1.2.2.12 Finalización Prueba Transaccion	0 días	mar 13/11/12	mar 13/11/12						
40		1.2.2.13 Aprobación Arranque	2 días	mié 14/11/12	jue 15/11/12						
41		1.2.2.14 Finalización Aprobación Arranque	0 días	jue 15/11/12	jue 15/11/12						
42		1.2.2.15 Pruebas Finales con cliente	4 días	vie 16/11/12	mié 21/11/12						
43		1.2.2.16 Finalización pruebas cliente	0 días	mié 21/11/12	mié 21/11/12						
44		1.2.2.17 Aprobación puesta en servicio	1 día	jue 22/11/12	jue 22/11/12						



Proyecto: Proyecto1_s Fecha: vie 07/12/12	Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
	División		Hito inactivo		Sólo fin	
	Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
	Resumen		Tarea manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Sólo duración		División crítica	
	Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
	Hito externo		Resumen manual			


Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	01 septiembre		01 octubre		01 noviembre	
						02/09	16/09	30/09	14/10	28/10	11/11
45		1.2.2.18 Finalización Aprobación puesta en servicio	0 días	jue 22/11/12	jue 22/11/12						
10		1.2.1 Registradoras	34 días	lun 22/10/12	jue 06/12/12						
11		1.2.1.1 Solicitud de registradoras con tecnología NFC	4 días	lun 22/10/12	jue 25/10/12						
12		1.2.1.2 Entrega de Registradoras por parte de Proveedor	0 días	jue 25/10/12	jue 25/10/12						
13		1.2.1.3 Set de Pruebas para muestra de registradoras recibidos	2 días	vie 26/10/12	lun 29/10/12						
14		1.2.1.4 Pruebas Registradoras OK	0 días	lun 29/10/12	lun 29/10/12						
15		1.2.1.5 Parametrización, registros y Configuración de Registradoras	3 días	mar 30/10/12	jue 01/11/12						
16		1.2.1.6 Finalización de Adecuación de Registradoras	0 días	jue 01/11/12	jue 01/11/12						
17		1.2.1.7 Distribución, instalación y capacitación en sitio de 80 talanqueras en las estaciones o portales que defina el cliente	20 días	vie 02/11/12	jue 29/11/12						
18		1.2.1.8 Finalización de instalación y capacitación en Sedes	0 días	jue 29/11/12	jue 29/11/12						
19		1.2.1.9 Pruebas en Línea de Registradoras	2 días	vie 30/11/12	lun 03/12/12						
20		1.2.1.10 Finalización de Pruebas	0 días	lun 03/12/12	lun 03/12/12						



Proyecto: Proyecto1_s
Fecha: vie 07/12/12

Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
División		Hito inactivo		Sólo fin	
Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
Resumen		Tarea manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Sólo duración		División crítica	
Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
Hito externo		Resumen manual			

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	01 septiembre		01 octubre		01 noviembre	
						02/09	16/09	30/09	14/10	28/10	11/11
21		1.2.1.11 Parametrización Final de Registradora	1 día	mar 04/12/12	mar 04/12/12						
22		1.2.1.12 Finalización de Parametrización	0 días	mar 04/12/12	mar 04/12/12						
23		1.2.1.13 Transacción efectiva	1 día	mié 05/12/12	mié 05/12/12						
24		1.2.1.14 Finalización Transacción Efectiva	0 días	mié 05/12/12	mié 05/12/12						
25		1.2.1.15 Aprobación puesta en servicio por parte de cliente	1 día	jue 06/12/12	jue 06/12/12						
26		1.2.1.16 Finalización Aprobación puesta en servicio	0 días	jue 06/12/12	jue 06/12/12						
46		1.3 Seguimiento y control	44 días	lun 22/10/12	jue 20/12/12						
50		1.3.4 Entrega de documentos	3 días	lun 22/10/12	mié 24/10/12						
49		1.3.3 Reunión de seguimiento	5 días	lun 22/10/12	vie 26/10/12						
48		1.3.2 Documentación de avances	3 días	jue 25/10/12	lun 29/10/12						
47		1.3.1 Seguimiento y control	44 días	lun 22/10/12	jue 20/12/12						
51		1.4 Operación	261 días	vie 07/12/12	sáb 07/12/13						
52		1.4.1 5.1. Monitoreo y soporte	262 días	vie 07/12/12	sáb 07/12/13						
53		1.4.2 5.2. Supervisión y seguimiento de SLAs	262 días	vie 07/12/12	sáb 07/12/13						
54		1.5 Cierre	1 día	lun 09/12/13	lun 09/12/13						
55		1.5.1 Reunión de cierre de contrato con el cliente	1 día	lun 09/12/13	lun 09/12/13						
56		1.5.2 Cierre de contrato	0 días	lun 09/12/13	lun 09/12/13						





Proyecto: Proyecto1_s Fecha: vie 07/12/12	Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
	División		Hito inactivo		Sólo fin	
	Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
	Resumen		Tarea manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Sólo duración		División crítica	
	Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
	Hito externo		Resumen manual			

mbre	01 diciembre			01 enero			01 febrero			01 marzo			01 abril			01 mayo			01 junio
11/11	25/11	09/12	23/12	06/01	20/01	03/02	17/02	03/03	17/03	31/03	14/04	28/04	12/05	26/05					



Proyecto: Proyecto1_s Fecha: vie 07/12/12	Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
	División		Hito inactivo		Sólo fin	
	Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
	Resumen		Tarea manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Sólo duración		División crítica	
	Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
	Hito externo		Resumen manual			

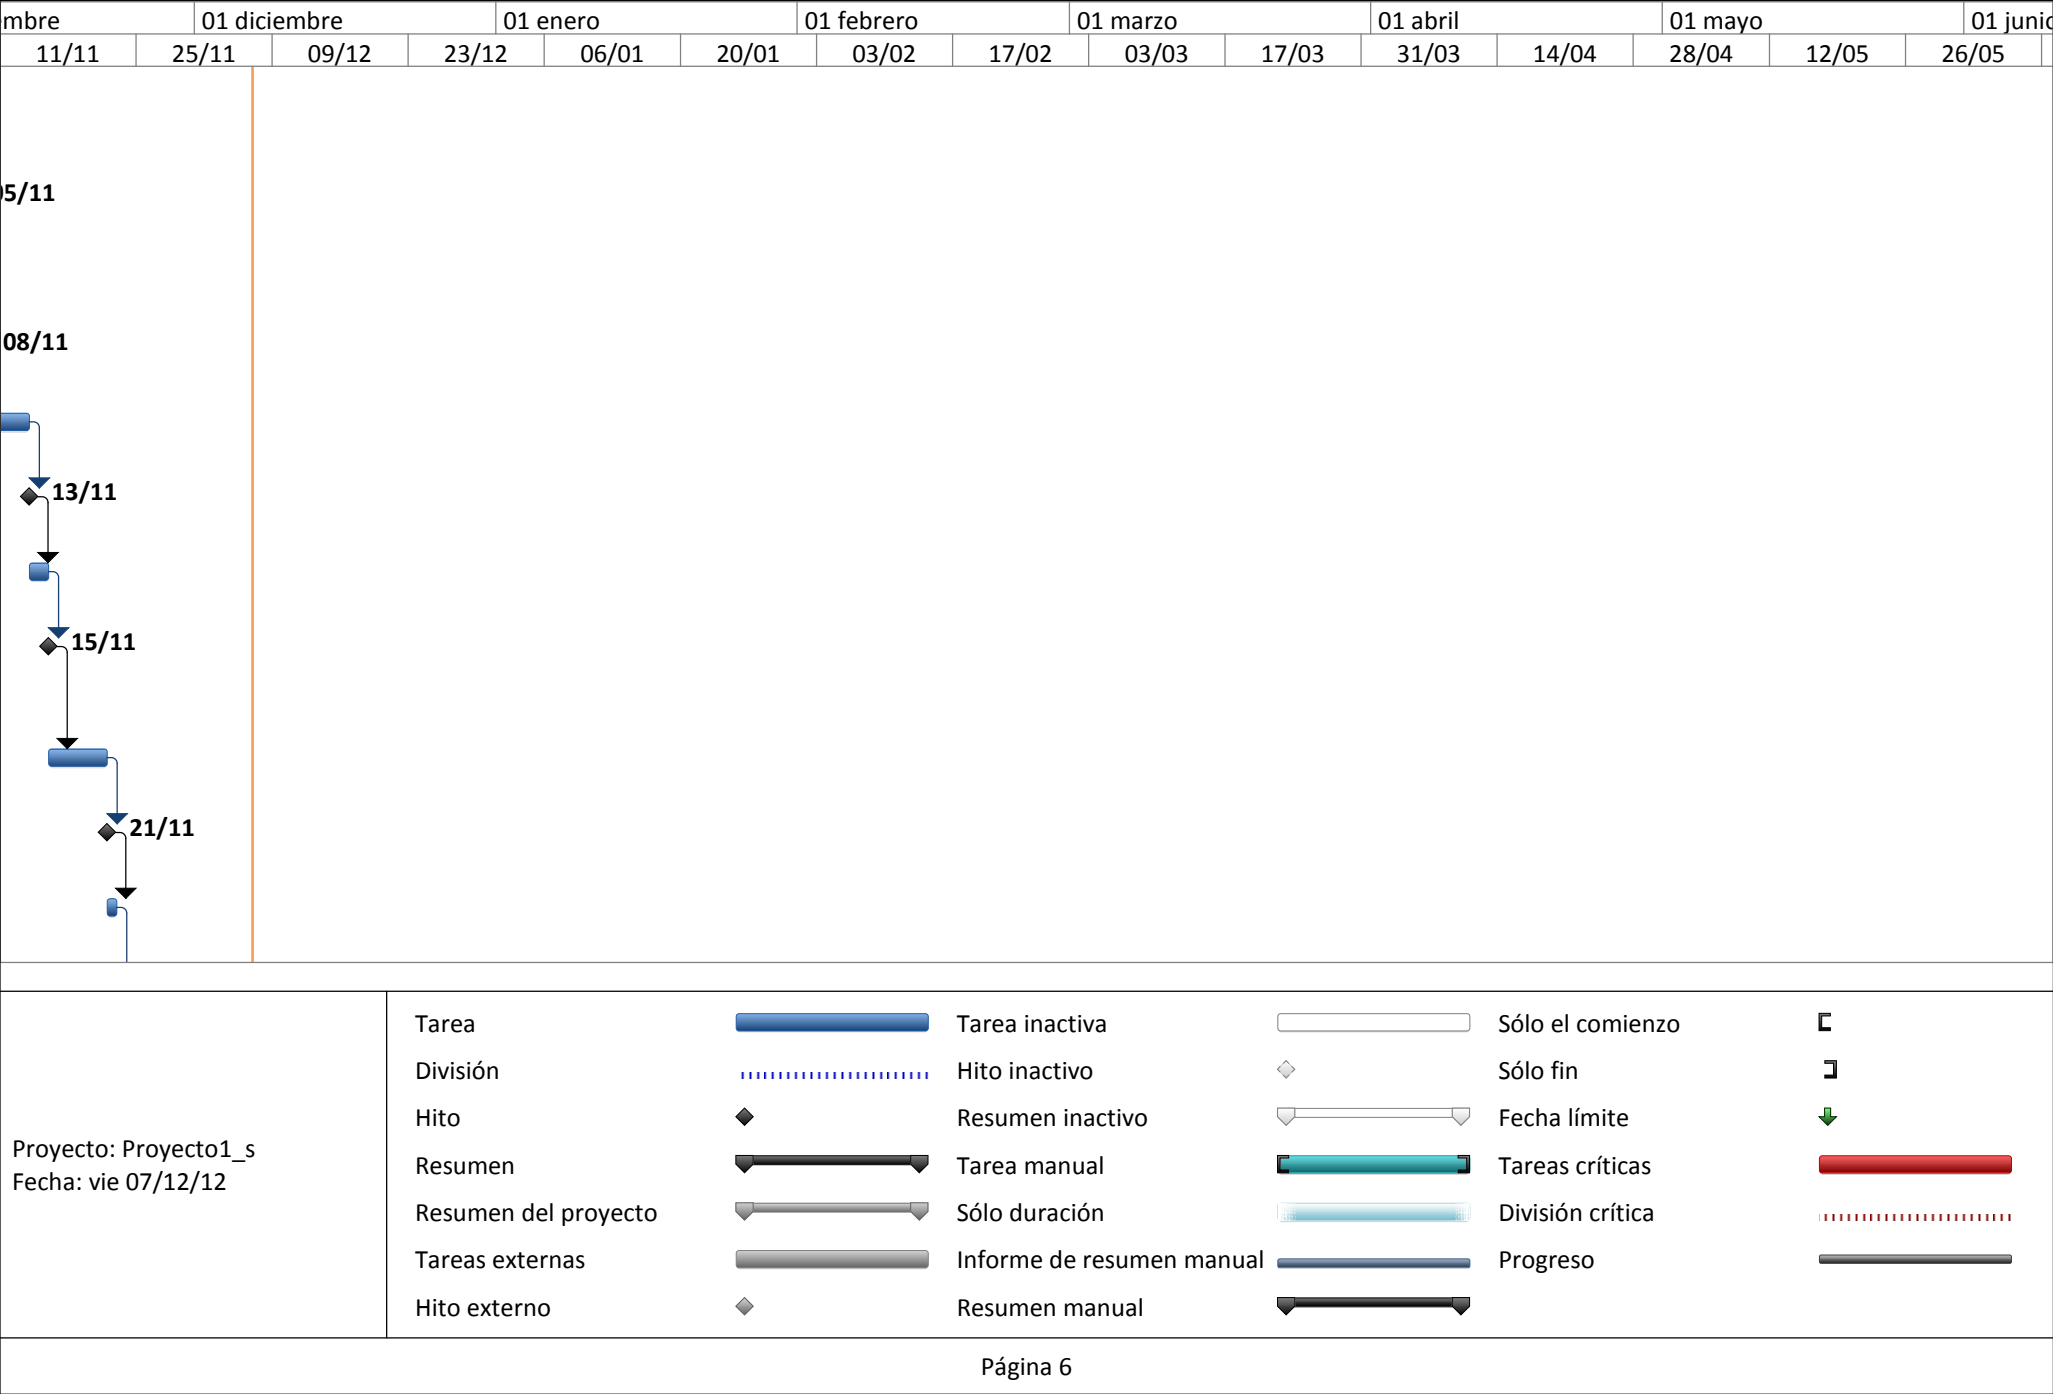

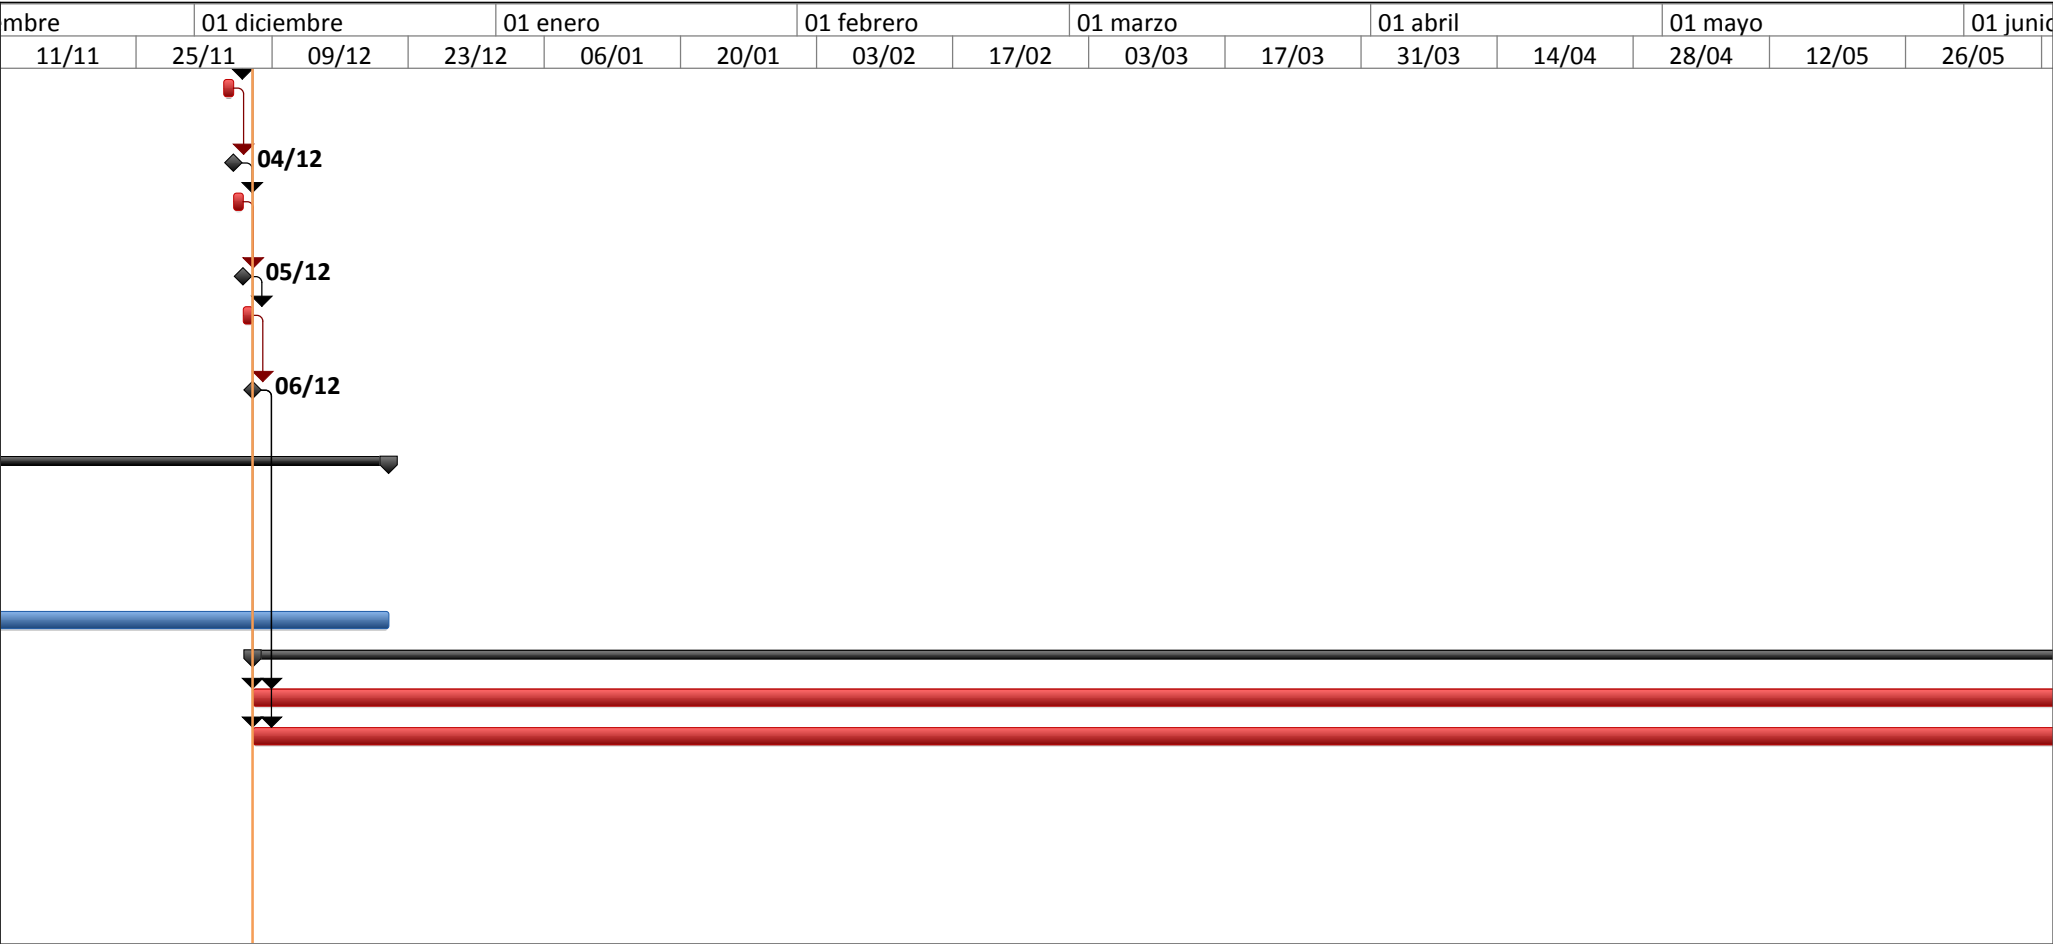


Proyecto: Proyecto1_s Fecha: vie 07/12/12	Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
	División		Hito inactivo		Sólo fin	
	Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
	Resumen		Tarea manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Sólo duración		División crítica	
	Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
	Hito externo		Resumen manual			

o	01 julio			01 agosto			01 septiembre			01 octubre			01 noviembre			01 diciembre	01 e
09/06	23/06	07/07	21/07	04/08	18/08	01/09	15/09	29/09	13/10	27/10	10/11	24/11	08/12	22/12			



Proyecto: Proyecto1_s Fecha: vie 07/12/12	Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
	División		Hito inactivo		Sólo fin	
	Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
	Resumen		Tarea manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Sólo duración		División crítica	
	Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
	Hito externo		Resumen manual			

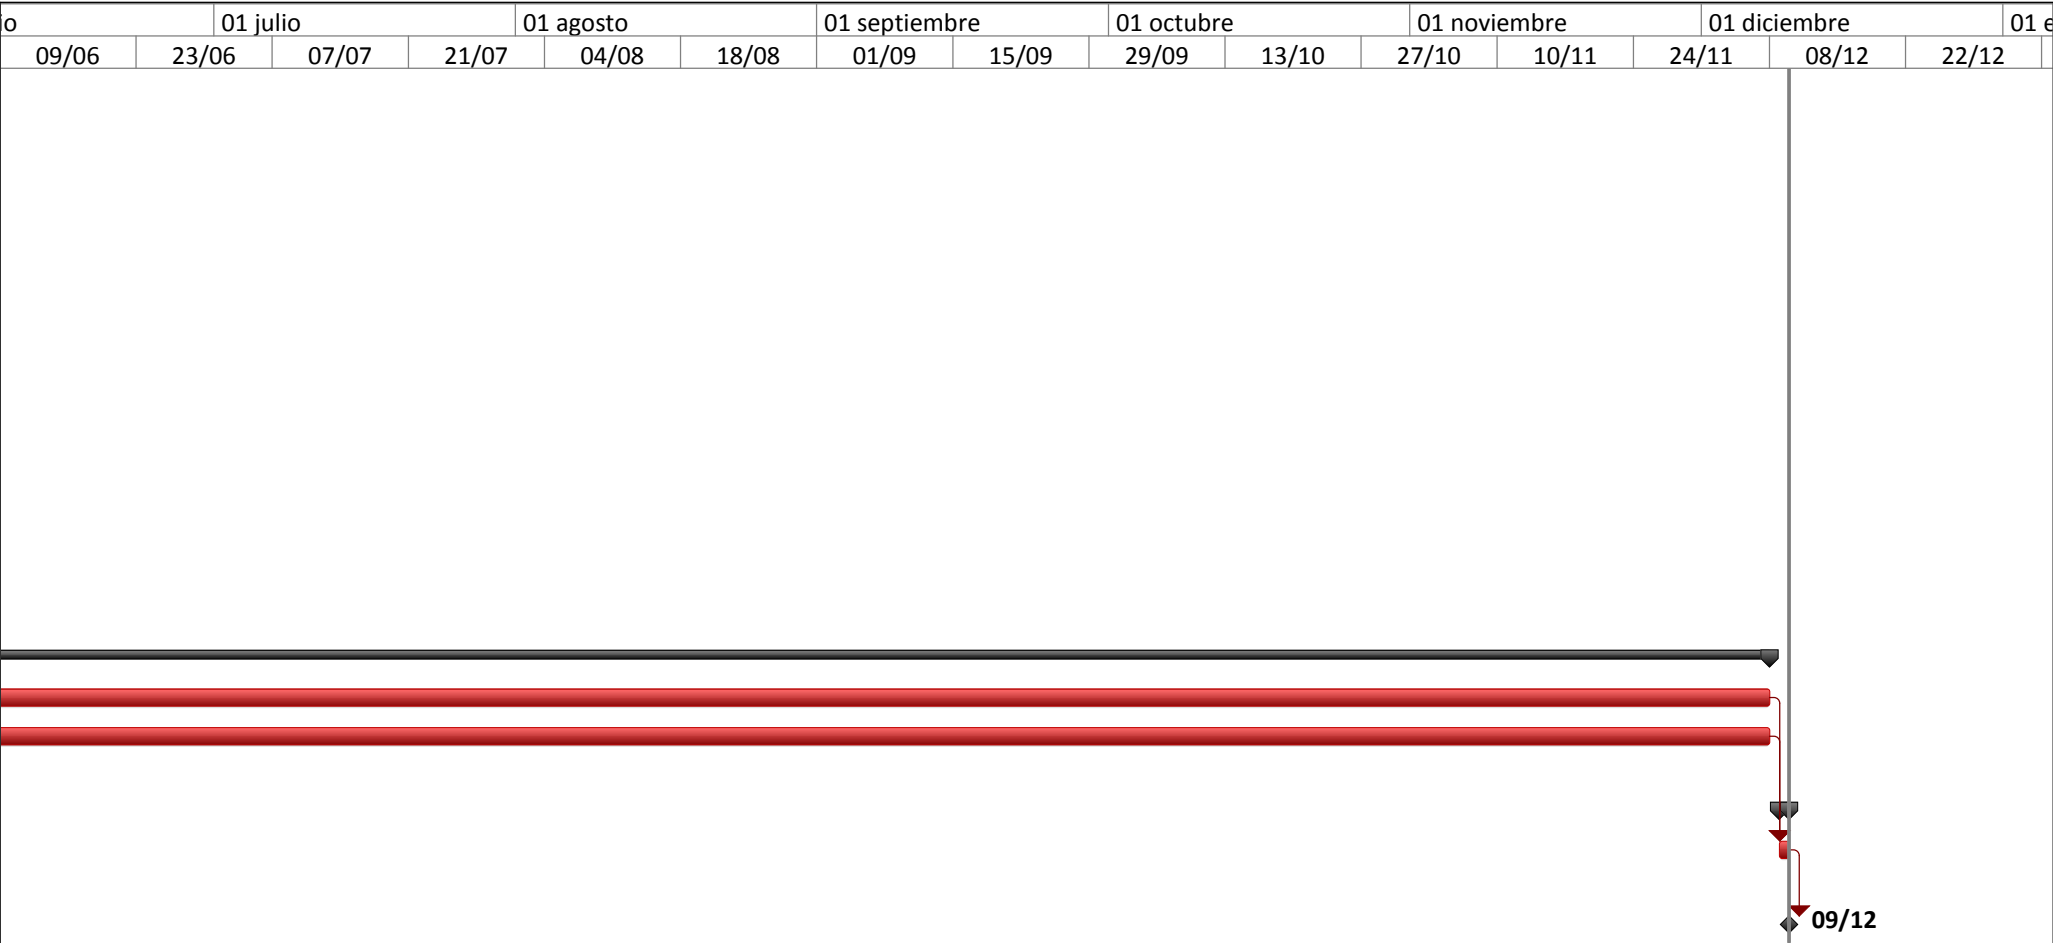

Proyecto: Proyecto1_s Fecha: vie 07/12/12	Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
	División		Hito inactivo		Sólo fin	
	Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
	Resumen		Tarea manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Sólo duración		División crítica	
	Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
	Hito externo		Resumen manual			
