
	INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA							VERSIÓN:	001
	GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA (PARA EL CONTRATO DE OBRA)							FECHA:	2022-03-19

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													
INFORME No.		PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL				Y EL							
OBJETO		<Tal como aparece en el contrato>											
LOCALIZACIÓN		<Indique el municipio, ciudad y barrio, según se requiera>											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA							CONTRATO DE OBRA						
CONTRATO No.:		<Escriba el número de contrato>					CONTRATO No.:		<Escriba el número de contrato>				
FECHA DE SUSCIPCIÓN							FECHA DE SUSCIPCIÓN						
CONTRATISTA:		<Nombre o razón social del Interventor>					CONTRATISTA:		<Nombre o razón social del contratista>				
NIT:		<NIT Interventor>					NIT:		<NIT del contratista>				
REPRESENTANTE LEGAL		<Nombre representante legal Interventor>					REPRESENTANTE LEGAL		<Nombre representante legal Contratista>				
VALOR INICIAL :							VALOR INICIAL :						
ANTICIPO (XX%)							ANTICIPO (XX%)						
VALOR ADICION(ES):							VALOR ADICION(ES):						
FECHA DE ADICION:							FECHA DE ADICION:						
VALOR TOTAL:							VALOR TOTAL:						
*TERMINO DE PRORROGA:							*TERMINO DE PRORROGA:						
*FECHA DE PRORROGA:							*FECHA DE SUSPENSIÓN:						
*FECHA DE SUSPENSIÓN:							*FECHA DE SUSPENSIÓN:						
PLAZO ACTUALIZADO:							PLAZO ACTUALIZADO:						
FECHA DE INICIACIÓN:							FECHA DE INICIACIÓN:						
FECHA DE TERMINACIÓN:							FECHA DE TERMINACIÓN:						
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.													

2. RESUMEN DE PAGOS															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA							CONTRATO DE OBRA								
CONCEPTO	VALOR	%	DESCUENTOS	%	VALOR NETO	FECHA DE PAGO	ESTADO	CONCEPTO	VALOR	%	DESCUENTO	%	VALOR NETO	FECHA DE PAGO	ESTADO

3. ESTADO DE LAS GARANTÍAS															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA							CONTRATO DE OBRA								
MODIFICACIÓN	COMPAÑÍA	POLIZAS No.	ANEXO No.	AMPARO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	MODIFICACIÓN	COMPAÑÍA	POLIZAS No.	ANEXO No.	AMPARO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
					DESDE	HASTA							DESDE	HASTA	

	INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA	VERSIÓN:	001
	GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA (PARA EL CONTRATO DE OBRA)	FECHA:	2022-03-19

4. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:


a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista.

c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de la entidad municipal.

Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

5. CURVA "S"

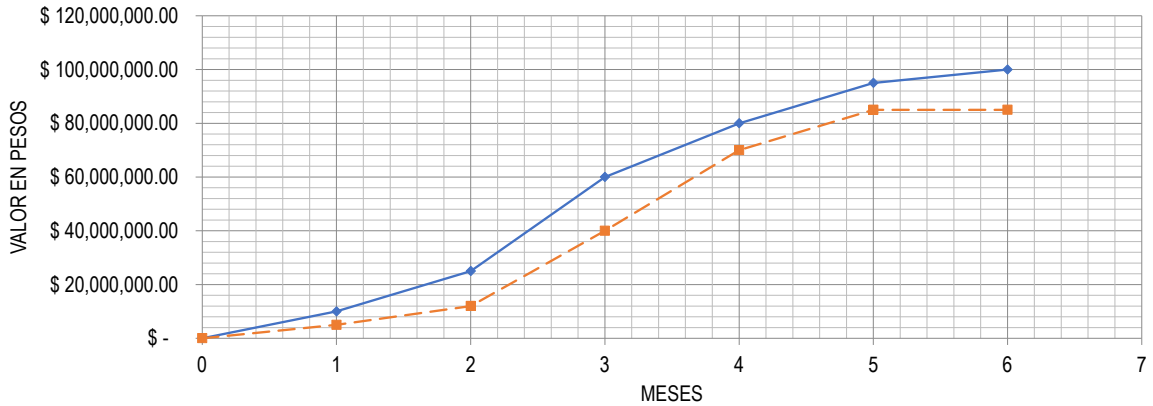

MESES	PROGRAMADO (Valor acumulado)	EJECUTADO (Valor acumulado)
0	\$0.00	\$0.00
1	\$10,000,000.00	\$5,000,000.00
2	\$25,000,000.00	\$15,000,000.00
3	\$60,000,000.00	\$40,000,000.00
4	\$80,000,000.00	\$70,000,000.00
5	\$95,000,000.00	\$85,000,000.00
6	\$100,000,000.00	\$85,000,000.00

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

DIRECTOR INTERVENTORÍA

Nota 1
Nota 2
Nota 3

En "Fecha de corte" se coloca la fecha a la cual se quiere realizar el corte
La información de "CANTIDAD EJECUTADA" esta casilla debe ser ingresada mes a mes dependiendo de la cantidad que se vaya ejecutando
Solo insertar información en las celdas de color azul

FECHA DE CORTE 17/11/2021

CONDICIONES VIGENTES DEL PROYECTO				PROGRAMADO						EJECUTADO				
ITEMS	DESCRIPCION	UND.	CANT.	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DIAS	DIAS TRANSCURRIDOS	CANTIDAD A LA FECHA DE CORTE	PORCENTAJE PROMADO A LA FECHA DE CORTE	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE EJECUTADO	POR EJECUTAR	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	
1	PRELIMINARES													
1.1	Localización y replanteo PH y sus obras de arte	M2	400.00	27/09/2021	5/10/2021	9.00	52.00	400.00	100.00%	400.00	100.00%	0.00	A TIEMPO	TERMINADA
2	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA													
2.1	Excavación mecánica en material común a nivel de subrasante	m3	28.65	29/09/2021	5/10/2021	7.00	50.00	28.65	100.00%	28.65	100.00%	0.00	A TIEMPO	TERMINADA
2.2	Conformación mecánica de la subrasante.	m2	400.00	30/09/2021	8/10/2021	9.00	49.00	400.00	100.00%	400.00	100.00%	0.00	A TIEMPO	TERMINADA
2.3	Suministro, instalación y compactación de Sub-base granular.	m3	60.00	11/10/2021	21/10/2021	11.00	38.00	60.00	100.00%	60.00	100.00%	0.00	A TIEMPO	TERMINADA
2.4	Excavación manual H= 0,30 m y a= 0,20 m para riostras de placa huella.	m3	7.50	18/10/2021	15/11/2021	29.00	31.00	7.50	100.00%	7.50	100.00%	0.00	A TIEMPO	TERMINADA
2.5	Fabricación e instalación concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) huellas.	m3	20.25	13/10/2021	15/11/2021	34.00	36.00	20.25	100.00%	20.25	100.00%	0.00	A TIEMPO	TERMINADA
2.6	Fabricación e instalación de concreto ciclópeo para placa huella 3.000 psi (piedra pegada).	m3	18.00	15/10/2021	16/11/2021	33.00	34.00	18.00	100.00%	18.00	100.00%	0.00	A TIEMPO	TERMINADA
2.7	Fabricación e instalación de concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) para riostras de placa huella.	m3	6.25	19/10/2021	17/11/2021	30.00	30.00	6.25	100.00%	6.25	100.00%	0.00	A TIEMPO	TERMINADA
2.8	Fabricación e instalación de concreto para losa de transición resistencia de 210 kg/cm² (3.000 psi).	m3	2.16	15/10/2021	20/10/2021	6.00	34.00	2.16	100.00%	2.16	100.00%	0.00	A TIEMPO	TERMINADA
2.9	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) para huellas, riostras y placas transición.	Kg	2,623.00	12/10/2021	19/10/2021	8.00	37.00	2,623.00	100.00%	2,623.00	100.00%	0.00	A TIEMPO	TERMINADA
3	OBRAS DE DRENAJE - PLACA HUELLA (Sin Alcantarillas)					1.00		0.00						
3.1	Acero figurado de refuerzo de 4.200 kg/cm² (60.000 psi) cunetas y bordillos.	m3	870.94	19/10/2021	16/11/2021	29.00	30.00	870.94	100.00%	870.94	100.00%	0.00	A TIEMPO	TERMINADA
3.3	Fabricación e instalación concreto para cunetas y bordillos resistencia de 210 kg/cm² (3.000 psi).	Kg	21.60	21/10/2021	17/11/2021	28.00	28.00	21.60	100.00%	21.60	100.00%	0.00	A TIEMPO	TERMINADA
4	ALCANTARILLAS					1.00		0.00						
4.1	Excavación manual.	m3	48.04	7/10/2021	17/10/2021	11.00	42.00	48.04	100.00%	48.04	100.00%	0.00	A TIEMPO	TERMINADA
4.2	Relleno con arena protección tubería.	m2	5.19	10/10/2021	19/10/2021	10.00	39.00	5.19	100.00%	5.19	100.00%	0.00	A TIEMPO	TERMINADA
4.3	Elaboración e instalación de concreto para estructuras resistencia de 210 kg/cm² (3.000 psi).	m3	7.80	21/10/2021	10/11/2021	21.00	28.00	7.80	100.00%	7.80	100.00%	0.00	A TIEMPO	TERMINADA
4.4	Suministro e instalación tubería de diámetro 0,9 m (36") en concreto para cada alcantarilla.	m3	6.50	1/11/2021	16/11/2021	16.00	17.00	6.50	100.00%	6.50	100.00%	0.00	A TIEMPO	TERMINADA
4.5	Elaboración e instalación de disipadores de energía en concreto ciclópeo 3.000 psi	m3	1.39	27/10/2021	16/11/2021	21.00	22.00	1.39	100.00%	1.39	100.00%	0.00	A TIEMPO	TERMINADA
4.6	Elaboración e instalación de concreto para solado de nivelación resistencia de 140 kg/cm² (2.000 psi)	m3	11.30	29/10/2021	17/11/2021	20.00	20.00	11.30	100.00%	11.30	100.00%	0.00	A TIEMPO	TERMINADA
4.7	Localización y replanteo Alcantarillas	m3	18.03	27/09/2021	5/10/2021	9.00	52.00	18.03	100.00%	18.03	100.00%	0.00	A TIEMPO	TERMINADA
4.8	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) para Alcantarillas	m3	578.90	24/10/2021	1/11/2021	9.00	25.00	578.90	100.00%	578.90	100.00%	0.00	A TIEMPO	TERMINADA
4.9	Relleno con material seleccionado	Kg	9.56	26/10/2021	7/11/2021	13.00	23.00	9.56	100.00%	9.56	100.00%	0.00	A TIEMPO	TERMINADA
						1.00		0.00						
5.1	RUTA 1 - Valledupar - Lugar de la Iniciativa	Kg	4,581.20	24/09/2021	17/11/2021	55.00	55.00	4,581.20	100.00%	4,581.20	100.00%	0.00	A TIEMPO	TERMINADA
5.2	RUTA 2 - Mariangola - Lugar de la Iniciativa	Kg	196,578.39	24/09/2021	17/11/2021	55.00	55.00	196,578.39	100.00%	196,578.39	100.00%	0.00	A TIEMPO	TERMINADA
5.3	RUTA 4 - Cantera - Sitio de Acopio	Kg	124,800.00	24/09/2021	17/11/2021	55.00	55.00	124,800.00	100.00%	124,800.00	100.00%	0.00	A TIEMPO	TERMINADA

Nota 1

Nota 2

Nota 3

En "Fecha de corte" se coloca la fecha a la cual se quiere realizar el corte

La información de "CANTIDAD EJECUTADA" esta casilla debe ser ingresada mes a mes dependiendo de la cantidad que se vaya ejecutando

Solo insertar información en las celdas de color azul

FECHA DE CORTE 17/11/2021

CONDICIONES VIGENTES DEL PROYECTO				PROGRAMADO						EJECUTADO				
ITEMS	DESCRIPCION	UND.	CANT.	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DIAS	DIAS TRANSCURRIDOS	CANTIDAD A LA FECHA DE CORTE	PORCENTAJE PROMADO A LA FECHA DE CORTE	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE EJECUTADO	POR EJECUTAR	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	
5.4	RUTA 5 - Becerril - Sitio de Acopio	Kg	28,012.27	24/09/2021	17/11/2021	55.00	55.00	28,012.27	100.00%	28,012.27	100.00%	0.00	A TIEMPO	TERMINADA
5.5	RUTA 7 - Descargue y Cargue	Kg	386,112.06	24/09/2021	17/11/2021	55.00	55.00	386,112.06	100.00%	386,112.06	100.00%	0.00	A TIEMPO	TERMINADA
5.6	RUTA 8 - La Jagua de Ibirico - Sitio de Acopio	Kg	32,140.21	24/09/2021	17/11/2021	55.00	55.00	32,140.21	100.00%	32,140.21	100.00%	0.00	A TIEMPO	TERMINADA
5.7	RUTA 9 - Sitio de Acopio - Lugar de la Iniciativa	Kg	386,112.06	24/09/2021	17/11/2021	55.00	55.00	386,112.06	100.00%	386,112.06	100.00%	0.00	A TIEMPO	TERMINADA
